

【붙임 2】

주민참여예산 제안사업 관리카드(모니터링 대상)

(2021.5.31. 기준, 단위: 천원)

연번	사업부서 (사업위치)	사업명	사업비	집행액	추진상황		
					시기 미도래	추진중	추진 완료
	총 계	총 6건	793,000	223,169	0	24	16
1	운서동	앞마루 공원 정자 정비	38,000	9,491		○	
2	도시공원과 (운서동)	영마루공원 내 체육시설 및 공연무대장 정비	350,000	85,828		○	
3	도시개발과 (동인천동)	홍예문로 꽃 터널 길 조성	75,000	0		○	
4	건설과 (신포동)	칼국수 골목 일원 보행환경 개선	60,000	30,000		○	
5	교통운수과 (중구)	어린이보호구역 내 무단횡단 금지시설 설치	100,000	97,850			○
6	문화관광과 (북성동)	차이나타운 디자인 계단 사업	170,000	0		○	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-19(동)
------	------------


기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	앞마루 공원 정자 정비			제안자	최○○
부서명	운서동	담당자	행정8급 박지상	연락처	760-6257
추진상황	예산	38,000천원	집행액	9,491천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		90%	

□ 개 요

- 위 치 : 운서동 2787-4 앞마루공원
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 5월
- 사업내용
 - 철거작업 : 기존 정자 철거 및 나무 이식 작업
 - 신규설치 : 정자, 등받이 의자, 석재장기판 등 설치
- 추진상황
 - 철거작업 완료
 - 신규설치
 1. 석재장기판 설치 완료
 2. 공원안내판 설치 완료
 3. 정자 설치 완료 예정(2021. 6. 1일한)
- 향후계획
 - 공사 준공 후 즉시 대금지급

□ 관련사진

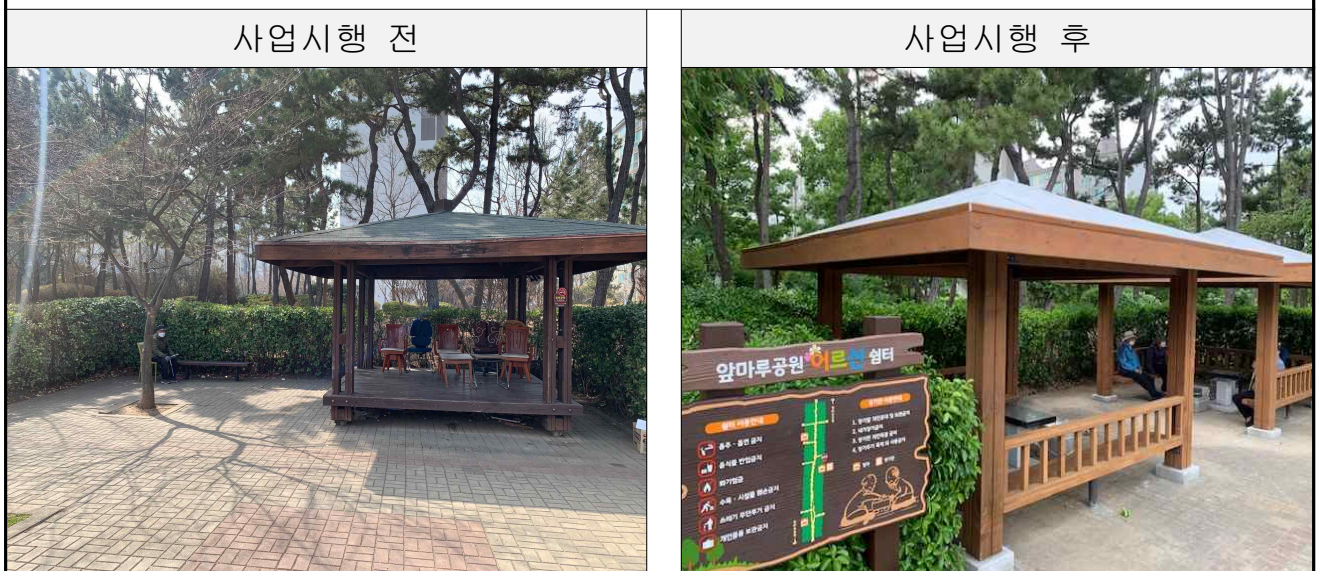

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020 - 109
------	------------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	영마루공원 내 체육시설 및 공연무대장 정비			제안자	안○○
부서명	도시공원과	담당자	녹지8급 지호승	연락처	760-7778
추진상황	예산	350,000천원	집행액	85,828천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		24%	

□ 개 요

- 위 치 : 공향신도시 영마루공원
- 사업기간 : 2021. 04. 01. ~ 06. 30. (착공일 2021. 04. 01.)
- 사업내용
 - 시설물공 : 시설물공 : 공연장 기동보수 1개소, 체력단련시설 17개소, 이동식농구대 3개소, 플랜터 264.4㎡ 등
 - 식재공 : 장미 5종 970주
 - 포장공 : 인조화강설블럭포장 718㎡, 고무칩포장 207.3㎡, 플라스틱바닥포장 282㎡ 등
 - 부대공 : 수목제거 310주, 토사운반 275.7㎡ 및 폐기물처리 1식 등
- 추진상황
 - 2021. 02. 10. : 실시설계 용역 준공
 - 2021. 04. 01. : 사업 착공
 - 2021. 04. 26. : 선급금 지급
- 향후계획
 - 2021. 06. 30. : 사업 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-74
------	---------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	홍예문로 꽃 터널 길 조성			제안자	윤○○
부서명	도시개발과	담당자	녹지7급 박석준	연락처	760-7582
추진상황	예산	75,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

□ 개 요

- 위 치 : 전동 2-4(동인천동 쉼터) 일원
- 사업기간 : 2021. 4. ~ 2021. 6.
- 사업내용
 - 장미터널(16개소) 설치 및 장미(320주) 식재
 - 플랜터 212.1m 설치, 꽃잔디 2,170본 식재, 기존수목 560주 이식 등
- 추진상황
 - '21.02.04. ~ '21.04.08. : 실시설계용역 완료
 - '21.05.14. : 공사 착공
- 향후계획
 - '21.06.22. : 공사 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-111
------	----------


기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	칼국수 골목 일원 보행환경 개선			제안자	윤○○
부서명	건설과	담당자	시8급 이주영, 공9급 나원영	연락처	760-7455
추진상황	예산	60,000천원	집행액	30,000천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		50%	

□ 개 요

- 위 치 : 중구 신포동 61번지 일원
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 6월
- 사업내용
 - 토목 : 보도블럭 정비 (L=200, B=2~3m)
 - 전기 : 보안등 신설(4개소), 보안등 교체(10개소)
- 추진상황
 - 2021. 3월 : 제안자 의견 및 현장 확인
 - 2021. 5월 : 토목 (보도블럭 정비 완료) / 전기 (설계완료 및 착공)
- 향후계획
 - 2021. 6월 : 전기 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-36
------	---------

기준일 : 2021. 05. 31.

사업명	어린이 보호구역 내 무단횡단 금지시설 설치	제안자	이○○ 이○○
부서명	교통운수과 담당자	시설9급 강희엽	연락처
	예산	100,000천원	집행액
	시기 미도래	추진중	완 료
추진상황			○
			97,850천원
			추진율
			100%





□ 개요







○ 위 치

- 신흥동3가 7-207(인하대병원 앞) 약 420m 구간
- 신흥동3가 30(중구장애인 복지관 앞) 약 190m 구간
- 향동7가 27-106(연안초등학교 앞) 약 130m 구간
- 신흥동3가 28-2(신광초등학교 앞) 약 160m 구간
- 신흥동3가 56(삼익아파트 앞) 약 140m구간

○ 사업기간 : 2021. 02. 18. ~ 2021. 03. 05.

□ 관련사진

구분	시공 전	시공 후
신흥동3가 7-207		
신선초등 학교		

구분	시공 전	시공 후
<p>항 동 7 가 27-106</p>		
<p>신 흥 동 3 가 28-2</p>		
<p>신 흥 동 3 가 56</p>		

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-38
------	---------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	차이나타운 디자인 계단 사업			제안자	장○○
부서명	문화관광과	담당자	시설6급 김두용	연락처	760-6452
추진상황	예산	170,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		20%	

□ 개요

- 위 치 : 선린문 계단 일원
- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 차이나타운 선린문 계단을 특색있는 계단으로 재정비

□ 그동안 추진사항

- 2021. 2. 4 : 용역 발주
- 2021. 2. 19 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 4. 19 : 용역 중지(주민의견 수렴)
- 2021. 5. 20 : 주민참여예산 제안자 설명

□ 향후계획

- 2021. 6월 : 용역 재개
- 2021. 6월 : 공사 시행

□ 관련사진

<p>사업시행 전</p> 	<p>사업시행 후</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------
