

2025년도 예산 반영 주민참여예산 사업 목록

(2025. 6. 30. 기준 현행화 요청 / 단위: 천원)

연번	사업부서 (사업위치)	사업명	사업비	집행액	추진상황		
					시기 미도래	추진중	추진 완료
	총 계	총 46건	1,174,650	394,163	○	○	○
1	노안장애인과	○ 경로당 수돗물 필터 설치	54,000	53,237			○
2		○ 북성12통경로당 인근 노후정자 철거 및 파고라 설치	10,753	10,317			○
3	건설과	○ 울목 어린이공원 통로 확보	30,000	29,073			○
4		○ 도원동 70계단 광장 승터 환경개선 (계단 조명)	30,000	28,741			○
5	도시개발과	○ 도원동 70계단 광장 승터 환경개선 (인공폭포 정비)	21,000	19,382			○
6	도시공원과	○ 하늘체육공원, 실개천 휴게공간 조성	200,000	-		○	
7		○ 공항신도시 1호 일반광장 정비사업	150,000	46,440			○
8		○ 산새소리 공원 정비	120,000	-		○	
9		○ 세계평화의 숲 산책로 정비사업	80,000	-		○	
10		○ 하늘도시 26호 연결복지 초화 식재공사	20,000	-			○
11	신포동	○ 신포동 주민자치센터 환경개선	20,000	18,670			○
12		○ 감나무길 벽화 그리기	9,000	6,491			○
13		○ 신포동 경관개선사업	7,000	5,729		○	
14		○ 우리동네 공감교실	4,000	-		○	
15	연안동	○ 라이프파트 사계절 꽃길 벽화조성	25,000	-		○	
16		○ 컴퓨터 교육 및 스마트폰, 키오스크 교육	12,000	6,991		○	
17		○ 설·추석 명절 맞이 주민 무던 칼같이 행사	3,000	1,162		○	
18	신흥동	○ 노인가구 타이머록 설치 및 소화기 배부사업	24,850	-		○	
19		○ 주민자치센터 환경개선사업	6,400	3,770		○	
20		○ 주민자치센터 주방시설 교체사업	3,001	2,998			○

연번	사업부서 (사업위치)	사업명	사업비	집행액	추진상황		
					시기 미도래	추진중	추진 완료
21	도원동	○ 벽화를 부탁해!	11,990	3,270		○	
22		○ 우리집을 부탁해! (주거환경개선 사업)	11,000	3,020		○	
23		○ 도원동 주민 행복·안심등 설치	10,000	-	○		
24		○ 원예 테라피	2,500	2,500		○	
25		○ 인생한컷 (장수사진)	2,500	-	○		
26	울목동	○ 울목동 공영주차장 화분걸이 설치사업	20,000	9,886		○	
27		○ 울목동 지역 맞춤형 방역사업	8,000	-		○	
28		○ 태양광 자전거 공기주입기 설치사업	6,500	6,050			○
29		○ 아름다운 마을 만들기 초화 식재사업	5,000	1,990		○	
30	동인천동	○ 체력단련실 등 주민이용시설 환경개선 사업	40,000	37,996			○
31	개항동	○ 월미도 문화의 거리 만국기 게시대 설치(2차)	20,000	19,239			○
32		○ 어울터 출입구 및 지하층 입구 개선 공사	11,000	10,670			○
33		○ 우리 동네 마을 게시판 설치	5,000	-		○	
34		○ 개항동 벤치 설치	4,000	-		○	
35	영종동	○ 영종동 로컬푸드와 아나바다 콜라보	18,870	-		○	
36		○ 영종동꽃 모종 재배 및 나누기 계속사업	9,490	-		○	
37	영종1동	○ 주민과 함께하는 폴리마켓 (아나바다)	15,000	-	○		
38		○ 영종1동 건강체조 프로그램	13,200	3,758		○	
39		○ 영종1동 주민토크콘서트	10,000	6,510		○	
40	영종2동	○ 용달샘공원 경관 조명 시설	34,440	34,440			○
41		○ 지역 상권의 활성화를 위한 깨끗한 거리 만들기 환경정화 캠페인	3,156	2,389		○	
42	운서동	○ 가족 건강 걷기 문화 축제	20,000	19,444			○
43		○ 주민 영화제 (운서동 시네마 천국)	20,000	-		○	
44	용유동	○ 소무의도 쓰레기 집하장 설치	20,000	-		○	
45		○ 을왕리 해수욕장 포토존 교체	15,000	-		○	
46		○ 남북 5.6통 마을 안내표지판 설치	8,000	-			○

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	경로당 수돗물 필터 설치			제안자	장*훈
부서명	노인장애인과	담당자	사회복지7급 이진희	연락처	760-7323
추진상황	예산	54,000천원	집행액	53,237천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
			○	100%	

□ 개요

- 위치 : 중구 관내 경로당 45개소 (사립공동주택 경로당 제외)
- 사업기간 : 2025. 4. 7. ~ 2025. 5. 27.
- 내용 : 수돗물 주공급 파이프에 필터가 내장된 장비 설치

□ 추진상황

- 2025. 4. 3. : 사업 추진 계획 수립
- 2025. 4. 18. : 일상감사 의뢰
- 2025. 4. 21 : 물품 구입 및 용역 계약 의뢰
- 2025. 5. 27 : 준공 완료

□ 향후계획

- 경로당 내 설치된 설비 시설 지속 관리

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	북성12통경로당 인근 노후정자 철거 및 파고라 설치			제안자	허*숙
부서명	노인장애인과	담당자	사회복지7급 이진희	연락처	760-7323
추진상황	예산	10,753천원	집행액	10,317천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
			○	100%	

□ 개요

- 위치 : 중구 제물량로 335번길 39
- 사업기간 : 2025.2.12. ~ 2025.3.12.
- 내용 : 북성12통경로당 인근 노후정자 철거 및 파고라 설치

□ 추진상황

- 2025. 2. 12 : 공사 계약 의뢰
- 2025. 2. 18 : 공사 계약 및 착공
- 2025. 3. 11 : 공사 준공

□ 향후계획

- 파고라 설치 완료 후 지역 주민 유희공간으로 사용

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	울목어린이공원 통로 확보 공사			제안자	이*택
부서명	건설과	담당자	시설 7급 최정현	연락처	760-7454
추진상황	예산	30,000천원	집행액	29,073천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
			○	100%	

□ 개요

- 위치 : 울목동 231-55 일원
- 사업기간 : 2025. 3월 ~ 4월
- 내용 : 통로 확보 1식 (보도블럭 설치 및 영산홍 식재 등)

□ 추진상황

- 2025. 2월 : 사업 관련 현장 확인
- 2025. 3월 : 추진계획 수립
- 2025. 3. 24. : 공사 착공
- 2025. 4. 17. : 공사 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	도원동 70계단 광장 쉼터 환경개선 (계단조명)			제안자	김*윤
부서명	건설과	담당자	전기운영 6급 오준석	연락처	760-7832
추진상황	예산	30,000천원	집행액	28,741천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
			○	100%	

□ 개요

- 위치 : 도원동 70계단 일원
- 사업기간 : 2025. 3. 13. ~ 5. 11.
- 내용 : LED바 48개소 설치, LED 투광등 2개소 설치
고보조명 1개소 설치

□ 추진상황

- 2025. 3. 13. : 공사 착공
- 2025. 5. 11. : 공사 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	도원동 70계단 쉼터 인공폭포 경관사업		제안자	김*윤
부서명	도시개발과	담당자	녹지 9급 최예인	연락처 760-7584
추진상황	예산	21,000천원	집행액	19,382천원
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
			○	100%

□ 개요

- 위치 : 도원동 70계단 쉼터(도원동 71-44번지 일원)
- 사업기간 : 2025. 5. 8. ~ 2025. 6. 24.
- 내용 : 쉼터 내 인공폭포에 경관조명 설치를 통해 폭포가 가동하지 않는 계절 및 시간의 미적 경관 향상으로 도심 속 힐링 공간 형성

□ 추진상황

- 2024. 7월 : 2025년 주민참여예산 선정 결과 통보(←총무과)
- 2025. 3월 : 현장확인 및 공사 설계 완료
- 2025. 4월 : 공사계약의뢰(→재무과)
- 2025. 5월 : 공사 착공
- 2025. 6월 : 공사 준공 및 사업 완료

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	하늘체육공원 실개천 휴게공간 조성사업		제안자	이*숙
부서명	도시공원과	담당자	녹지7급 천지선	연락처 760-7778
추진상황	예산	200,000천원	집행액	-
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
			○	10%

□ 개요

- 위치 : 하늘체육공원, 완충녹지20호 등 (중산동 1878-3 일원)
- 사업기간 : 2025. 1월 ~ 8월
- 내용
 - 실개천 화단재정비, 테마파크화 등 휴게공간 조성
 - 조경·편의시설 설치, 배수체계 정비, 수목 및 초화 식재 등

□ 추진상황

- 2025. 1월 : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

- 2025. 6월 : 실시설계용역 완료
- 2025. 7월 : 공사 착공
- 2025. 8월 : 공사 준공

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	공향신도시 1호 일반광장 정비사업		제안자	이*학
부서명	도시공원과	담당자	녹지 9급 어지연	연락처 760-8848
추진상황	예산	150,000천원	집행액	46,440천원
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
			○	100%


□ 개요

- 위치 : 공향신도시 1호 일반광장 (운서동 2667)
- 사업기간 : 2025. 2월 ~ 6월
- 내용
 - 실시설계용역 1식
 - 철거공 : 별개제근 90㎡, 소형고압블럭포장 460㎡, 철평석포장 135㎡, 계단 1식 이설, 등 의자 및 야외테이블 등
 - 식재공 : 남천 외 3종 1,080주
 - 포장공 : 인조화강석블럭 595㎡, 경계석 16m
 - 시설물공 : 계단 1개소, 피크닉테이블 2개소, 태양광볼라드등 20개소 등
 - 폐기물 운반 및 처리 : 102ton

□ 추진상황

- 2025. 2월 ~ 3월 : 실시설계용역 준공
- 2025. 4월 : 공향신도시 1호 일반광장 정비사업 착공
- 2025. 6월 : 공향신도시 1호 일반광장 정비사업 준공

□ 관련사진

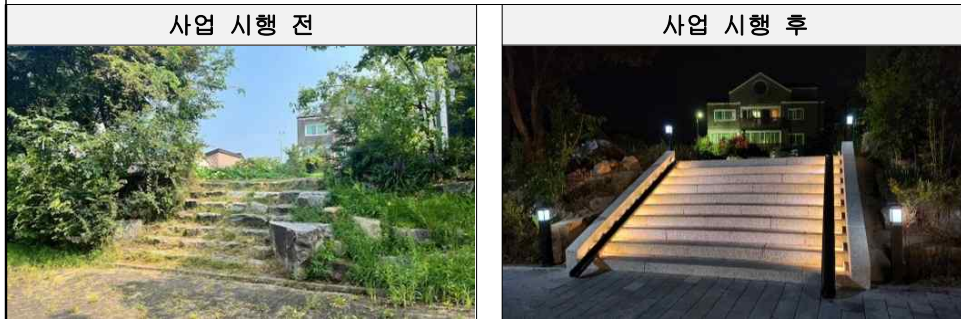

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	월촌공원(산새소리공원) 정비사업		제안자	한*구
부서명	도시공원과	담당자	녹지7급 천지선	연락처 760-7778
추진상황	예산	120,000천원	집행액	-
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
			○	40%

□ 개요

- 위치 : 월촌공원 (중산동 1912-1)
- 사업기간 : 2025. 1월 ~ 8월
- 내용
 - 산책로(계단) 정비, 휴게시설 및 보행매트·안전시설 설치 등

□ 추진상황

- 2025. 1월 : 실시설계용역 착수
- 2025. 4월 : 실시설계용역 완료

□ 향후계획

- 2025. 6월 : 공사 착공
- 2025. 8월 : 공사 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	세계평화의 숲 산책로 정비사업			제안자	장*재
부서명	도시공원과	담당자	녹지 7급 지호승	연락처	760-7787
추진상황	예산	80,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		90%	

□ 개요

- 위치 : 공항신도시 1호 완충녹지 (운서동 2810-1)
- 사업기간 : 2025. 5월 ~ 6월
- 내용
 - 마사토 포장 3,000㎡ (약 1km)
 - 주민 편의시설 설치 등

□ 추진상황

- 2025. 3월 ~ 4월 : 현장점검 및 자체설계
- 2025. 6월 : 세계평화의 숲 산책로 정비사업 착공 및 준공

□ 향후계획

- 2025. 7월 : 세계평화의 숲 산책로 정비사업 준공검토, 휴게시설(벤치) 12개소 설치

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	하늘도시 26호 연결녹지 초화 식재공사			제안자	이*학
부서명	도시공원과	담당자	녹지 9급 어지연	연락처	760-8848
추진상황	예산	20,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
			○	100%	

□ 개요

- 위치 : 하늘도시 26호 연결녹지 (운남동 1766-6 일원)
- 사업기간 : 2025. 7월 ~ 8월
- 내용 : 튼リップ, 꽃무릇 등 초화 식재

□ 추진상황

- 2025. 3월 ~ 4월 : 현장점검 및 자체설계
- 2025. 6월 : 하늘도시 26호 연결녹지 초화 식재공사 착공 및 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	신포동 주민자치센터 환경개선			제안자	조*자
부서명	신포동	담당자	행정8급 이상미	연락처	760-6106
추진상황	예산	20,000천원	집행액	18,670천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
			○	100%	

□ 개요

- 위치 : 신포동 주민자치센터(인중로 174번길 16)
- 사업기간
 - 전기공사 : 2025. 4. 7.(월) ~ 4. 8.(화) 【2일】
 - 도장·미장공사 : 2025. 4. 11.(금) ~ 4. 15.(화) 【5일】
- 내용 : 2025년 신포동 주민자치센터 환경개선 공사
 - ※ **전기공사와 도장·미장공사 별도 시행**

① 전기공사 내용

- 지하실 전기 전체 차단
- 1층 화장실-계단 천장 형광등 교체
- 1층 계단 복도 스위치 교체
- 1·2층 남녀 화장실 스위치 교체
- 2층 여자 화장실 환풍기 교체
- 2층 배선용·누전 차단기 교체
- 주민자치센터 외벽 전선 정비

② 도장·미장공사 내용

【외부】

- 장애인 경사로 타일 보수 및 미장공사
- 외벽 현수막 걸개 설치
- 외벽 도장공사
- 선홍통 보수

【내부】

- 1층 주민자치회 사무실 뒤쪽 비상문 및 방충망 설치
- 1층 관리자실 문 고리 보수
- 2층 다목적실 벽기둥 벗겨진 시트지 보수

□ 추진상황

- 2025. 3. 13. : 도장·미장 공사업체와 현장 논의 【1차】
- 2025. 3. 17. : 전기 공사업체와 현장 논의
- 2025. 3. 26. : 주민자치회 임원 회의 후, 공사 내용 확정
- 2025. 4. 7. : 전기공사 계약 및 착공
 - 도장·미장 공사업체와 현장 논의 【2차】
- 2025. 4. 8. : 전기공사 준공
- 2025. 4. 9. : 대금 지급(洞 → 전기공사 업체)
- 2025. 4. 11. : 도장·미장공사 계약 및 착공
- 2025. 4. 18. : 도장·미장공사 준공
- 2025. 4. 23. : 대금 지급(洞 → 도장·미장공사 업체)

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	감나무길 벽화 그리기			제안자	진*근
부서명	신포동	담당자	행정8급 이상미	연락처	760-6106
추진상황	예산	9,000천원	집행액	6,491천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
			○	100%	

□ 개요

○ 위치 : 신포로47번길 21(호남택배 앞 담장) 【변동】

— 위치 변경 사유 —

당초 계획 예정이었던 '동국빌리지 옹벽'은 동국빌리지 주민들의 반대로 무산
→ '호남택배 앞 담장'이 대체지로 선정됨 (주민자치회 위원 동의)


○ 사업기간 : 2025. 6. 10.(화) ~ 6. 20.(금) 【11일간】

○ 내용 : 호남택배 앞 담장에 꽃 벽화를 그려, 동 이미지 제고 및 경관 개선

□ 추진상황

- 2025. 4. 4. : 2025년 벽화 그리기 사업 논의 및 벽화 시공 예정지 현장 점검
- 2025. 6. 2. : 벽화 그리기 사업 동의서 확보
- 2025. 6. 10. : 벽화 그리기 용역 계약 및 착수
- 2025. 6. 20. : 벽화 그리기 용역 준공
- 2025. 6. 30. : 대금 지급(洞 → 벽화 용역 업체)

□ 관련사진

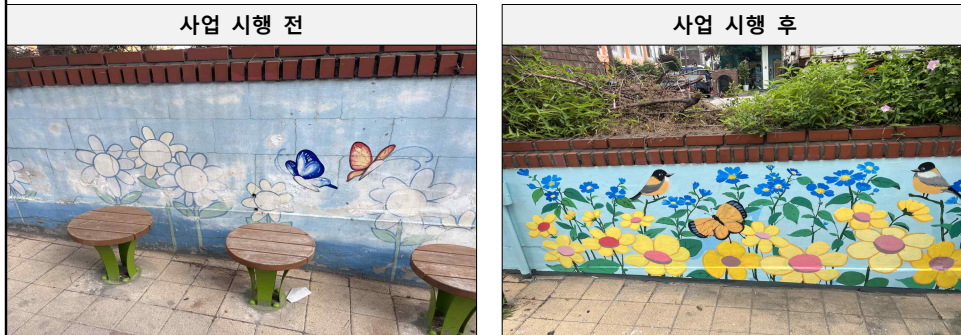

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	신포동 경관개선사업			제안자	유*선
부서명	신포동	담당자	행정8급 이상미	연락처	760-6106
추진상황	예산	7,000천원	집행액	5,729천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
			○	50%	

□ 개요

○ 사업기간

- 에메랄드 그린 등 수목 식재 : 2025. 5. 21.(수) ~ 5. 28.(수) 【8일간】
- 감나무길 감 따기 행사 : 2025. 10월 예정

○ 위치 및 내용

연번	사업내용	위치	내용
1	수목 식재	신포동 청사 ~ 신포사거리	에메랄드 그린 및 꽃잔디 식재
		담동사거리 ~ 교통섬 일대	
		신포로35번길 76 앞 화단	감나무 묘목 3그루 식재
2	감나무길 감 따기 행사	신포로35번길 감나무길	감나무길 감 수확(예정)


□ 추진상황

- 2025. 4. 3. : 2024년 식재한 꽃 · 에메랄드 그린 점검(고사목 등 확인)
- 2025. 4. 4. : 신포동 경관개선사업 관련 논의(수목 식재 시기 및 장소 결정 등)
- 2025. 5. 21. : 물품 계약(에메랄드 그린, 꽃잔디, 감나무 묘목)
- 2025. 5. 27. : 수목 식재 【1차】
- 2025. 5. 28. : 수목 식재 【2차】 및 물품 납품
- 2025. 6. 2. : 완납금 지급(洞 → 납품 업체)

□ 향후계획

- 2025. 10월 : 신포로35번길 감나무 감 수확 행사

□ 관련사진

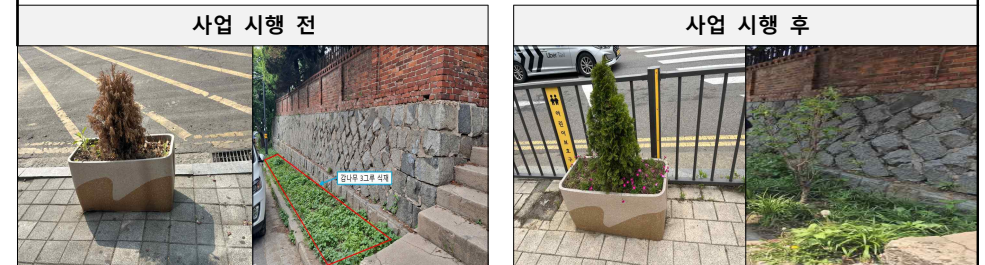

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	우리동네 공감교실			제안자	이*희
부서명	신포동	담당자	행정8급 이상미	연락처	760-6106
추진상황	예산	4,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		20%	

□ 개요

- 위치 : 신포동 주민자치센터(인중로174번길 16)
- 사업기간 : 【1차】 2025. 7. 8.(화) ~ 8. 19.(화) / 【2차】 2025. 9 ~ 10월
- 내용

프로그램명	진행 시기		교육 횟수	프로그램 진행시간	강의 장소
향기 테라피	1차	2025. 7 ~ 8월	6회	매주 화 2시간 / 15:00 ~ 17:00	주민자치센터 1층
노래 교실			6회	매주 목 2시간 / 14:00 ~ 16:00	주민자치센터 2층
한지 공예	2차	2025. 9월	5회	매주 화 4시간 / 10:00 ~ 14:00	주민자치센터 1층
양말목 공예		2025. 10월	4회	매주 화 2시간 / 14:00 ~ 16:00	

※ 상황에 따라 일정 변동 가능 / 1·2차 나눠서 프로그램 진행

□ 추진상황

- 2025. 4. 30. : 우리마을 공감교실 프로그램 관련 논의
- 운영 프로그램 최종 선정(분과별 1개 프로그램 운영)
- 2025. 6. 20. : 1·2차 프로그램 강사 모집 완료
- 2025. 6. 24. : 1차 사업 계획 수립

□ 향후계획

- 2025. 6. 25. ~ 7. 4. : 1차 프로그램 수강생 모집(향기 테라피 · 노래교실)
- 2025. 7. 8. ~ 8. 19. : 1차 프로그램 사업 추진(향기 테라피 · 노래교실)
- 2025. 8. 18. ~ 8. 29. : 2차 프로그램 수강생 모집(한지 공예 · 양말목 공예)
- 2025. 8. 29.限 : 1차 프로그램 운영 만족도 설문조사 및 강사수당 지급
- 2025. 9. 2. ~ 10. 28. : 2차 프로그램 사업 추진(한지 공예 · 양말목 공예)
- 2025. 10. 31.限 : 2차 프로그램 운영 만족도 설문조사 및 강사수당 지급

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	라이프아파트 사계절 꽃길 벽화 조성			제안자	김*천
부서명	연안동	담당자	행정7급 송병윤	연락처	760-6125
추진상황	예산	25,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		90%	

□ 개요

- 위치 : 연안동 라이프아파트 돌레길 (12동 ~ 14동 앞 방음벽)
- 사업기간 : 2025. 3월 ~ 7월
- 내용 : 식재 구간과 연결하여 꽃 그림 벽화를 조성하여 쾌적한 보행환경 조성

□ 추진상황

- 2025. 3월 : 업체 선정 및 벽화 시안 논의
- 2025. 4월 : 벽화 디자인에 대한 위원 의견 수렴 (주민자치회 회의)
- 2025. 5월 : 벽화 디자인 최종 확정
- 2025. 6월 : 벽화 조성 사업 시행

□ 향후계획

- 2025. 7월 : 벽화 조성 사업 준공 및 사업비 지출

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	컴퓨터 교육 및 스마트폰, 키오스크 교육		제안자	최*구
부서명	연안동	담당자	행정7급 송병윤	연락처 760-6125
추진상황	예산	12,000천원	집행액	6,991천원
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
		○		58.2%

□ 개요

- 위치 : 연안동 행정복지센터 프로그램4실
- 사업기간 : 2025. 5월 ~ 11월
- 내용
 - 월 4회 운영 (목요일 16시 ~ 18시)
 - 디지털 취약계층이 많은 연안동 주민들에게 정보통신 교육을 실시하여 일상생활에서 디지털기기를 활용할 수 있도록 도움

□ 추진상황

- 2025. 4. 11. : 사업계획 수립
- 2025. 4. 21. ~ 4. 25. : 수강생 모집 완료 (총 84명)
- 2025. 5. : 노트북 임차 등 강의 준비 완료

□ 향후계획

- 2025. 11월 : 교육 종료 (총 28회 운영 목표)

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	설·추석 명절 맞이 주민 무던 칼같이 행사		제안자	조*석
부서명	연안동	담당자	행정7급 송병윤	연락처 760-6125
추진상황	예산	3,000천원	집행액	1,162천원
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
		○		38.7%

□ 개요

- 위치
 - 설 명절 맞이 칼같이 행사 : 연안동 행정복지센터 5층 회의실
 - 추석 명절 맞이 칼같이 행사 : 라이프아파트 4동 앞
- 사업기간 : 2025. 1월, 9월
- 내용 : 설·추석 명절 전 주민 대상 무료 칼같이 서비스 제공


□ 추진상황

- 2025. 1. 15. ~ 1. 22. : 사업 홍보 및 현수막 게시
- 2025. 1. 21. ~ 1. 22. : 설 명절 맞이 칼같이 행사 추진
- 2025. 2. 19. : 칼같이 서비스 제공 비용 지출

□ 향후계획

- 2025. 9. 30. 限 : 추석 명절 맞이 칼같이 행사 개최

□ 관련사진

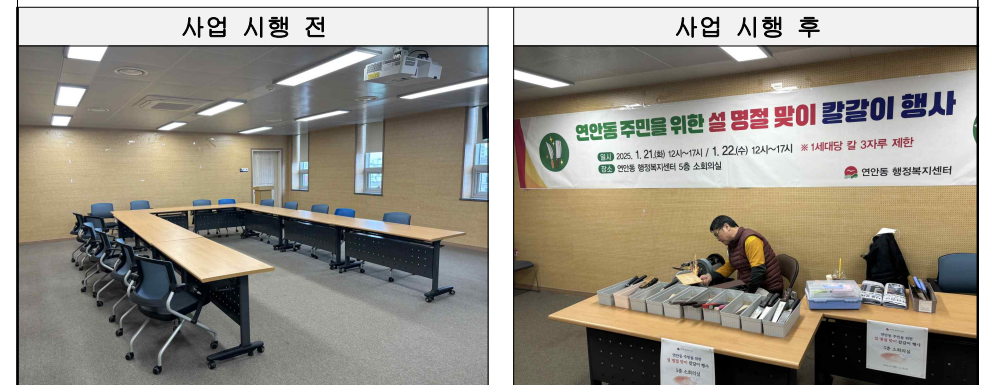

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	노인가구 타이머 콕 설치 및 소화기 배부사업		제안자	오*영
부서명	신흥동	담당자	행정 7급 송문희	연락처 760-6144
추진상황	예산	24,850천원	집행액	-
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
		○		10%

□ 개요

- 사업대상 : 안전 취약계층인 노인가구 및 장애인, 1인 가구 등
- 사업기간 : 2025. 5월 ~ 10월
- 내용 : 안전 취약계층인 노인가구 및 장애인, 1인 가구 등을 대상으로 가스레인지 과열 사고 및 화재 예방을 위한 타이머 콕 설치와 스프레이 소화기 배부로 안전한 주거환경 조성.

□ 추진상황

- 2025. 6월 : 노인가구 타이머콕 설치 및 소화기 배부사업 추진계획 수립

□ 향후계획

- 2025. 7. 14 限 : 안전 취약계층 대상자 선정
- 2025. 7. 18 限 : 가스콕 및 소화기 구매
- 2025. 7. 25 ~ 10월 : 통별 조 편성 후 설치 및 배부

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
사업 시행 후 사진 첨부 예정	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	주민자치센터 환경개선사업			제안자	노*직
부서명	신흥동	담당자	행정 7급 송문희	연락처	760-6144
추진상황	예산	6,400천원	집행액	3,770천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		59%	

□ 개요

- 위치 : 신흥동 주민자치센터 옥상(중구 도원로 4), 신흥동 행정복지센터 內 체력단련실(중구 제물량로80번길 3-14)
- 사업기간 : 2025. 4월 ~ 7월
- 내용 : 주민자치센터 옥상 방수공사 및 체력단련실(샤워실) 수전 교체

□ 추진상황

- 2025. 6. 23. : 주민자치센터 환경개선사업 계획 수립
- 2025. 6. 23. : 주민자치센터 옥상 방수공사 계약 체결 및 착공
- 2025. 7. 01. : 주민자치센터 옥상 방수공사 준공

□ 향후계획

- 2025. 7. 8 ~ 7. 15. : 체력단련실 샤워기 수전 교체

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 중
	  <p>(샤워기 수전 교체) 사업 시행 후 사진 첨부</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	주민자치센터 주방시설 교체사업			제안자	박*홍
부서명	신흥동	담당자	행정 7급 송문희	연락처	760-6144
추진상황	예산	3,001천원	집행액	2,998천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
			○	100%	


□ 개요

- 위치 : 신흥동 주민자치센터 1층 주방 및 창고(중구 도원로 4)
- 사업기간 : 2025. 4월
- 내용 : 노후하고 협소한 주민자치센터 내 주방시설 교체 및 정비

□ 추진상황

- 2025. 3. 28. : 신흥동 주민자치센터 주방시설 교체사업 계획 수립
- 2025. 3. 29. : 냉장고 및 주방 선반 조리대(하부장) 구입
- 2025. 4. 09. ~ 11. : 싱크대 수전 교체 및 주방용품 보관용 선반 설치
- 2025. 4. 30. : 주방물품 정리 완료

□ 관련사진

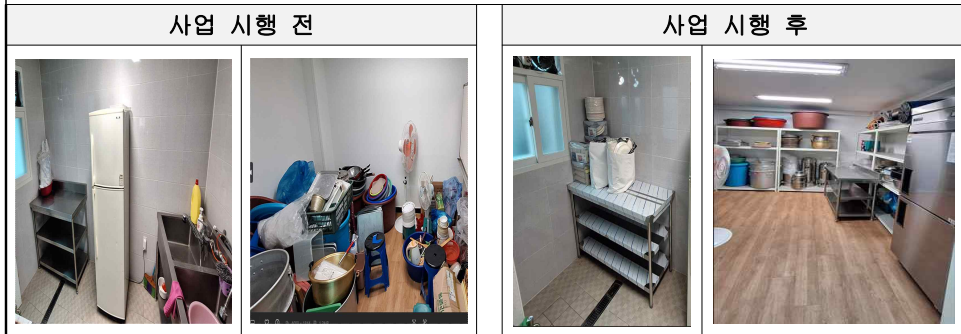

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	벽화를 부탁해!			제안자	임*승
부서명	도원동	담당자	행정8급 이종찬	연락처	760-6164
추진상황	예산	11,900천원	집행액	3,270천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
			○	27.2%	

□ 개요

- 위치 : 도원동 관내
- 사업기간 : 2025.4. ~ 12.
- 내용 :
 1. 노후된 주택가 담장 및 재정비가 필요한 벽화구역 대상
 2. 노후화된 지역 환경 개선

□ 추진상황

- 6월 : 벽화그리기 계약(도산로21 외 2지역 벽화 그리기 실시)

□ 향후계획

- 7월 ~ 8월 : 준공 및 모니터링 (주민 인터뷰, 주민자치위원 확인 등)
- 9월 : 최종 평가(사진기록·인터뷰 등 발표) → 주민총회

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	우리집을 부탁해! (정리수납 교육 + 주거환경개선사업)			제안자	박*자
부서명	도원동	담당자	행정8급 이종찬	연락처	760-6164
추진상황	예산	11,000천원	집행액	3,020천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		27.5%	

□ 개요

- 위치 : 도원동 관내 (1~5개 예정)
- 사업기간 : 2025.2. ~ 12.
- 내용 : 도원동 관내 취약계층 대상으로 주민자치위원 대상 정리수납 교육 진행 후 주거환경 취약계층 세대 정리수납 및 주거환경 개선 사업 실시

□ 추진상황

- 2월 ~ 3월 : 봉사자 정리수납 교육 및 수료
- 5월 ~ 6월 : 대상자 선정

□ 향후계획

- 7월 ~ 8월 : 주거환경개선 사업 실시 모니터링 (주민 인터뷰, 주민자치위원 확인 등)
- 9월 : 최종 평가(사진기록·인터뷰 등 발표) → 주민총회

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	도원동 주민 행복·안심등 설치			제안자	유*환
부서명	도원동	담당자	행정8급 이종찬	연락처	760-6164
추진상황	예산	10,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		0%	

□ 개요

- 위치 : 도원동 관내
- 사업기간 : 2025.5. ~ 12.
- 내용 : 관내 환경개선 및 야간통행 안전 확보를 위한 로고젝터 설치


□ 추진상황

- 후보지 선정 및 업체선정 中

□ 향후계획

- 7월 ~ 8월 : 대상 선정 및 사업 시행, 모니터링 (주민 인터뷰, 주민자치위원 확인 등)
- 9월 : 최종 평가(사진기록·인터뷰 등 발표) → 주민총회

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	원예테라피 (환경 개선을 위한 초화 가꾸기)		제안자	민*기
부서명	도원동	담당자	행정8급 이종찬	연락처 760-6164
추진상황	예산	2,500천원	집행액	2,500천원
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
		○		70%

□ 개요

- 위치 : 도원동 관내 공터 및 개인 사유지, 화분설치지
- 사업기간 : 2025.4. ~ 12.
- 내용 : 도원동 관내 쓰레기 무단투기지역, 공터 또는 공공용 토지 등을 활용한 환경 정비 및 나무·초화 식재

□ 추진상황

- 도원동 40계단 외 환경 정비가 필요한 지역 선정 및 정비 실시

□ 향후계획

- 7월 ~ 12월 : 초화·식재 및 홍보 (상시)
- 7월 ~ 8월 : 모니터링 (주민 인터뷰, 주민자치위원 확인 등)
- 9월 : 최종 평가(사진기록·인터뷰 등 발표) → 주민총회

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	인생한컷 (장수사진)		제안자	이*도
부서명	도원동	담당자	행정8급 이종찬	연락처 760-6164
추진상황	예산	2,500천원	집행액	-
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
		○		0%

□ 개요

- 위치 : 도원동 관내
- 사업기간 : 2025.5. ~ 12.
- 내용 : 관내 85세 이상 어르신 장수사진 촬영 및 액자 제작

□ 추진상황

- 대상자 선정 및 업체선정 中

□ 향후계획

- 7월 ~ 12월 : 촬영 및 사진 전달
- 7월 ~ 8월 : 모니터링 (주민 인터뷰, 주민자치위원 확인 등)
- 9월 : 최종 평가(사진기록·인터뷰 등 발표) → 주민총회

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
사업 시행 후 사진 첨부 예정	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	울목동 공영주차장 화분걸이 설치사업			제안자	공*환
부서명	울목동	담당자	행정7급 이두열	연락처	760-6185
추진상황	예산	20,000천원	집행액	9,886천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		50%	

□ 개요

- 위치 : 울목동 공영주차장 외부 펜스
- 사업기간 : 2025. 4월 / 9월
- 내용 : 울목동 공영주차장 외부 펜스에 봄·가을 화분걸이 설치

□ 추진상황

- 2025. 3월 :
 - 제안자의 의견 청취 및 업체 확인
 - 공영주차장 관련부서(교통운수과) 협조 요청
- 2025. 4월 : 울목동 공영주차장 외부펜스 봄 초화 화분걸이 설치

□ 향후계획

- 2025. 9월 : 가을 화분걸이 설치

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	울목동 지역 맞춤형 방역사업			제안자	김*분
부서명	울목동	담당자	행정7급 이두열	연락처	760-6185
추진상황	예산	8,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		30%	

□ 개요

- 위치 : 울목동 관내 방역 소독 취약 지역
- 사업기간 : 2025. 7월 ~ 10월
- 내용 : 울목동 관내 방역 소독 취약 지역 4개월간 주 3회 집중 방역 소독


□ 추진상황

- 2025. 3월 : 제안자의 의견 청취 및 방역 방법, 범위 등 검토
- 2025. 6월 : 방역 업체 선정 및 용역 발주

□ 향후계획

- 2025. 7월 ~ 10월 : 취약 지역 방역 및 소독 시행

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	태양광 자전거 공기주입기 설치사업			제안자	노*곤
부서명	율목동	담당자	행정7급 이두열	연락처	760-6185
추진상황	예산	6,500천원	집행액	6,050천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
			○	100%	

□ 개요

- 위치 : 율목 커뮤니티 센터 내
- 사업기간 : 2025. 4월
- 내용 : 율목 커뮤니티센터 부지 내 태양광 자전거 공기주입기 설치

□ 추진상황

- 2025. 3월
 - 제안자의 의견 수렴 및 위치 선정
 - 물품 발주 및 제작
- 2025. 4월 : 태양광 자전거 공기주입기 설치

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	아름다운 마을 만들기 초화 식재사업			제안자	박*길
부서명	율목동	담당자	행정7급 이두열	연락처	760-6185
추진상황	예산	5,000천원	집행액	1,990천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
			○	50%	

□ 개요

- 위치 : 율목동 관내 쓰레기 무단 투기 취약 구역
- 사업기간 : 2025. 5월 / 9월
- 내용 : 율목동 관내 쓰레기 무단 투기 취약 구역에 봄·가을 계절 초화 식재

□ 추진상황

- 2025. 3월 : 주민참여예산 제안자의 의견 수렴 및 현장 확인(위치, 수량 파악)
- 2025. 5월 : 율목동 관내 쓰레기 무단 투기 취약 구역 봄 초화 식재

□ 향후계획

- 2025. 9월 : 가을 초화 식재

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	주민자치센터 체력단련실 환경개선 공사		제안자	전성철
부서명	동인천동	담당자	행정 7급 이영은	연락처 760-6206
추진상황	예산	40,000천원	집행액	37,996천원
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
			○	100%

□ 개요

- 위치 : 참외전로 72번길 25(동인천동행정복지센터 3층)
- 사업기간 : 2025. 3월 ~ 5월
- 내용 : 체력단련실 리모델링을 통한 주민이용시설 환경 개선

□ 추진상황

- 2025. 3. 17. : 주민자치센터 체력단련실 환경개선 추진계획 수립
- 2025. 3. 25. : 주민자치센터 체력단련실 환경개선 공사 계약 체결
- 2025. 4. 1. : 공사 착공
- 2025. 4. 25. : 공사 준공
- 2025. 5. 1. : 체력단련실 개관

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	월미도 문화의 거리 만국기 게시대 설치(2차)		제안자	황*한
부서명	개항동	담당자	행정7급 서지연	연락처 760-6225
추진상황	예산	20,000천원	집행액	19,239천원
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
			○	100%


□ 개요

- 위치 : 월미문화로 36(문화의 거리 일원)
- 사업기간 : 2025. 3. ~ 5.
- 내용 : 월미도 문화의 거리 만국기 게시대 확장 설치 및 1차 설치된 만국기 게시대 보수

□ 추진상황

- 2025. 3. : 제안자 의견 청취 및 공사 업체 확인
- 2025. 4.
 - 월미도 문화의 거리 만국기 게시대 설치(2차) 계획 수립
 - 만국기 게시대 설치에 따른 도로점용허가 신청(개항동 → 인천 중구 건설과)
 - 만국기 게시대 설치에 따른 도로점용허가 신청 회신(인천 중구 건설과 → 개항동)
 - 공사 계약 및 착공
- 2025. 5. : 공사 준공

□ 관련사진

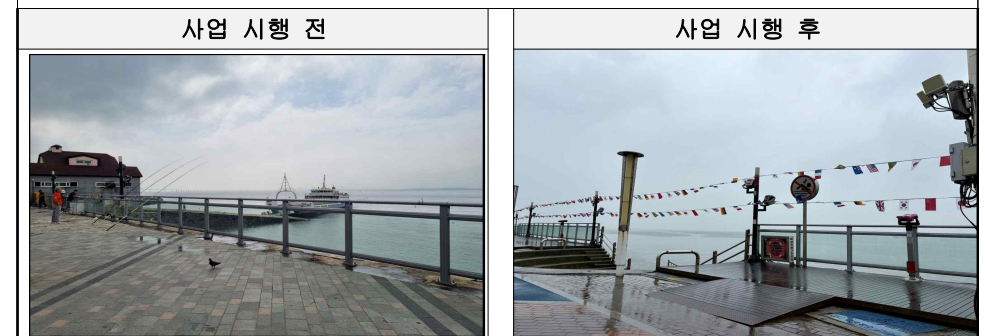

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	어울터 출입구 및 지하층 입구 개선 공사		제안자	원*호
부서명	개항동	담당자	행정7급 서지연	연락처 760-6225
추진상황	예산	11,000천원	집행액	10,670천원
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
			○	100%


□ 개요

- 위치 : 개항동 어울터(참외전로37번길 5)
- 사업기간 : 2025. 3. ~ 4.
- 내용
 - 어울터 주출입구 자동문 교체
 - 지하층 입구 및 계단 벽 보수 공사

□ 추진상황

- 2025. 3. : 제안자 의견 청취 및 공사 업체 확인
- 2025. 4.
 - 어울터 출입구 및 지하층 입구 개선 공사 사업 계획 수립
 - 공사 계약 및 착공
 - 공사 준공

□ 관련사진

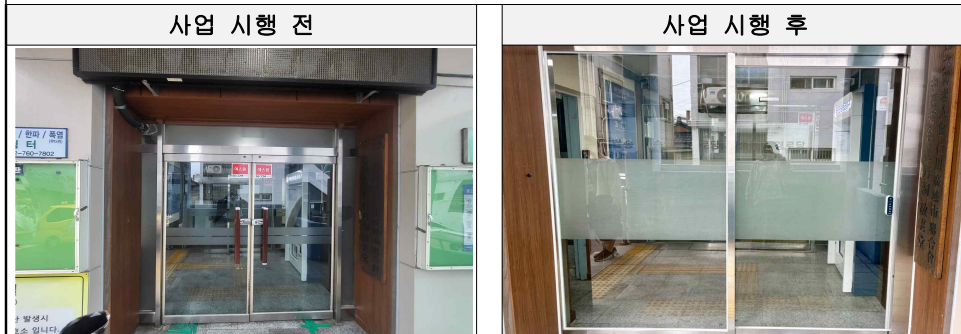

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	우리 동네 마을 게시판 설치		제안자	황*욱
부서명	개항동	담당자	행정7급 서지연	연락처 760-6225
추진상황	예산	5,000천원	집행액	-
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
			○	40%

□ 개요

- 위치 : 개항동 관내
- 사업기간 : 2025. 6. ~ 7.
- 내용 : 개항동 일원 게시판 설치


□ 추진상황

- 2025. 3. : 제안자 의견 청취 및 업체, 설치 위치 등 검토
- 2025. 6.
 - 게시판 설치 위치 선정 및 도로점용 가능 여부 검토 의뢰(개항동 → 인천 중구 건설과)
 - 도로 점용 가능 여부 회신(인천 중구 건설과 → 개항동)
 - 우리 동네 마을 게시판 설치 사업 계획 수립 및 업체 선정
 - 물품 구매 계약
 - 게시판 설치에 따른 도로점용허가 신청(개항동 → 인천 중구 건설과)
 - 게시판 설치에 따른 도로점용허가 신청 회신(인천 중구 건설과 → 개항동)

□ 향후계획

- 2025. 7. : 물품 제작 및 설치

□ 관련사진

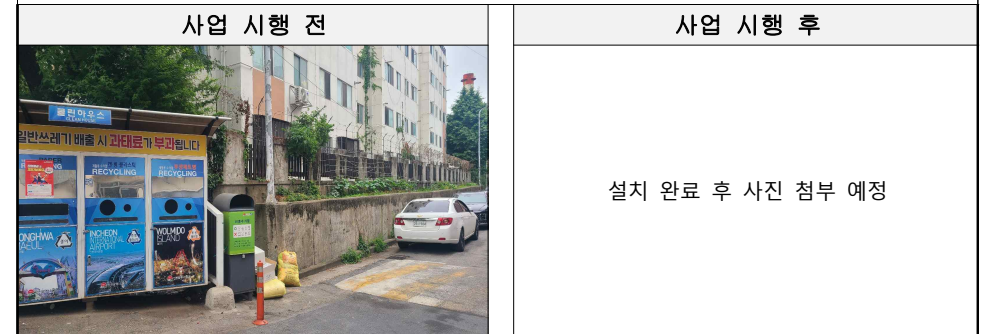

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	개항동 벤치 설치			제안자	조*옥
부서명	개항동	담당자	행정7급 서지연	연락처	760-6225
추진상황	예산	4,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		20%	

□ 개요

- 위치 : 개항동 관내
- 사업기간 : 2025. 6. ~ 7.
- 내용 : 개항동 일원 벤치 설치

□ 추진상황

- 2025. 3. : 제안자 의견 청취 및 업체, 설치 위치 등 검토
- 2025. 6.
 - 벤치 설치 위치 선정 및 도로점용 가능 여부 검토 의뢰(개항동 → 인천 중구 건설과)
 - 도로 점용 가능 여부 회신(인천 중구 건설과 → 개항동)
 - 벤치 설치 사업 계획 수립 및 업체 선정

□ 향후계획

- 2025. 7. : 도로점용 허가 신청 및 물품 구매 계약 및 설치

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	<p>설치 완료 후 사진 첨부 예정</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	영종동 로컬푸드와 아.나.바.다 콜라보			제안자	조*주
부서명	영종동	담당자	행정 7급 노창균	연락처	760-8898
추진상황	예산	18,870천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		10%	

□ 개요

- 위치 : 미단시티 근린공원 內 광장
- 사업기간 : 2025. 1월 ~ 12월 중
- 내용
 - 도농 지역인 영종동의 특산물 판매를 통한 지역 농가 살리기
 - 주민들 간의 나눔 문화 확산 및 소통

□ 추진상황

- 「영종 주민의 날」 맞이 플리마켓 시행 예정이었으나 (주민참여예산 미사용) 제21대 대통령 선거로 인해 미개최하였음

□ 향후계획

- 영종동 특산물 수확 시기(가을 이후) 이후 플리마켓 및 로컬푸드 판매를 통한 지역 농가 살리기 플리마켓 진행 예정
- 고구마, 쌀 등 로컬푸드 판매 물품 확보를 위해 참가 농가 모집 예정

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	<p>사업 시행 후 사진 첨부 예정</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	영종동 꽃 모종 재배 및 나누기 계속 사업			제안자	신*산
부서명	영종동	담당자	행정 7급 노창균	연락처	760-8898
추진상황	예산	9,490천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		10%	

□ 개요

- 위치 : 운북동 170
- 사업기간 : 2025. 3월 ~ 12월
- 내용 : 비닐하우스에서 꽃모종을 재배하여 주민들에게 나눠주고 금산IC 및 영종동 일원에 꽃을 심어 영종동 미관 개선

□ 추진상황

- 예산 집행 없이 무료로 꽃씨(메리골드) 및 모종(수국, 카라 등)을 나눔 받아 모종 재배 중

□ 향후계획

- 주민자치위원들의 순번에 따라 지속적인 생육 예정

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	주민과 함께하는 플리마켓(아나바다)			제안자	한*희
부서명	영종1동	담당자	행정8급 이유리	연락처	760-6364
추진상황	예산	15,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		0%	

□ 개요

- 위치 : 하늘체육공원 게이트볼장
- 사업기간 : 2025. 9. 18.(목)
- 내용 : 알뜰시장 행사를 통해 지역주민간의 소통의 장을 마련

□ 향후계획

- 2025. 8월 限 : 계획 수립

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	영종1동 건강체조 프로그램			제안자	이*대
부서명	영종1동	담당자	행정8급 이유리	연락처	760-6364
추진상황	예산	13,200천원	집행액	3,758천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		50%	

□ 개요

- 위치 : 하늘체육공원 게이트볼장
- 사업기간 : 2025. 3~5월 / 9~11월(매주 목요일, 19:00~20:00)
- 내용 : 주민 연령을 고려한 건강체조 프로그램 운영

□ 추진상황

- 2025. 02. 21. : 상반기 계획 수립
- 2025. 02. 21. : 상반기 강사 모집 공고
- 2025. 03. 14. : 상반기 강사 면접 및 채용
- 2025. 03. 27. ~ 05. 29. : 상반기 운영(총 10회)
- 2025. 07. 02. : 상반기 운영 결과보고

□ 향후계획

- 2025. 8월 限 : 하반기 계획 수립

□ 관련사진

건강체조 운영(상반기)



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	영종1동 주민토크콘서트			제안자	이*선
부서명	영종1동	담당자	행정8급 이유리	연락처	760-6364
추진상황	예산	10,000천원	집행액	6,510천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		50%	

□ 개요

- 위치 : 영종1동행정복지센터 5층 대강당
- 사업기간 : 2025년 6월 / 11월
- 내용 : 주민들이 함께 경험을 나누고 소통하는 자리를 마련하고자, 저명한 강연자를 초청하여 행복하고 건강한 삶에 대한 강연을 듣고 이야기를 나누는 기회 제공

□ 추진상황

- 2025. 05. 14. : 명사 초청 토크콘서트 계획 수립
- 2025. 05. 21. : 행사대행 용역 계약 체결
- 2025. 06. 20. : 명사 초청 토크콘서트 1회차 진행(이지선 교수)

□ 향후계획

- 2025. 11월 : 명사 초청 토크콘서트 2회차 진행

□ 관련사진

토크콘서트(이지선 교수)



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	옹달샘공원 경관 조명 시설			제안자	영종2동 주민자치회 복지봉사분과
부서명	영종2동	담당자	행정 7급 김은주	연락처	760-6304
추진상황	예산	34,440천원	집행액	34,440천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
			○	100%	

□ 개요

- 위치 : 중구 중산동 1903-9 옹달샘공원
- 사업기간 : 2025. 4월
- 내용 : 옹달샘공원 경관 조명 시설 추가 설치 (빅플라워 경관 조명 2식)

□ 추진상황

- 2025. 3월 : 경관 조명 설치 위치 등 검토
- 2025. 4월 : 경관 조명 설치 완료 및 대금 지급

□ 향후계획

- 2025. 연중 : 옹달샘공원 경관 조명 관리

□ 관련사진

사업 시행 전



사업 시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	지역 상권의 활성화를 위한 깨끗한 거리 만들기 환경정화 캠페인			제안자	영종2동 주민자치회 기획교육분과
부서명	영종2동	담당자	행정 7급 김은주	연락처	760-6304
추진상황	예산	3,156천원	집행액	2,389천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		75.7%	

□ 개요

- 위치 : 중구 중산동 1947-4 구읍베타 일원
- 사업기간 : 2025. 3월 ~ 11월 (분기별 1회 실시)
- 내용 : 주민 주도 무단투기 폐기물 수거 및 캠페인 등 환경정화 활동 추진

□ 추진상황

- 2025. 3. 14. : 환경정화 캠페인 실시 (1회차)
- 2025. 6. 17. : 환경정화 캠페인 실시 (2회차)

□ 향후계획

- 2025. 9월 : 환경정화 캠페인 실시 (3회차)
- 2025. 11월 : 환경정화 캠페인 실시 (4회차)

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	가족 건강 걷기 문화 축제			제안자	김*욱
부서명	운서동	담당자	행정 8급 안재두	연락처	760-6257
추진상황	예산	20,000천원	집행액	19,444천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
			○	100%	

□ 개요

- 위치 : 운서동 세계평화의 숲(신도시북로 31-35)
- 사업기간 : 2025. 5월 ~ 6월
- 내용 : 가족 단위로 함께 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠 부스 운영을 포함한 세계평화의 숲 맨발걷기 축제

□ 추진상황

- 2025. 3월 : 행사 계획 수립을 위한 주민자치회 임원회의 및 현장 답사
- 2025. 4월 ~ 5월 : 행사 계획 수립
- 2025. 6월 : 행사 추진 및 사업 정산

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	주민 영화제			제안자	박*철
부서명	운서동	담당자	행정 8급 안재두	연락처	760-6257
추진상황	예산	20,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
			○	10%	

□ 개요

- 위치 : 운서동 내 영화상영관
- 사업기간 : 2025. 6월 ~ 8월
- 내용 : 지역 주민이 참여할 수 있는 영화 상영 및 이벤트 추진

□ 향후계획

- 2025. 6월 ~ 7월 : 행사 계획 수립
- 2025. 8월 : 행사 추진

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
사업 시행 후 사진 첨부 예정	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	소무의도 쓰레기 집하장 설치			제안자	이*선
부서명	용유동	담당자	행정 8급 김민정	연락처	760-6287
추진상황	예산	15,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		30%	

□ 개요

- 위치 : 소무의도 입구 (무의동 998-10)
- 사업기간 : 2025.02. ~ 2025. 07.
- 내용 : 소무의도 쓰레기 집하장을 설치

□ 추진상황

- 2025. 3. : 업체 및 설치 위치 선정
- 2025. 4. : 디자인 결정
- 2025. 5. : 사전 허가 및 부서 간 협의 진행

□ 향후계획

- 2025. 7. : 계약 의뢰 및 공사 착공
- 2025. 8. : 공사 준공

관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	<p>사업 시행 후 사진 첨부 예정</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	을왕리 해수욕장 포토존 교체			제안자	최*중
부서명	용유동	담당자	행정 8급 김민정	연락처	760-6287
추진상황	예산	20,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		40%	

□ 개요

- 위치 : 을왕리 해수욕장 (용유서로302번길 16-15)
- 사업기간 : 2025. 03. ~ 2025. 07.
- 내용 : 노후화된 을왕리 해수욕장 포토존 교체

□ 추진상황

- 2025. 3. : 업체 및 표지판 설치 위치 선정
- 2025. 4. : 문구 및 디자인 확정
- 2025. 6. : 추진계획 수립

□ 향후계획

- 2025. 7. 1. : 공사 계약 및 착공
- 2025. 7. 9. : 공사 준공

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	<p>사업 시행 후 사진 첨부 예정</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 6. 30.)

사업명	남북 5,6통 마을 안내표지판 설치		제안자	손*
부서명	용유동	담당자	행정 8급 김민정	연락처 760-6287
추진상황	예산	8,000천원	집행액	-
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
			○	100%

□ 개요

- 위치 : 남북 5,6통 경계 (남북동 551-1 도로 앞 코너)
- 사업기간 : 2025. 3. ~ 6.
- 내용 : 마을 안내표지판 설치

□ 추진상황

- 2025. 3. : 업체 및 표지판 설치 위치 선정
- 2025. 4. : 디자인 확정
- 2025. 6. 18. : 공사 계약 및 착공
- 2025. 6. 25. : 공사 준공

□ 향후계획

- 마을 안내판 설치 완료 후 하여 주민들에게 마을간의 경계를 안내하고 지역사회 편리성을 높이고자 함.

□ 관련사진

