

2025년도 예산 반영 주민참여예산 사업 목록

(2025. 3. 31. 기준 / 단위:천원)

연번	사업부서 (사업위치)	사업명	사업비	집행액	추진상황		
					시기 미도래	추진중	추진 완료
	총 계	총 46건	1,174,650	148,060	○	○	○
1	노안장애인과	○ 경로당 수돗물 필터 설치	54,000	-		○	
2		○ 북성12통경로당 인근 노후정자 철거 및 파고라 설치	10,753	103,317			○
3	건설과	○ 울목 어린이공원 통로 확보	30,000	-		○	
4		○ 도원동 70계단 광장 승터 환경개선 (계단 조명)	30,000	29,382		○	
5	도시개발과	○ 도원동 70계단 광장 승터 환경개선 (인공폭포 정비)	21,000	-		○	
6	도시공원과	○ 하늘체육공원, 실개천 휴게공간 조성	200,000	-		○	
7		○ 공항신도시 1호 일반광장 정비사업	150,000	9,920		○	
8		○ 산새소리 공원 정비	120,000	-		○	
9		○ 세계평화의 숲 산책로 정비사업	80,000	-		○	
10		○ 하늘도시 26호 연결복지 초화 식재공사	20,000	-		○	
11	신포동	○ 신포동 주민자치센터 환경개선	20,000	-		○	
12		○ 감나무길 벽화 그리기	9,000	-		○	
13		○ 신포동 경관개선사업	7,000	-		○	
14		○ 우리동네 공감교실	4,000	-		○	
15	연안동	○ 라이프아파트 사계절 꽃길 벽화조성	25,000	-		○	
16		○ 컴퓨터 교육 및 스마트폰, 키오스크 교육	12,000	-	○		
17		○ 설·추석 명절 맞이 주민 무던 칼같이 행사	3,000	1,162		○	
18	신흥동	○ 노인가구 타이머록 설치 및 소화기 배부사업	24,850	-		○	
19		○ 주민자치센터 환경개선사업	6,400	-	○		
20		○ 주민자치센터 주방시설 교체사업	3,001	1,434		○	

연번	사업부서 (사업위치)	사업명	사업비	집행액	추진상황		
					시기 미도래	추진중	추진 완료
21	도원동	○ 벽화를 부탁해!	11,990	-	○		
22		○ 우리집을 부탁해! (주거환경개선 사업)	11,000	910		○	
23		○ 도원동 주민 행복·안심등 설치	10,000	-	○		
24		○ 원예 테라피	2,500	-	○		
25		○ 인생한컷 (장수사진)	2,500	-	○		
26	울목동	○ 울목동 공영주차장 화분걸이 설치사업	20,000	-		○	
27		○ 울목동 지역 맞춤형 방역사업	8,000	-		○	
28		○ 태양광 자전거 공기주입기 설치사업	6,500	-		○	
29		○ 아름다운 마을 만들기 초화 식재사업	5,000	-		○	
30	동인천동	○ 체력단련실 등 주민이용시설 환경개선 사업	40,000	-		○	
31	개항동	○ 월미도 문화의 거리 만국기 게시대 설치(2차)	20,000	-		○	
32		○ 어울터 출입구 및 지하층 입구 개선 공사	11,000	-		○	
33		○ 우리 동네 마을 게시판 설치	5,000	-	○		
34		○ 개항동 벤치 설치	4,000	-	○		
35	영종동	○ 영종동 로컬푸드와 아·나·바·다 콜라보	18,870	-		○	
36		○ 영종동꽃 모종 재배 및 나누기 계속사업	9,490	-		○	
37	영종1동	○ 주민과 함께하는 폴리마켓 (아·나·바·다)	15,000	-	○		
38		○ 영종1동 건강체조 프로그램	13,200	1,258		○	
39		○ 영종1동 주민토크콘서트	10,000	-	○		
40	영종2동	○ 용달샘공원 경관 조명 시설	34,440	-		○	
41		○ 지역 상권의 활성화를 위한 깨끗한 거리 만들기 환경정화 캠페인	3,156	677		○	
42	운서동	○ 가족 건강 걷기 문화 축제	20,000	-		○	
43		○ 주민 영화제 (운서동 시네마 천국)	20,000	-		○	
44	용유동	○ 소무의도 쓰레기 집하장 설치	20,000	-		○	
45		○ 을왕리 해수욕장 포토존 교체	15,000	-		○	
46		○ 남북 5.6통 마을 안내표지판 설치	8,000	-		○	

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	경로당 수돗물 필터 설치			제안자	장*훈
부서명	노인장애인과	담당자	사회복지7급 이진희	연락처	760-7323
추진상황	예산	54,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		10%	

□ 개요

- 위치 : 중구 관내 경로당 45개소 (사립공동주택 경로당 제외)
- 사업기간 : 2025. 4. 7. ~ 2025. 5. 10.
- 내용 : 수돗물 주공급 파이프에 필터가 내장된 장비 설치

□ 추진상황

- 사업 추진 계획 수립

□ 향후계획

- 2025. 4월 : 물품 구입 및 용역 계약 의뢰 및 착수
- 2025. 5월 : 설치 완료

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	북성12통경로당 인근 노후정자 철거 및 파고라 설치			제안자	허*숙
부서명	노인장애인과	담당자	사회복지7급 이진희	연락처	760-7323
추진상황	예산	10,753천원	집행액	10,317천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
			○	100%	

□ 개요

- 위치 : 중구 제물량로 335번길 39
- 사업기간 : 2025.2.12. ~ 2025.3.12.
- 내용 : 북성12통경로당 인근 노후정자 철거 및 파고라 설치

□ 추진상황

- 2025. 2. 12 : 공사 계약 의뢰
- 2025. 2. 18 : 공사 계약 및 착공
- 2025. 3. 11 : 공사 준공

□ 향후계획

- 파고라 설치 완료 후 지역 주민 유희공간으로 사용

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	울목어린이공원 통로 확보 공사		제안자	이*택
부서명	건설과	담당자	시설 7급 최정현	연락처 760-7454
추진상황	예산	30,000천원	집행액	-
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
		○		30%

□ 개요

- 위치 : 울목동 231-55 일원
- 사업기간 : 2025. 3월 ~ 4월
- 내용 : 통로 확보 1식 (보도블럭 설치 및 영산홍 식재 등)

□ 추진상황

- 2025. 2월 : 사업 관련 현장 확인
- 2025. 3월 : 추진계획 수립
- 2025. 3. 24. : 공사 착공

□ 향후계획

- 2025. 4. 18. : 공사 준공

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	<p>사업 시행 후 사진 첨부 예정</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	도원동 70계단 광장 쉼터 환경개선 (계단조명)		제안자	김*윤
부서명	건설과	담당자	전기운영 6급 오준석	연락처 760-7832
추진상황	예산	30,000천원	집행액	29,382천원
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
		○		10%

□ 개요

- 위치 : 도원동 70계단 일원
- 사업기간 : 2025. 3. 13. ~ 5. 11.
- 내용 : LED바 48개소 설치, LED 투광등 2개소 설치
고보조명 1개소 설치


□ 추진상황

- 2025. 3. 13. : 공사 착공

□ 향후계획

- 2025. 5. 11. : 공사 준공 예정

□ 관련사진

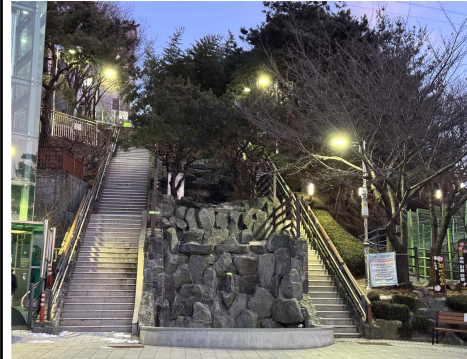사업 시행 전	사업 시행 후
	<p>사업 시행 후 사진 첨부 예정</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	도원동 70계단쉼터 환경개선사업			제안자	김*윤
부서명	도시개발과	담당자	녹지 9급 최예인	연락처	760-7584
추진상황	예산	2,100천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		10%	

□ 개요

- 위치 : 도원동 70계단 쉼터(도원동 71-44번지 일원)
- 사업기간 : 2025. 4월 ~ 6월
- 내용 : 쉼터 내 인공폭포에 경관조명 설치를 통해 폭포가 가동하지 않는 계절 및 시간의 미적 경관 향상으로 도심 속 힐링 공간 형성

□ 추진상황

- 2024. 7월 : 2025년 주민참여예산 선정 결과 통보(←총무과)
- 2025. 3월 : 현장확인 및 공사 설계 완료

□ 향후계획

- 2025. 4월 : 공사계약의뢰(→재무과)
- 2025. 4월 : 공사 착공
- 2025. 6월 : 공사 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	하늘체육공원 실개천 휴게공간 조성사업			제안자	이*숙
부서명	도시공원과	담당자	녹지7급 천지선	연락처	760-7777
추진상황	예산	200,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		10%	

□ 개요

- 위치 : 하늘체육공원, 완충녹지20호 등 (중산동 1878-3 일원)
- 사업기간 : 2025. 1월 ~ 6월
- 내용
 - 실개천 화단재정비, 테마파크화 등 휴게공간 조성
 - 조경·편의시설 설치, 배수체계 정비, 수목 및 초화 식재 등

□ 추진상황

- 2025. 1월 : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

- 2025. 4월 : 실시설계용역 완료
- 2025. 5월 : 공사 착공
- 2025. 6월 : 공사 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	공향신도시 1호 일반광장 정비사업			제안자	이*학
부서명	도시공원과	담당자	녹지 9급 어지연	연락처	760-8848
추진상황	예산	150,000천원	집행액	9,920천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		20%	

□ 개요

- 위치 : 공향신도시 1호 일반광장 (운서동 2667)
- 사업기간 : 2025. 2월 ~ 6월
- 내용
 - 실시설계용역 1식
 - 철거공 : 별개제근 90㎡, 소형고압블럭포장 460㎡, 철평석포장 135㎡, 계단 1식 이설, 등 의자 및 야외테이블 등
 - 식재공 : 남천 외 3종 1,080주
 - 포장공 : 인조화강석블럭 595㎡, 결계석 16m
 - 시설물공 : 계단 1개소, 피크닉테이블 2개소, 태양광볼라드등 20개소 등
 - 폐기물 운반 및 처리 : 102ton


□ 추진상황

- 2025. 2월 ~ 3월 : 실시설계용역 준공
- 2025. 4월 : 공향신도시 1호 일반광장 정비사업 시행

□ 향후계획

- 2025. 4월 ~ 6월 : 공향신도시 1호 일반광장 정비사업 추진

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	<p>사업 시행 후 사진 첨부 예정</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	월촌공원(산새소리공원) 정비사업			제안자	한*구
부서명	도시공원과	담당자	녹지7급 천지선	연락처	760-7777
추진상황	예산	120,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		10%	

□ 개요

- 위치 : 월촌공원 (중산동 1912-1)
- 사업기간 : 2025. 1월 ~ 6월
- 내용
 - 산책로(계단) 정비, 휴게시설 및 보행매트·안전시설 설치 등

□ 추진상황

- 2025. 1월 : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

- 2025. 4월 : 실시설계용역 완료
- 2025. 5월 : 공사 착공
- 2025. 6월 : 공사 준공

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	<p>사업 시행 후 사진 첨부 예정</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	세계평화의 숲 산책로 정비사업			제안자	장*재
부서명	도시공원과	담당자	녹지 7급 지호승	연락처	760-7787
추진상황	예산	80,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		10%	

□ 개요

- 위치 : 공항신도시 1호 완충녹지 (운서동 2810-1)
- 사업기간 : 2025. 5월 ~ 6월
- 내용
 - 마사토 포장 3,000㎡ (약 1km)
 - 주민 편의시설 설치 등


□ 추진상황

- 2025. 3월 ~ 4월 : 현장점검 및 자체설계

□ 향후계획

- 2025. 5월 ~ 6월 : 세계평화의 숲 산책로 정비사업 추진

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	하늘도시 26호 연결녹지 초화 식재공사			제안자	이*학
부서명	도시공원과	담당자	녹지 9급 어지연	연락처	760-7787
추진상황	예산	20,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		10%	

□ 개요

- 위치 : 하늘도시 26호 연결녹지 (운남동 1766-6 일원)
- 사업기간 : 2025. 7월 ~ 8월
- 내용 : 튤립, 꽃무릇 등 초화 식재


□ 추진상황

- 2025. 3월 ~ 4월 : 현장점검 및 자체설계

□ 향후계획

- 2025. 5월 ~ 6월 : 하늘도시 26호 연결녹지 초화 식재공사 추진

□ 관련사진

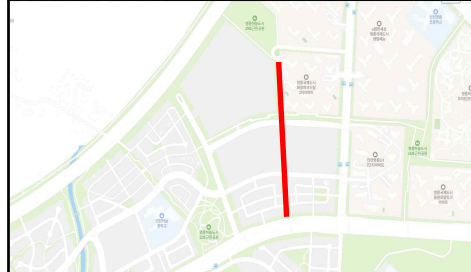사업 시행 전	사업 시행 후
	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	신포동 주민자치센터 환경개선			제안자	조*자
부서명	신포동	담당자	행정8급 이상미	연락처	760-6106
추진상황	예산	20,000천원	집행액	-	
	시기미도래	추진중	완료	추진율	
		○		30%	

□ 개요

- 위치 : 신포동 주민자치센터(인중로 174번길 16)
- 사업기간 : 2025. 4. 7. ~ 4. 18.限 【12일】 ※ 휴일 작업 포함
- 내용 : 2025년 신포동 주민자치센터 환경개선 공사
※ 전기공사와 도장·미장공사는 별도로 시행 예정

전기공사	도장·미장공사
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 외부공사 <ul style="list-style-type: none"> - 주민자치센터 장애인 경사로 타일 보수 및 미장공사 - 주민자치센터 외벽 현수막 걸개 설치 - 주민자치센터 외벽 도장공사 - 주민자치센터 뒤쪽 깨진 선홍통 보수 ○ 내부공사 <ul style="list-style-type: none"> - 1층 주민자치회 사무실 뒤쪽 비상문 및 방충망 설치 - 1층 관리자실 문 고리 보수 - 2층 다목적실 벽기둥의 벗겨진 시트지 보수

- 외부공사
 - 주민자치센터 외벽 전선 정비
- 내부공사
 - 지하실 전기 차단 공사
 - 1층 화장실 ~ 계단 천장 위 형광등 교체
 - 1·2층 남녀 화장실 스위치 교체
 - 2층 여자 화장실 환풍기 교체
 - 주민자치센터 2층 차단기 교체

[변경사항]

변경 전	변경 후	
옥상 방수공사 시행	→ 옥상 방수공사 미시행	장애인 경사로 미장공사 실시

[변경사유] ※ 제안자 및 주민자치위원님들 모두 동의

- ① **공사업체 옥상 진단 결과, 옥상 누수 없음**
오히려 문제는 누수가 아닌, 2018년 잘못된 시공된 '시트 방수' 방식으로, 옥상에는 부적합
옥상 방수는 '초록색 방수칠'이 적합하며, 이를 위해 기존 시트 및 접착제 제거 후, 방수칠 재시공해야 함. 공정이 복잡하며, 대규모 인건비가 들어가, 예산 초과 예상
[공사업체에서 방수공사 비추천]
→ 옥상 방수공사 미시행
- ② 예산이 '시설비'로 편성되어 있어, 옥상 방수공사 대신 장애인 경사로 미장공사로 변경하는 것은 예산 통계목상 문제없음(총무과 주민자치팀, 기획예산실 확인)
→ 옥상 방수공사 대신, 장애인 경사로 미장공사로 대체

□ 추진상황

- 2025. 3. 4. : 2025년 주민참여예산사업(4개 사업) 논의(주민자치회 자치기획운영분과)
 - 논의내용 : 사업 진행 시기, 공사업체 선정, 세부 사업 내용 등
- 2025. 3. 13. : 도장·미장 공사업체와 현장 논의
- 2025. 3. 17. : 전기 공사업체와 현장 논의
- 2025. 3. 26. : 주민자치회 임원 회의 후, 세부 사업 내용 확정

□ 향후계획

- 2025. 4. 7. : 전기공사 계약 및 착공
 - 도장·미장 공사업체와 착공 전, 현장 사전 점검
- 2025. 4. 8. : 도장·미장공사 계약
 - 전기공사 준공
- 2025. 4. 11. : 도장·미장공사 착공
- 2025. 4. 18.限 : 도장·미장공사 준공

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
<p>전기공사 시행 전</p> 	<p>전기공사 시행 후</p> <p>사업 시행 후 사진 첨부 예정</p>
<p>도장·미장공사 시행 전</p> 	<p>도장·미장공사 시행 후</p> <p>사업 시행 후 사진 첨부 예정</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	감나무길 벽화 그리기			제안자	진*근
부서명	신포동	담당자	행정8급 이상미	연락처	760-6106
추진상황	예산	9,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		10%	

□ 개요

○ 위치

- **인성여고 앞 공영주차장 앞 벽 담장(송학동 3가 3-1) 【변동】**
- **호남 택배 동인천점 앞 벽 담장(신포로47번길 21) 【변동】**

※ 위치변경사유 : 당초 계획이었던 동국빌리지 옹벽은 동국빌리지 주민들 반대로 무산되어 대체 위치 선정

○ 사업기간 : 2025년 5월 초 【미정】

- 내용 : 신포동 관내 낡은 벽들에 벽화를 그려, 동 이미지 제고 및 경관 개선
- ※ **벽화 그리기 사업 추진시, 인천중부경찰서 하인천지구대원 참여 예정**

□ 추진상황


- 2025. 3. 4. : 2025년 주민참여예산사업(4개 사업) 논의(주민자치회 자치기획운영분과)
- 논의내용 : 사업 진행 시기, 벽화 시공 업체 선정, 벽화 디자인 추천, 동의서 확보 등

□ 향후계획

- 2025. 4. 4. : 2025년 벽화 그리기 사업 논의 및 벽화 시공 예정지 현장 점검
- 2025. 4월 말 : 벽화 시공 업체 선정
- 2025. 5월 초 : 벽화 시공 계약
- 벽화 그리기 추진(장마철 시기 고려 예정)

□ 관련사진

사업 시행 전

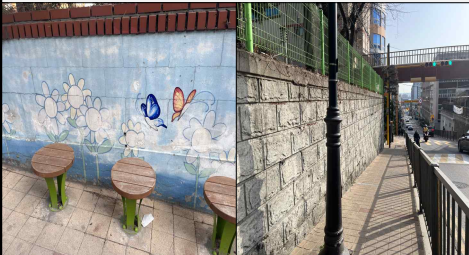

사업 시행 후

사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	신포동 경관개선사업			제안자	유*선
부서명	신포동	담당자	행정8급 이상미	연락처	760-6106
추진상황	예산	7,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		10%	

□ 개요

- 위치 : ① 신포동 행정복지센터 앞, 신포로35번길 76 감나무 화단 【4월】
② 신포로35번길 감나무길 【10월】

○ 사업기간 : 2025. 4 ~ 10월

○ 내용

- **에메랄드 그린 · 감나무 식재 및 관수 【4월】**
- 기존 직사각 화분 내 고사목 제거 후, 에메랄드 그린 식재
- 동 행정복지센터 앞 걸개형 화단 철거
- 기존 답동사거리~사동삼거리 배치한 직사각 화분을 동 행정복지센터 앞으로 재배치
- 감나무 3그루 추가 식재(신포로35번길 76 감나무 화단 내 빈 공간)
- **신포로35번길 감나무 감 수확 행사 【10월】**
- 감나무길 비료 주기 및 감 수확
- ※ 식재, 관수 및 감나무 수확 행사 시, 주민자치회, 통장자율회 등 참여 예정

□ 추진상황


- 2025. 3. 4. : 2025년 주민참여예산사업(4개 사업) 논의(주민자치회 자치기획운영분과)
- 논의내용 : 사업 진행 시기, 조경업체 선정, 세부 사업 내용 등

□ 향후계획

- 2025. 4. 3. : 2024년 식재한 꽃 · 나무 점검(고사목 등 확인)
- 2025. 4. 4. : 신포동 경관개선사업 관련 논의(초화 식재 시기 및 장소 결정 등)
- 2025. 4월 초 : 계약 및 물품(에메랄드 그린, 꽃잔디, 감나무) 구입
- 나무 식재 및 관수 작업
- 2025. 10월 : 신포로35번길 감나무 감 수확 행사

□ 관련사진

사업 시행 전



사업 시행 후

사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	우리동네 공감교실			제안자	이*희
부서명	신포동	담당자	행정8급 이상미	연락처	760-6106
추진상황	예산	4,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		10%	

□ 개요

- 위치 : 신포동 주민자치센터(인중로174번길 16)
- 사업기간 : 2024. 7 ~ 10월
- 내용 : 평소 주민자치센터 프로그램으로 접할 수 없는 주제를 선정하여, 신포동 주민을 위한 특별 강의 프로그램 운영
 - 프로그램 종류 **【미정 / 가안】** : 캘리그라피, 힐링 노래교실, 한지공예, 서예교실


□ 추진상황

- 2025. 3. 4. : 2025년 주민참여예산사업(4개 사업) 논의(주민자치회 자치기획운영분과)
 - 논의내용 : 사업 진행 시기, **각 분과별로 한 가지씩 프로그램 선정** 등

□ 향후계획

- 2025. 4. 30.限 : 주민자치센터 프로그램 최종 선정(**분과별 1개 프로그램 운영**)
- 2025. 5월 초 : 사업 내용 및 일정 협의
 - ‘우리마을 공감교실’ 추진 계획 수립
- 2025. 5월 중 : 프로그램 강사 및 수강생 모집
- 2025. 6 ~ 10월 : 프로그램 진행 및 운영 **【상 · 하반기】**

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	라이프아파트 사계절 꽃길 벽화조성			제안자	김*천
부서명	연안동	담당자	행정8급 최은정	연락처	760-6125
추진상황	예산	25,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		0%	

□ 개요

- 위치 : 연안동 라이프아파트 둘레길(12동 ~ 14동 앞 방음벽)
- 사업기간 : 2025. 1월 ~ 12월
- 내용 : 식재 구간과 연결하여 꽃 그림 벽화를 조성하여 보다 쾌적한 보행환경 조성


□ 추진상황

- 2025. 3월 말 ~ 현재 : 업체 선정 및 벽화 시안 논의

□ 향후계획

- 2025. 4. 17. : 벽화 디자인에 대한 위원 의견 수렴(주민자치회 회의)
- 2025. 5. 2. 限 : 벽화 디자인 최종 확정
- 2025. 5. 3. ~ : 업체 계약 및 벽화 조성 착수

□ 관련사진

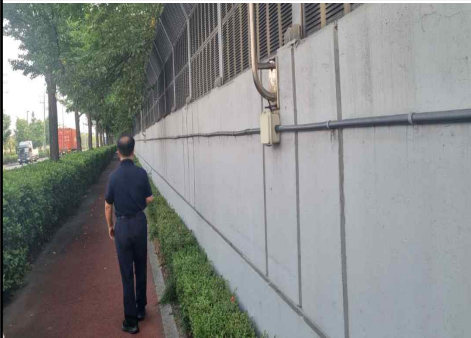사업 시행 전	사업 시행 후
	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	컴퓨터 교육 및 스마트폰, 키오스크 교육		제안자	최*구
부서명	연안동	담당자	행정8급 최은정	연락처 760-6125
추진상황	예산	12,000천원	집행액	-
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
	○			0%

□ 개요

- 위치 : 연안동 행정복지센터 프로그램4실
- 사업기간 : 2025. 4월 ~ 10월
- 내용 : 디지털 취약계층이 많은 연안동 주민들에게 정보통신 교육을 실시하여 일상생활에서 디지털기기를 활용할 수 있도록 도움


□ 추진상황

- 해당없음

□ 향후계획

- 2025. 4월 : 사업계획 구체화
 - 교육 계획 수립, 강사 섭외, 노트북·키오스크 임차, 교육 공간 조성, 현수막 제작 등
- 2025. 5월 ~ 10월 : 강사 초빙 교육 실시

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	설·추석 명절 맞이 주민 무던 칼같이 행사		제안자	조*석
부서명	연안동	담당자	행정8급 최은정	연락처 760-6125
추진상황	예산	3,000천원	집행액	1,162천원
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
	○			38.7%

□ 개요

- 위치
 - 설 명절 맞이 칼같이 행사 : 연안동 행정복지센터 5층 회의실
 - 추석 명절 맞이 칼같이 행사 : 라이프아파트 4동 앞
- 사업기간 : 2025. 1월, 9월
- 내용 : 설·추석 명절 전 주민 대상 무료 칼같이 서비스 제공



□ 추진상황

- 2025. 1. 15. ~ 1. 22. : 사업 홍보 및 현수막 게시
- 2025. 1. 21. ~ 1. 22. : 설 명절 맞이 칼같이 행사 추진
- 2025. 2. 19. : 칼같이 서비스 제공 비용 지출

□ 향후계획

- 2025. 9. 30. 限 : 추석 명절 맞이 칼같이 행사 개최

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	노인가구 타이머 콕 설치 및 소화기 배부사업		제안자	오*영
부서명	신흥동	담당자	행정 7급 송문희	연락처 760-6144
추진상황	예산	24,850천원	집행액	-
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
		○		0%

□ 개요

- 사업대상 : 안전 취약계층인 노인가구 및 장애인, 1인 가구 등
- 사업기간 : 2025. 5월 ~ 10월
- 내용 : 안전 취약계층인 노인가구 및 장애인, 1인 가구 등을 대상으로 가스레인지 과열 사고 및 화재 예방을 위한 타이머 콕 설치와 스프레이 소화기 배부로 안전한 주거환경 조성.

□ 추진상황

- 2025. 3. 25. ~ 현재 : 안전 취약계층 대상자 사전 조사

□ 향후계획

- 2025. 4. 11. : 노인가구 타이머콕 설치 및 소화기 배부사업 추진계획 수립
- 2025. 4. 18. : 안전 취약계층 대상자 확정
- 2025. 4. 21. ~ 4. 25. : 가스콕 및 소화기 구매
- 2025. 5월 ~ 10월 : 통별 조 편성 후 설치 및 배부

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
사업 시행 후 사진 첨부 예정	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	주민자치센터 환경개선사업			제안자	노*직
부서명	신흥동	담당자	행정 7급 송문희	연락처	760-6144
추진상황	예산	6,400천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		0%	

□ 개요

- 위치 : 신흥동 주민자치센터 옥상(중구 도원로 4), 신흥동 행정복지센터 내 체력단련실(중구 제물량로80번길 3-14)
- 사업기간 : 2025. 4월 ~ 6월
- 내용 : 주민자치센터 옥상 방수공사 및 체력단련실(샤워실) 수전 교체


□ 추진상황

- 해당 없음

□ 향후계획

- 2025. 4월 말 : 주민자치센터 환경개선사업 계획 수립
- 2025. 5. 7 ~ 5. 9. : 체력단련실 샤워기 수전 교체
- 2025. 5. 12. ~ 5. 30. : 주민자치센터 옥상 방수공사

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	주민자치센터 주방시설 교체사업			제안자	박*홍
부서명	신흥동	담당자	행정 7급 송문희	연락처	760-6144
추진상황	예산	3,001천원	집행액	1,434천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		47.8%	

□ 개요

- 위치 : 신흥동 주민자치센터 1층 주방 및 창고(중구 도원로 4)
- 사업기간 : 2025. 3월 ~ 4월
- 내용 : 노후하고 협소한 주민자치센터 내 주방시설 교체 및 정비

□ 추진상황

- 2025. 3. 28. : 신흥동 주민자치센터 주방시설 교체사업 계획 수립
- 2025. 3. 29. : 냉장고 및 주방 선반 조리대(하부장) 구입

□ 향후계획

- 2025. 4월 : 수전 교체 및 앵글 선반 구입 후 조리도구 등 정비

□ 관련사진

사업 시행 전		사업 시행 중	
			냉장고 (배송 중)

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	벽화를 부탁해!			제안자	임*승
부서명	도원동	담당자	행정8급 이종찬	연락처	760-6164
추진상황	예산	11,900	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		0%	

□ 개요

- 위치 : 도원동 관내
- 사업기간 : 2025.4. ~ 12.
- 내용 :
 1. 노후된 주택가 담장 및 재정비가 필요한 벽화구역 대상
 2. 노후화된 지역 환경 개선

□ 추진상황

- 설치 장소 선정 中

□ 향후계획

- 4월 : 사업장소 선정, 소유주 동의서 징구
- 5월 : 업체선정
- 6월 : 벽화그리기 실시
- 7월 ~ 8월 : 모니터링 (주민 인터뷰, 주민자치위원 확인 등)
- 9월 : 최종 평가(사진기록·인터뷰 등 발표) → 주민총회

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
사업 시행 후 사진 첨부 예정	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	우리집을 부탁해! (정리수납 교육 + 주거환경개선사업)			제안자	박*자
부서명	도원동	담당자	행정8급 이종찬	연락처	760-6164
추진상황	예산	11,990	집행액	910천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		8%	

□ 개요

- 위치 : 도원동 관내 (1~5개 예정)
- 사업기간 : 2025.2. ~ 12.
- 내용 : 도원동 관내 취약계층 대상으로 주민자치위원 대상 정리수납 교육 진행 후 주거환경 취약계층 세대 정리수납 및 주거환경 개선 사업 실시

□ 추진상황

- 2월 ~ 3월 : 봉사자 정리수납 교육 및 수료

□ 향후계획

- 4월 : 정리수납 대상자 선정 및 동의서 징구
- 4월 ~ 6월 : 상반기 주거환경개선 사업 실시 및 하반기 대상자 선정
- 9월 : 최종 평가(사진기록·인터뷰 등 발표) → 주민총회

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	도원동 주민 행복·안심등 설치			제안자	유*환
부서명	도원동	담당자	행정8급 이종찬	연락처	760-6164
추진상황	예산	10,000	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		0%	

□ 개요

- 위치 : 도원동 관내
- 사업기간 : 2025.5. ~ 12.
- 내용 : 관내 환경개선 및 야간통행 안전 확보를 위한 로고젝터 설치


□ 추진상황

- 후보지 선정 및 업체선정 中

□ 향후계획

- 5월 : 허가부서 협조요청, 업체 선정
- 5월 ~ 6월 : 행복·안심등 설치
- 7월 ~ 8월 : 모니터링 (주민 인터뷰, 주민자치위원 확인 등)
- 9월 : 최종 평가(사진기록·인터뷰 등 발표) → 주민총회

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	원예테라피 (환경 개선을 위한 초화 가꾸기)		제안자	민*기
부서명	도원동	담당자	행정8급 이종찬	연락처 760-6164
추진상황	예산	2,500	집행액	-
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
	○			0%

□ 개요

- 위치 : 도원동 관내 공터 및 개인 사유지, 화분설치지
- 사업기간 : 2025.4. ~ 12.
- 내용 : 도원동 관내 쓰레기 무단투기지역, 공터 또는 공공용 토지 등을 활용한 초화 식재

□ 추진상황

- 설치 장소 선정 中

□ 향후계획

- 4월 : 공가·공터 선정 및 초화·식재 대상지역 선정 및 동의서 징구
- 5월 ~ 12월 : 초화·식재 및 홍보 (상시)
- 7월 ~ 8월 : 모니터링 (주민 인터뷰, 주민자치위원 확인 등)
- 9월 : 최종 평가(사진기록·인터뷰 등 발표) → 주민총회

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
사업 시행 후 사진 첨부 예정	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	인생한컷 (장수사진)		제안자	이*도
부서명	도원동	담당자	행정8급 이종찬	연락처 760-6164
추진상황	예산	2,500	집행액	-
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
	○			0

□ 개요

- 위치 : 도원동 관내
- 사업기간 : 2025.5. ~ 12.
- 내용 : 관내 85세 이상 어르신 장수사진 촬영 및 액자 제작

□ 추진상황

- 대상자 선정 및 업체선정 中

□ 향후계획

- 5월 : 촬영
- 6월 ~ 12월 : 사진 전달
- 7월 ~ 8월 : 모니터링 (주민 인터뷰, 주민자치위원 확인 등)
- 9월 : 최종 평가(사진기록·인터뷰 등 발표) → 주민총회

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
사업 시행 후 사진 첨부 예정	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	울목동 공영주차장 화분걸이 설치사업			제안자	공*환
부서명	울목동	담당자	행정7급 이두열	연락처	760-6185
추진상황	예산	20,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		20%	

□ 개요

- 위치 : 울목동 공영주차장 외부 펜스
- 사업기간 : 2025. 5월 / 9월
- 내용 : 울목동 공영주차장 외부 펜스에 봄·가을 화분걸이 설치

□ 추진상황

- 2025. 3월
 - 제안자의 의견 청취 및 업체 확인
 - 공영주차장 관련부서(교통운수과) 협조 요청

□ 향후계획

- 2025. 4월 : 화분걸이 업체 선정 및 물품 구입
- 2025. 5월 : 공영주차장 외부펜스 봄 화분걸이 설치
- 2025. 9월 : 가을 화분걸이 설치

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	울목동 지역 맞춤형 방역사업			제안자	김*분
부서명	울목동	담당자	행정7급 이두열	연락처	760-6185
추진상황	예산	8,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		20%	

□ 개요

- 위치 : 울목동 관내 방역 소독 취약 지역
- 사업기간 : 2025. 5월 ~ 9월
- 내용 : 울목동 관내 방역 소독 취약 지역 5개월간 주 2회 집중 방역 소독

□ 추진상황

- 2025. 3월 : 제안자의 의견 청취 및 방역 방법, 범위 등 검토

□ 향후계획

- 2025. 4월 : 방역 업체 선정 및 용역 발주
- 2025. 5월 ~ 9월 : 취약 지역 방역 및 소독 시행

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
사업 시행 후 사진 첨부 예정	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	태양광 자전거 공기주입기 설치사업			제안자	노*곤
부서명	율목동	담당자	행정7급 이두열	연락처	760-6185
추진상황	예산	6,500천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		50%	

□ 개요

- 위치 : 율목 커뮤니티 센터 내
- 사업기간 : 2025. 4월
- 내용 : 율목 커뮤니티센터 부지 내 태양광 자전거 공기주입기 설치

□ 추진상황

- 2025. 3월
 - 제안자의 의견 수렴 및 위치 선정
 - 물품 발주 및 제작

□ 향후계획

- 2025. 4월 : 태양광 자전거 공기주입기 설치

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	<p>사업 시행 후 사진 첨부 예정</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	아름다운 마을 만들기 초화 식재사업			제안자	박*길
부서명	율목동	담당자	행정7급 이두열	연락처	760-6185
추진상황	예산	5,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		20%	

□ 개요

- 위치 : 율목동 관내 쓰레기 무단 투기 취약 구역
- 사업기간 : 2025. 4월 / 9월
- 내용 : 율목동 관내 쓰레기 무단 투기 취약 구역에 봄·가을 계절 초화 식재

□ 추진상황

- 2025. 3월 : 주민참여예산 제안자의 의견 수렴 및 현장 확인(위치, 수량 파악)

□ 향후계획

- 2025. 4월 : 율목동 관내 쓰레기 무단 투기 취약 구역 봄 초화 식재
- 2025. 9월 : 가을 초화 식재

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	<p>사업 시행 후 사진 첨부 예정</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	주민자치센터 체력단련실 환경개선 공사		제안자	전*철
부서명	동인천동	담당자	행정 7급 이영은	연락처 760-6206
추진상황	예산	40,000천원	집행액	-
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
		○		20%

□ 개요

- 위치 : 참외전로 72번길 25(동인천동행정복지센터 3층)
- 사업기간 : 2025. 3월 ~ 5월
- 내용 : 체력단련실 리모델링을 통한 주민이용시설 환경 개선

□ 추진상황

- 2025. 3. 17. : 주민자치센터 체력단련실 환경개선 추진계획 수립
- 2025. 3. 25. : 주민자치센터 체력단련실 환경개선 공사 계약 체결

□ 향후계획

- 2025. 4월 : 환경개선공사 착공 및 준공
- 2025. 5월 : 체력단련실 재개관
- 2025. 6월 : 체력단련실 이용자 만족도 조사 실시

□ 관련사진

사업 시행 전



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	월미도 문화의 거리 만국기 게시대 설치(2차)		제안자	황*한
부서명	개항동	담당자	행정7급 서지연	연락처 760-6225
추진상황	예산	20,000천원	집행액	-
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
		○		20%

□ 개요

- 위치 : 월미문화로 36(문화의 거리 일원)
- 사업기간 : 2025. 3. ~ 5.
- 내용 : 월미도 문화의 거리 만국기 게시대 확장 설치 및 1차 설치된 만국기 게시대 보수

□ 추진상황

- 2025. 3. : 제안자 의견 청취 및 공사 업체 확인

□ 향후계획

- 2025. 4.
 - 월미도 문화의 거리 만국기 게시대 설치(2차) 사업 계획 수립 및 도로점용 관련 부서 협의
 - 공사 계약 및 착공
- 2025. 5. : 공사 준공

□ 관련사진

사업 시행 전



사업 시행 후

사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	어울터 출입구 및 지하층 입구 개선 공사		제안자	원*호
부서명	개항동	담당자	행정7급 서지연	연락처 760-6225
추진상황	예산	11,000천원	집행액	-
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
		○		20%

□ 개요

- 위치 : 개항동 어울터(참외전로37번길 5)
- 사업기간 : 2025. 3. ~ 5.
- 내용
 - 어울터 주출입구 자동문 교체
 - 지하층 입구 및 계단 벽 보수 공사


□ 추진상황

- 2025. 3. : 제안자 의견 청취 및 공사 업체 확인

□ 향후계획

- 2025. 4.
 - 어울터 출입구 및 지하층 입구 개선 공사 사업 계획 수립
 - 공사 계약 및 착공
- 2025. 5. : 공사 준공

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	우리 동네 마을 게시판 설치		제안자	황*욱
부서명	개항동	담당자	행정7급 서지연	연락처 760-6225
추진상황	예산	5,000천원	집행액	-
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율
		○		0%

□ 개요

- 위치 : 개항동 관내
- 사업기간 : 2025. 4. ~ 6.
- 내용 : 개항동 일원 게시판 설치

□ 추진상황

- 2025. 3. : 제안자 의견 청취 및 업체, 설치 위치 등 검토

□ 향후계획

- 2025. 4. : 우리 동네 마을 게시판 설치 사업 계획 수립 및 업체 선정
- 2025. 5. : 공사 계약 및 착공
- 2025. 6. : 공사 준공

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
사업 시행 후 사진 첨부 예정	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	개항동 벤치 설치			제안자	조*옥
부서명	개항동	담당자	행정7급 서지연	연락처	760-6225
추진상황	예산	4,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
	○			0%	

□ 개요

- 위치 : 개항동 관내
- 사업기간 : 2025. 4. ~ 6.
- 내용 : 개항동 일원 벤치 설치

□ 추진상황

- 2025. 3. : 제안자 의견 청취 및 업체, 설치 위치 등 검토

□ 향후계획

- 2025. 4. : 개항동 벤치 설치 사업 계획 수립, 업체 선정 및 도로점용 관련 부서 협의
- 2025. 5. : 공사 계약 및 착공
- 2025. 6. : 공사 준공

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
사업 시행 후 사진 첨부 예정	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	영종동 로컬푸드와 아.나.바.다 콜라보			제안자	조*주
부서명	영종동	담당자	행정 7급 노창균	연락처	760-8898
추진상황	예산	18,870천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		10%	

□ 개요

- 위치 : 미단시티 근린공원 내 광장
- 사업기간 : 2025. 1월 ~ 12월 중
- 내용
 - 도농 지역인 영종동의 특산물 판매를 통한 지역 농가 살리기
 - 주민들 간의 나눔 문화 확산 및 소통

□ 추진상황

- 「영종 주민의 날」 맞이 플리마켓 시행 예정 (주민참여예산 미사용)
- 洞 관내 학교, 유관기관 및 공동주택에 홍보 공문 전달 및 참여자 모집 중

□ 향후계획

- 「영종 주민의 날」 맞이 플리마켓 시행 이후 장단점 분석 후, 영종동 주민자치회 주최 플리마켓 시행 예정
- 영종동 특산물 수확 시기 미도래에 따라 여름 이후 추진 예정

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
사업 시행 후 사진 첨부 예정	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	영종동 꽃 모종 재배 및 나누기 계속 사업			제안자	신*산
부서명	영종동	담당자	행정 7급 노창균	연락처	760-8898
추진상황	예산	9,490천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		10%	

□ 개요

- 위치 : 운북동 170
- 사업기간 : 2025. 3월 ~ 12월
- 내용 : 비닐하우스에서 꽃 모종을 재배하여 주민들에게 나눠주고 금산IC 및 영종동 일원에 꽃을 심어 영종동 미관 개선

□ 추진상황

- 계절에 맞는 꽃모종 선정 논의 중

□ 향후계획

- 재배할 꽃모종 선정 후 주민자치위원들의 순번에 따라 지속적인 생육 예정

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
사업 시행 후 사진 첨부 예정	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	주민과 함께하는 플리마켓(아나바다)			제안자	한*희
부서명	영종1동	담당자	행정8급 이유리	연락처	760-6364
추진상황	예산	15,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		0%	

□ 개요

- 위치 : 미정
- 사업기간 : 2025. 9월 중(예정)
- 내용 : 알뜰시장 행사를 통해 지역주민간의 소통의 장을 마련

□ 향후계획

- 2025. 8월 限 : 계획 수립

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	영종1동 건강체조 프로그램			제안자	이*대
부서명	영종1동	담당자	행정8급 이유리	연락처	760-6364
추진상황	예산	13,200천원	집행액	1,258천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		9.5%	

□ 개요

- 위치 : 하늘체육공원 게이트볼장
- 사업기간 : 2025. 3~5월 / 9~11월(매주 목요일, 19:00~20:00)
- 내용 : 주민 연령을 고려한 건강체조 프로그램 운영

□ 추진상황

- 2025. 02. 21. : 상반기 계획 수립
- 2025. 02. 21. : 상반기 강사 모집 공고
- 2025. 03. 14. : 상반기 강사 면접 및 채용
- 2025. 03. 27. ~ 05. 29. : 상반기 운영 진행중

□ 향후계획

- 2025. 6월 限 : 상반기 운영 결과 보고
- 2025. 8월 限 : 하반기 계획 수립

□ 관련사진

건강체조 운영(상반기)



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	영종1동 주민토크콘서트			제안자	이*선
부서명	영종1동	담당자	행정8급 이유리	연락처	760-6364
추진상황	예산	10,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		0%	

□ 개요

- 위치 : 미정
- 사업기간 : 2025년 6월 / 10월(예정)
- 내용 : 영종1동 지역전문가와와의 토크콘서트를 통해 주민들이 갖는 문제해결, 정책반영 등 공동체 의식강화

□ 향후계획

- 2025. 4월 限 : 계획 수립

□ 관련사진

사업예정 장소(게이트볼장, 영종1동 행정복지센터 대회의실)



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	옹달샘공원 경관 조명 시설			제안자	영종2동 주민자치회 복지봉사분과
부서명	영종2동	담당자	행정 7급 김은주	연락처	760-6304
추진상황	예산	34,440천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		10%	

□ 개요

- 위치 : 중구 중산동 1903-9 옹달샘공원
- 사업기간 : 2025. 4월
- 내용 : 옹달샘공원 경관 조명 시설 추가 설치 (빅플라워 경관 조명 2식)

□ 추진상황

- 2025. 3월 : 경관 조명 설치 위치 등 검토

□ 향후계획

- 2025. 4월 限 : 빅플라워 경관 조명 설치

□ 관련사진

사업 시행 전



사업 시행 후 (조감도)



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	지역 상권의 활성화를 위한 깨끗한 거리 만들기 환경정화 캠페인			제안자	영종2동 주민자치회 기획교육분과
부서명	영종2동	담당자	행정 7급 김은주	연락처	760-6304
추진상황	예산	3,156천원	집행액	677천원	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		21.5%	

□ 개요

- 위치 : 중구 중산동 1947-4 구읍벤티 일원
- 사업기간 : 2025. 3월 ~ 11월 (분기별 1회 실시)
- 내용 : 주민 주도 무단투기 폐기물 수거 및 캠페인 등 환경정화 활동 추진

□ 추진상황

- 2025. 3. 14. : 환경정화 캠페인 실시 (1회차)

□ 향후계획

- 2025. 6월 : 환경정화 캠페인 실시 (2회차)
- 2025. 9월 : 환경정화 캠페인 실시 (3회차)
- 2025. 11월 : 환경정화 캠페인 실시 (4회차)

□ 관련사진

사업 시행 전



사업 시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	가족 건강 걷기 문화 축제			제안자	김*욱
부서명	운서동	담당자	행정 8급 안재두	연락처	760-6257
추진상황	예산	20,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		10%	

□ 개요

- 위치 : 운서동 세계평화의 숲(신도시북로 31-35)
- 사업기간 : 2025. 3월 ~ 6월
- 내용 : 가족 단위로 함께 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠 부스 운영을 포함한 세계평화의 숲 맨발걷기 축제

□ 추진상황

- 2025. 3월 : 행사 계획 수립을 위한 주민자치회 임원회의 및 현장 답사

□ 향후계획

- 2025. 4월 ~ 5월 : 행사 계획 수립
- 2025. 6월 : 행사 추진

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
사업 시행 후 사진 첨부 예정	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	주민 영화제			제안자	박*철
부서명	운서동	담당자	행정 8급 안재두	연락처	760-6257
추진상황	예산	20,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		10%	

□ 개요

- 위치 : 운서동 내 영화상영관
- 사업기간 : 2025. 3월 ~ 6월
- 내용 : 지역 주민이 참여할 수 있는 영화 상영 및 이벤트 추진

□ 추진상황

- 2025. 3월 : 행사 계획 수립을 위한 현장 답사

□ 향후계획

- 2025. 4월 ~ 5월 : 행사 계획 수립
- 2025. 6월 : 행사 추진

□ 관련사진

사업 시행 전	사업 시행 후
사업 시행 후 사진 첨부 예정	사업 시행 후 사진 첨부 예정

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	소무의도 쓰레기 집하장 설치			제안자	이*선
부서명	용유동	담당자	행정 8급 김민정	연락처	760-6287
추진상황	예산	20,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		20%	

□ 개요

- 위치 : 소무의도 입구 (소무의로 5)
- 사업기간 : 2025.02. ~ 2025. 07.
- 내용 : 쓰레기 집하장을 설치하여 소무의도를 청결하게 관리하고 아름다운 자연을 품을 깨끗한 관광지로서의 이미지를 심어주고자 함.


□ 추진상황

- 2025. 3. 업체 및 설치 위치 선정

□ 향후계획

- 2025. 4. 디자인 결정
- 2025. 5. 지반 공사 진행
- 2025. 6~7 쓰레기 집하장 설치

관련사진

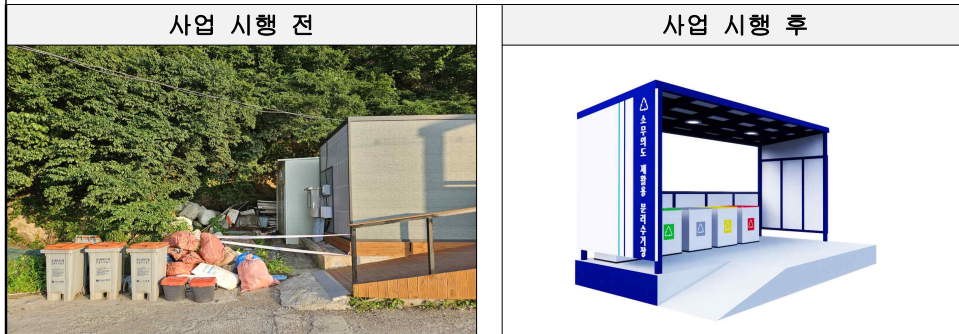

주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사업명	을왕리 해수욕장 포토존 교체			제안자	최*중
부서명	용유동	담당자	행정 8급 김민정	연락처	760-6287
추진상황	예산	15,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진 중	완료	추진율	
		○		20%	

□ 개요

- 위치 : 을왕리 해수욕장 (용유서로302번길 16-15)
- 사업기간 : 2025. 03. ~ 2025. 05.
- 내용 : 노후화된 을왕리 해수욕장 포토존을 교체하여 관광객들에게 안전하고 즐거운 추억을 제공하고, 을왕리 해수욕장의 이미지를 개선하고자 함.

□ 추진상황

- 2025. 3. 업체 및 표지판 설치 위치 선정

□ 향후계획

- 2025. 4. 문구 및 디자인 확정
- 2025. 5. (구) 포토존 철거 및 현 포토존 설치

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

(기준일 : 2025. 3. 31.)

사 업 명	남북 5,6통 마을 안내표지판 설치			제 안 자	손*
부 서 명	용유동	담당자	행정 8급 김민정	연 락 처	760-6287
추진상황	예 산	8,000천원	집 행 액	-	
	시기 미도래	추 진 중	완 료	추 진 율	
		○		20%	

□ 개 요

- 위 치 : 용유성당 앞 (남북동 579)
- 사업기간 : 2025. 3. ~ 5.
- 내 용 : 마을 안내표지판을 설치하여 주민들에게 마을간의 경계를 안내하고 지역사회의 접근성과 편리성을 높이고자 함.

□ 추진상황

- 2025. 3. 업체 및 표지판 설치 위치 선정

□ 향후계획

- 2025. 4. 디자인 확정
- 2025. 5. 안내 표지판 설치

□ 관련사진

