

2022년도 예산 반영, 주민참여예산 사업 현황

(2022. 5. 31. 기준, 단위 : 천원)

연번	사업부서 (사업위치)	사업명	사업비	집행액	추진상황		
					시기 미도래	추진중	추진 완료
	총 계	총 52건	2,503,600	487,085	4	32	16
1	문화관광과 (연안동)	연안부두 해양광장 관리동 외부 경관조명 등 노후 시설물 정비	123,000	58,028		○	
2	문화관광과 (용유동)	선녀바위 해수욕장 관광안내판 설치	10,000	8,430			○
3	문화관광과 (울목동)	월남촌 유래 홍보판 설치	15,000	0		○	
4	건설과 (신흥동)	서해대로463번길 일대 미끄럼방지 포장 공사	19,000	18,975			○
5	건설과 (신포동)	홍예문로 일원 통학로 밝은 거리 조성을 위한 LED조명 교체	21,000	20,987		○	
6	건설과 (신흥동)	신흥시장 상권 활성화를 위한 가로등 이미지 조명 설치	60,000	0		○	
7	건설과 (신포동)	송학로19번길 경사로 안전 시설물 설치	5,000	4,854			○
8	건설과 (신포동)	송학로 일대 보행자 안전 시설물 설치	6,000	5,335			○
9	건설과 (원도심)	답동로 일원 외 1개소 보도블럭 교체	40,000	-		○	
10	건설과 (동인천동)	개항로 일원 보도블럭 정비	70,000	-		○	
11	도시개발과 (원도심, 신흥동)	원도심 노후 쉼터 정비 사업	200,000	11,456		○	
12	도시개발과 (원도심)	가로수 생육 환경 정비 사업	50,000	19,030		○	
13	교통운수과 (원도심)	인천항 고가교 밑 횡단보도 투광기 설치	100,000	101,113			○
14	교통운수과 (개항동)	월미도 일원 과속방지턱 설치	20,000		○		
15	환경보호과 (중구)	주택단지 폐건전지 수거함 설치	26,000	25,849			○
16	환경보호과 (개항동)	월미도 내 쓰레기통 등 설치[청소년 참여예산]	7,500	6,517			○
17	기반시설과 (영종동)	소하천 환경개선사업	50,000	12,518		○	
18	기반시설과 (영종동)	운북동 1260번지 배수로 정비공사	500,000	20,722		○	

연번	사업부서 (사업위치)	사업명	사업비	집행액	추진상황		
					시기 미도래	추진중	추진 완료
19	기반시설과 (운서동)	백년건강길 조도개선 공사	30,000	28,993			○
20	기반시설과 (운서동)	은골로 일대 가로등 신설 공사	3,000	2,816			○
21	도시공원과 (영종국제도시)	백운산 등산가이드 제작	20,000	0		○	
22	도시공원과 (운서동)	두드림 소통광장 조성사업	500,000	0		○	
23	도시공원과 (운서동)	세계평화의 숲 산책로 야외운동기구 설치사업	13,000	0		○	
24	도시공원과 (영종국제도시)	인도주변 환경 개선을 통한 보행 친화거리 조성	15,000	14,929			○
25	도시공원과 (영종국제도시)	가족친화형 공원화장실 환경 개선사업	1,700	1,452			○
26	도시공원과 (용유동)	용유동 일대 저단형 현수막 게시대 설치	45,000	0		○	
27	교통과 (영종국제도시)	도로표지병 설치를 통한 차량 및 보행자 안전 확보 사업	90,000	0		○	
28	보건행정과 (중구)	취약계층 방문방역 지원 사업	100,000	25,839		○	
29	신포동	신포동 환경개선사업	15,000	3,525		○	
30	신포동	우리동네 공감교실	9,600	0	○		
31	신포동	신포동 행정복지센터 공유주방 리모델링	20,000	19,971			○
32	연안동	횡단보도 주변 보행자 휴게의자 설치	12,400	0		○	
33	연안동	쾌적한 통행로 조성을 위한 보도 제조	2,500	2,472		○	
34	신흥동	EM발효 공급기 설치	10,000	5,407		○	
35	신흥동	생활공구 무료대여 사업	5,000	4,160		○	
36	도원동	마을미관 개선을 위한 벽화 그리기	23,000	0		○	
37	율목동	2022년도 율목동 환경도색사업	20,000	0	○		
38	율목동	2022년도 율목동 쓰레기 무단투기 방지 화초 가꾸기	6,000	2,983		○	
39	율목동	2022년도 율목동 주민쉼터 만들기	9,000	0	○		

연번	사업부서 (사업위치)	사업명	사업비	집행액	추진상황		
					시기 미도래	추진중	추진 완료
40	율목동	코로나 19 대비 살균 소독수 무료 제공	5,000	3,675		○	
41	동인천동	동인천동 삼치거리 공영주차장 벽화그리기	20,000	0		○	
42	동인천동	우리동네 스마트 마을 게시판	18,000	0		○	
43	개항동	개항동 어울터 옥상 소통 공간 조성	30,000	0		○	
44	영종동	영종역 부근 금산교 벽화그리기	40,000	0		○	
45	영종1동	나눔부뚜막 미생물 발효 방식 음식물 처리기 설치	4,500	4,220			○
46	영종1동	텃밭 동아리 추진 사업	15,000	0		○	
47	영종1동	미세먼지 흡입매트 설치	7,200	6,912			○
48	영종1동	‘꽃과 마음을 피우는 시간’ 프로그램 운영	12,000	0		○	
49	운서동	동 행정복지센터 현수막 지정계시대 설치	7,000	6,790			○
50	운서동	‘운서동 문화가 있는 날’ 행사	17,600	327		○	
51	운서동	주민공동공간 환경개선 공사	14,600	0		○	
52	용유동	용유동 체력단련실 대수선 공사	40,000	38,800			○

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-157
------	----------


기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	연안부두 해양광장 관리동 외부 경관조명 등 노후 시설물 정비			제안자	김*심
부서명	문화관광과	담당자	행정8급 이 환	연락처	760-6456
추진상황	예산	123,000천원	집행액	58,028천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		80%	

□ 개 요

- 위 치 : 연안부두 해양광장 관리동 (연안부두로 36)
- 사업기간 : 2022. 4월 ~ 7월
- 사업내용
 - 연안부두 해양광장 관리동 경관조명 정비 및 LED 전광판 교체 등 전기공사
 - 연안부두 해양광장 관리동 내 기타 통신공사 및 노후 시설물 정비
- 추진상황
 - 2022. 01. 17. : 연안부두 해양광장 관리동 시설물정비공사 계획 수립
 - 2022. 05. 02. : 연안부두 해양광장 관리동 경관조명 공사(전기) 착공
 - 2022. 05. 27. : 연안부두 해양광장 관리동 경관조명 공사(전기) 일시정지
· 교체 필요한 LED전광판 발생(추후 물량 설정)
- 향후계획
 - 2022. 6월 : 설계변경 및 계약 체결
 - 2022. 6월 : 공사완료

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p>사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-119
------	----------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	선녀바위 해수욕장 관광안내판 설치	제안자	조*호
부서명	문화관광과 담당자	시설7급 전수현	연락처 760-6452
추진상황	예산	10,000천원	집행액 8,430천원
	시기 미도래	추진중	완 료 추진율
			○ 100%

□ 개 요

○ 위 치 : 선녀바위 해수욕장 일원



- 사업기간 : 2022. 02. 10. ~ 2022. 03. 07.
- 사업내용
 - 선녀바위 해수욕장 이정표 안내판 3ea 제작·설치
 - 선녀바위 해수욕장 설명 안내판 2ea 제작·설치
- 추진상황
 - 2021. 10. 12. : 2022년 주민참여예산 사업 선정결과 통보
 - 2022. 01. 27. : 제안자와 최종협의 후 내용 및 적정위치 확정
 - 2022. 02. 10. : 「선녀바위 해수욕장 관광안내판 제작설치」 계약
 - 2022. 03. 07. : 물품 납품확인 및 물품검수조서 송부(문화관광과→재무과)
- 향후계획
 - 관광안내판 분기별 점검 및 지속적 유지관리

□ 관련사진

사업시행 전



사업시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-59
------	---------


기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	월남촌 유래 홍보판			제안자	심*섭
부서명	문화관광과	담당자	행정7급 윤동권	연락처	760-6477
추진상황	예산	15,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		60%	

□ 개 요

- 위 치 : 도원서길 73-1 월남촌 사랑마을 사랑방 건너편
- 사업기간 : 2022. 4월 ~ 7월
- 사업내용
 - 월남촌 유래 발굴
 - 마을안내판 설치
- 추진상황
 - 2022. 4. 18. : 인천개항장연구소 방문 및 전문가 의견 청취
· 월남촌 홍보판 설명문안에 대한 자문 실시
 - 2022. 5. 04. : 홍보판 설치 현장 방문 및 제안자 의견 청취
· 후보 시안 및 설치 장소에 대한 의견 수렴 요청 등
- 향후계획
 - 2022. 6월 : 안내판 시안 선정 및 문구 검토 등
 - 2022. 7월 : 안내판 설치

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p>사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-88
------	---------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	서해대로 463번길 일대 미끄럼방지 포장공사	제안자	고*순	
부서명	건설과 담당자	시설9급 임우재	연락처 760-7454	
추진상황	예산	19,000천원	집행액	18,975천원
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율
			○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 서해대로 463번길 일원
- 사업기간 : 2022년 연중시행
- 사업내용
 - 서해대로 463번길 일대 미끄럼방지 포장공사

- 추진상황
 - 2022. 04 : 공사 발주를 위한 물량조사 시행
 - 2022. 05 : 해당구간 미끄럼방지포장재 구입 및 설치 완료

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-89,131
------	-------------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	홍예문로 일원 통학로 밝은 거리 조성을 위한 LED조명 교체			제안자	황*숙 외 1명
부서명	건설과	담당자	공업7급 전우승	연락처	760-7832
추진상황	예산	21,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

개요

- 위치 : 중구 홍예문로 일원
- 사업기간 : 2022. 5월 ~ 6월
- 사업내용
 - LED램프 58개 교체 (CDM 200W → LED 150W)
 - 가로등 커버 174개 교체
- 추진상황
 - 2022. 5월 10일 : 계약의뢰 (건설과 → 재무과)
 - 2022. 5월 16일 : 공사 착공
- 향후계획
 - 2022. 6월 12일 : 공사 준공

관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p>사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-86
------	---------



기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	신흥시장 상권 활성화를 위한 가로등 이미지 조명 설치			제안자	김*선
부서명	건설과	담당자	공업8급 배장현	연락처	760-7833
추진상황	예산	60,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		30%	

개요

- 위치 : 중구 선화동 42 일원
- 사업기간 : 2022. 3월 ~ 6월
- 사업내용
 - 로고조명(30W) 설치 45개
 - 암대 제작설치 14개소
 - 광고물 부착방지물 교체 30개소
 - 가로등주 베이스커버 교체 30개소
- 추진상황
 - 2022. 3월 : 제안자 협의 및 현장 확인
 - 2022. 4월 : 설계도서 작성
 - 2022. 5월 : 공사 착공
- 향후계획
 - 2022. 6월 : 공사 준공

관련사진

<p>사업시행 전</p> 	<p>사업시행 후</p> 
---	--

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-125
------	----------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	송학로 19번길 경사로 안전 시설물 설치			제안자	김*섭
부서명	건설과	담당자	시설9급 임우재	연락처	760-7454
추진상황	예산	5,000천원	집행액	4,854천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		20%	

□ 개 요

- 위 치 : 송학로19번길 일원
- 사업기간 : 2022년 연중시행
- 사업내용
 - 송학로 19번길 일대 경사로에 안전휀스 및 핸드레일을 설치

- 추진상황
 - 2022. 04 : 공사 발주를 위한 물량조사 시행
 - 2022. 05 : 해당구간 안전휀스 및 핸드레일 구입 및 설치 완료

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-127
------	----------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	송학로 일대 보행자 안전 시설물 설치			제안자	김*섭
부서명	건설과	담당자	시설9급 임우재	연락처	760-7454
추진상황	예산	6,000천원	집행액	5,335천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 송학로 일원(제이파크 ~ 위크엔드 라운지)
- 사업기간 : 2022년 연중시행
- 사업내용
 - 송학로 일대 보행자의 통행안전을 위한, 볼라드 및 흰스 등 설치를 통한 안전한 보행공간 확보

- 추진상황
 - 2022. 04 : 공사 발주를 위한 물량조사 시행
 - 2022. 05 : 해당구간 보행안전시설물(흰스 및 볼라드) 설치 완료

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2018-73
------	---------


기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	답동로 일원 외 1개소 보도블럭 교체			제안자	신*균
부서명	건설과	담당자	시설7급 박준형	연락처	760-7455
추진상황	예산	40,000천원	집행액	00천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		20%	

□ 개 요

- 위 치 : 답동로 31-1 ~ 우현로 50번길 2
- 사업기간 : 2022년 연중시행
- 사업내용
 - 기존설치 되어있는 보도블럭의 노후화 및 요철 등으로 인한 주민들의 보행불편 해결을 위한 보도정비공사
- 추진상황
 - 2022. 3 : 답동로 일원 외1개소 보도블럭 현황 점검 및 물량조사
 - 2022. 5 : 답동로 일원 외1개소 보도정비공사 설계완료
- 향후계획
 - 2022. 5 : 답동로 일원 외1개소 일원 보도정비공사 발주
 - 2022. 6~7 : 답동로 일원 외1개소 일원 보도정비공사 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p style="font-size: 2em; margin: 0;">-</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-127
------	----------


기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	개항로 일원 보도블럭 정비			제안자	김*근
부서명	건설과	담당자	시설8급 정예준	연락처	760-7453
추진상황	예산	70,000천원	집행액	00천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		30%	

□ 개요

- 위 치 : 개항로 일원
- 사업기간 : 2022년 연중시행
- 사업내용
 - 개항로(애관극장 ~ 예지요양병원) 구간 기존설치 되어있는 보도블럭의 노후화 및 요철 등으로 인한 주민들의 보행불편 해결을 위한 보도정비공사
- 추진상황
 - 2022. 2 : 개항로 일원 보도블럭 현황 점검 및 물량조사
 - 2022. 3 : 개항로 일원 보도정비공사 설계
 - 2022. 5. 11. : 개항로 일원 보도정비공사 착공 (계약금액 ; 64,166천원)
- 향후계획
 - 2022. 6. 17. : 개항로 일원 보도정비공사 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p>5월 11일 착공</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-178
------	----------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	원도심 노후쉼터 정비사업			제안자	강*순
부서명	도시개발과	담당자	녹지7급 김유리	연락처	760-7582
추진상황	예산	200,000천원	집행액	11,456천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		20%	

□ 개 요

- 위 치 : 신흥동3가 7-317, 신흥동3가 7-202, 도원동 47-6 3개소
- 사업기간 : 2022. 05. 26. ~ 2022. 07. 18.
- 사업내용
 - 갯골유수지쉼터 : 주목 등 364주 이식, 소나무 등 3,273주 식재, 파고라 2개소 및 평의자 6개소 교체, 시설물 보수, 노후 및 파손 시설물 철거 등
 - 신흥동쉼터 : 산딸나무 등 1,156주 식재, 야자매트 143.34m 포장, 조릿대 1,640주 제거, 파고라 1개소 철거 등
 - 도원동쉼터 : 왕벚나무 등 388주 식재, 파고라 1개소 및 등 의자 4개소 교체, 포장 정비 및 흰스 교체 등
- 추진상황
 - 2022. 02. 14. ~ 2022. 04. 14. : 실시설계용역 시행
 - 2022. 04. 20. ~ 2022. 04. 21. : 주민설명회 개최
 - 2022. 05. 26. : 사업 착공
- 향후계획
 - 2022. 07. 18. : 사업 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	사진

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-41,43
------	------------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	가로수 생육 환경 정비 사업			제안자	이*연
부서명	도시개발과	담당자	녹지8급 김여진	연락처	760-7583
추진상황	예산	50,000천원	집행액	19,030천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		38%	

□ 개 요

- 위 치 : 월미로, 연안부두로 33번길
- 사업기간 : 2022.5.12. ~ 2022.6.24.
- 사업내용
 - 가로수(왕벚나무) 뿌리 정비 및 보호판 제거, 교체 105주
 - 폐기물 상차, 운반, 처리 21.10ton
- 추진상황
 - 2022.04. : 현장조사 및 자체설계
 - 2022.5.16. 공사 착공
- 향후계획
 - 2022.6.24. 공사 준공

<p>사업시행 전</p> 	<p>사업시행 후</p> <p>사진</p>
---	-------------------------

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-94
------	---------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	인천항 고가교 및 횡단보도 투광기 설치		제안자	김*웅
부서명	교통운수과	담당자	시설 9급 강희엽	연락처
				760-7682
추진상황	예산	100,000천원	집행액	101,113천원
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율
			○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 서해대로 외 3개소
- 사업기간 : 2022. 3월 ~ 2022. 6월
- 사업내용
 - 투 광 기 : 42EA 설치
- 추진상황
 - 2022. 01. 05. : 횡단보도 투광기 설치공사 실시설계 용역
 - 2022. 03. 07. : 실시설계 용역 준공
 - 2022. 03. 15. : 2022년 횡단보도 투광기 설치 공사 계약의뢰(→재무과)
 - 2022. 05. 26. : 공사 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-71
------	---------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	월미도 일원 과속방지턱 설치			제안자	전*석
부서명	교통운수과	담당자	시설 9급 강희엽	연락처	760-7682
추진상황	예산	20,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
	○			0%	

개요

- 위 치 : 월미도 부근
- 사업기간 : 2022. 7월 ~ 2022. 8월
- 사업내용
 - 과속방지턱 : 10EA 설치
- 향후계획
 - 2022. 07월 : 공사 착공
 - 2022. 08월 : 공사 준공

관련사진

사업시행 전	사업시행 후
공사 착공 전	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-44
------	---------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	주택단지 폐건전지 수거함 설치		제안자	박*경
부서명	환경보호과	담당자	환경7급 임 슬	연락처
				760-7218
추진상황	예산	26,000천원	집행액	25,849천원
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율
			○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 중구 내 주택단지
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 주택지역에 폐건전지함이 포함된 재활용분리수거대 설치 (신청자에 한함)
- 추진상황
 - 2022. 2월 : 재활용분리수거대 구매

구분	지출내역	지출금액
재활용분리수거대	259,700원*99대	25,710,300원
조달수수료	0.54%	138,840원
합계		25,849,140원

- 2022.2월 ~ 3월 : 재활용분리수거대 배부 (73개)
- 2022.4월 ~ 5월 : 재활용분리수거대 배부 (26개)

- 향후계획
 - 주택지역에 폐건전지함 수거 홍보

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-115
------	----------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	월미도 내 쓰레기통 등 설치			제안자	최*연 외 3명
부서명	환경보호과	담당자	행정8급 안대원	연락처	760-7414
추진상황	예산	7,500천원	집행액	6,517천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	



□ 개 요

- 위 치 : 월미도 문화의 거리 일대
- 사업기간 : 2022. 3월 ~ 4월
- 사업내용
 - 재활용 분리 가능한 쓰레기통 8개 신규 설치
- 추진상황
 - 2022. 3월 : 계약 체결
 - 2022. 4월 : 설치 완료
- 향후계획
 - 쓰레기통 유지 관리 (세척, 수시 수거 등)
 - 기동반을 통한 상시 순찰 및 무단투기 단속 활동 강화


□ 관련사진



사업시행 전

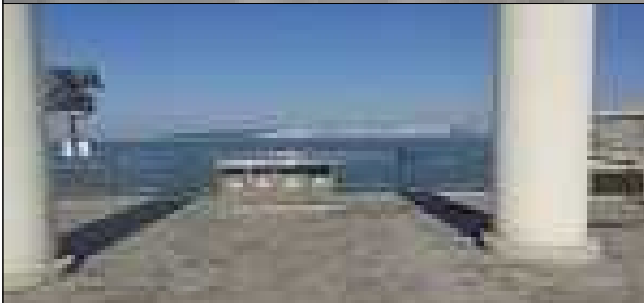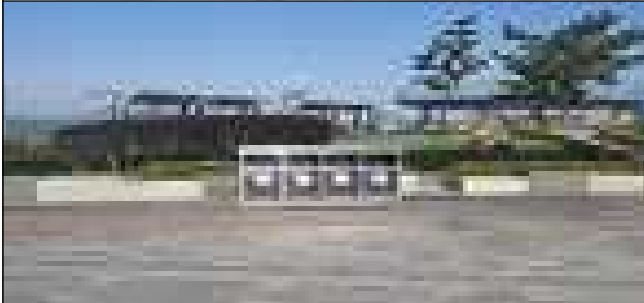

사업시행 후

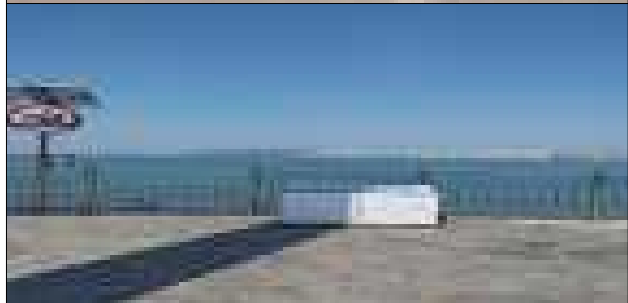

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2021-32, 167


기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	소하천 환경개선 사업			제안자	김*신외 1
부서명	기반시설과	담당자	시설7급 홍계표	연락처	760-7727
추진상황	예산	50,000천원	집행액	12,518천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		25%	

□ 개 요

- 위 치 : 소하천(전소천·동강천)
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 소하천 수목·잡목 제거
 - 소하천 하상 정비, 환경정비 등
- 추진상황
 - 2021. 6월 : 주민참여예산(4차) 제안사업 검토 및 의견수렴
 - 2021. 7월 : 주민참여예산(10차) 제안사업 검토 및 의견수렴
 - 2021. 10월 : 주민참여예산 2022년도 사업예산요구서 제출
 - 2022. 5월 : 소하천(동강천, 전소천) 일원 수목제거 공사 완료
- 향후계획
 - 2022. 6월 ~ 12월 : 약취저감 탈취제 구입, 수풀제거 등

□ 관련사진

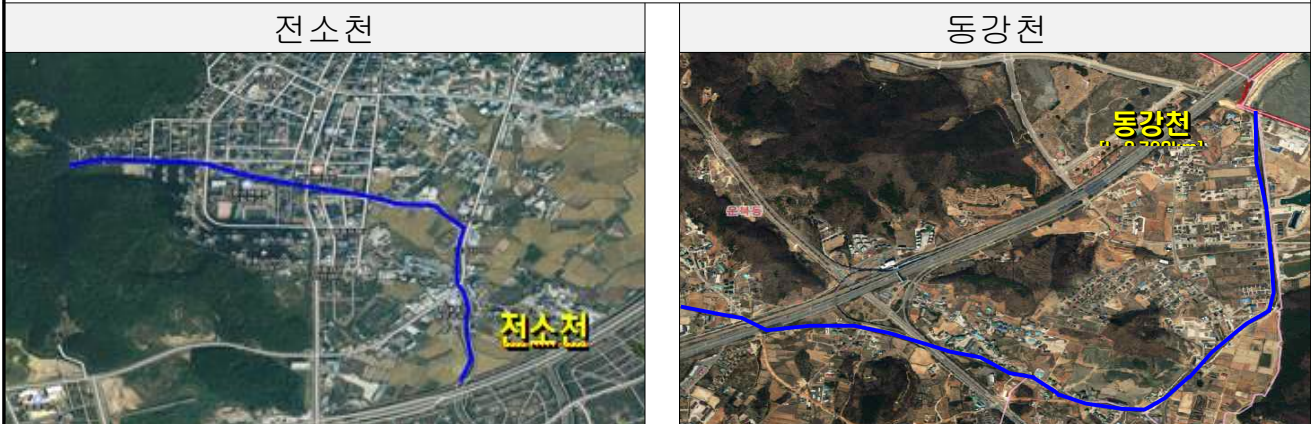

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 | 2020-17, 2021-168

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	운북동 1260번지 배수로 정비공사		제안자	김*신외 1
부서명	기반시설과	담당자	시설7급 홍계표	연락처
				760-7727
추진상황	예산	500,000천원	집행액	20,722천원
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율
		○		10%

□ 개 요

- 위 치 : 운북동 1260번지(소유자 : 국토교통부, 이용현황 : 구거)
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 10월
- 사업내용 : 콘크리트 수로 설치(L=382m, B=10m)
- 추진상황
 - 2021. 7월 : 주민참여예산(10차) 제안
 - 2021. 10월 : 2022년도 주민참여예산 심의(확정)
 - 2021. 11월 : 2022년도 본예산 사업 예산 확보
 - 2022. 1. 19. : 기본 및 실시설계 착수
 - 2022. 2월 : 기본설계 관련 주민의견 청취
 - 2022. 3. 21. : 기본 및 실시설계 준공
 - 2022. 5. 30. : 정비공사 시행계획 수립
 - 2022. 5. 31. : 일상감사 및 계약심사 의뢰
- 향후계획
 - 2022. 6월 ~ 10월 : 공사 착공 및 준공

□ 관련사진

위치도



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-17
------	---------


기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	백년건강길 조도개선 공사			제안자	박*태
부서명	기반시설과	담당자	공업9급 김승일	연락처	760-8959
추진상황	예산	30,000천원	집행액	28,993천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 운서동 백년건강길 일원
- 사업기간 : 2022. 3월 ~ 5월
- 사업내용 : 공원등 설치 10개소
- 추진상황
 - 2022. 3월 : 현장조사 및 설계
 - 2022. 4. 22 : 공사 착공
 - 2022. 5. 19 : 공사 준공

□ 관련사진

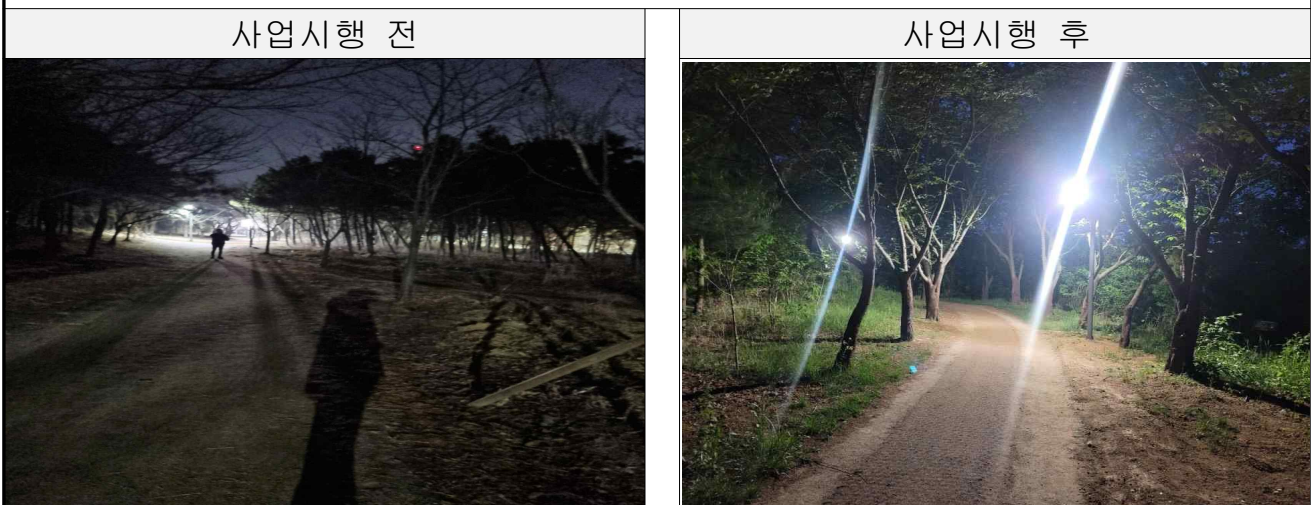

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-14
------	---------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	은골로 일대 가로등 신설 공사			제안자	최*열
부서명	기반시설과	담당자	공업9급 김승일	연락처	760-8959
추진상황	예산	3,000천원	집행액	2,816천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 운서동 2702-8~2703-5 일원
- 사업기간 : 2022년 3월
- 사업내용 : 가로등 신설 1본
- 추진상황
 - 2022. 3월 : 설치 완료

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-113
------	----------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	백운산 등산가이드 제작			제안자	전 * 철
부서명	도시공원과	담당자	녹지8급 강원	연락처	760-7774
추진상황	예산	20,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

개요

- 위 치 : 백운산 등산로 일원
- 사업기간 : 2022. 5월 ~ 2022. 6월
- 사업내용
 - 백운산 등산로 및 스토리와 식생 등을 소개하는 가이드 제작
- 추진상황
 - 백운산 숲길 실태조사 및 등산지도 콘텐츠 제작 용역 시행
- 향후계획
 - 2022. 6월 : 백운산 등산가이드 제작 완료

관련사진

사업시행 전	사업시행 후
사진	사진

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-150
------	----------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	두드림 소통광장 조성사업			제안자	오 * 현
부서명	도시공원과	담당자	녹지7급 박석준	연락처	760-7777
추진상황	예산	500,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		5%	

□ 개 요

- 위 치 : 두드림생태학습관 인근 (운서동 2746-4)
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2022. 10월
- 사업내용
 - 공원조성계획 변경 1식, 실시설계용역 1식
 - 실외정원, 소통공간(휴게시설 및 야외카페) 등 공원 리모델링
- 추진상황
 - 2022. 1. 12. : 실시설계용역 착수
 - 2022. 2. 28. : 실시설계용역 정지
 - *공원조성계획 변경 등 행정절차 이행을 위한 용역 정지
- 향후계획
 - 2022. 6월 : 실시설계용역 준공
 - 2022. 7월 : 공사 착공
 - 2022. 10월 : 공사 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p>사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-90
------	---------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	세계평화의숲 산책로 야외운동기구 설치			제안자	황 *
부서명	도시공원과	담당자	시설9급 오인호	연락처	760-7787
추진상황	예산	13,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		50%	

개요

- 위치 : 완충녹지 2호(롯데마트 인근)
- 사업기간 : 2022. 6월
- 사업내용
 - 야외운동기구 5점 설치
 - 부지정리 및 야자매트 설치
- 추진상황
 - 2022. 5월 : 사업대상지 조사완료
야외운동기구 및 야자매트 구입의뢰
- 향후계획
 - 2022. 6월 : 야외운동기구 및 야자매트 설치 완료

관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p>사업 추진 중</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-175
------	----------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	인도주변 환경 개선을 통한 보행 친화거리 조성			제안자	배 * 희
부서명	도시공원과	담당자	행정6급 이기옥	연락처	760-7781
추진상황	예산	15,000천원	집행액	14,929천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 운서동 1427-45 생태통로
- 사업기간 : 2022. 2 ~ 3월
- 사 업 비 : 15,000천원 (區 100%)
- 사업내용 : 보행구간 벽화 도색작업 실시 및 경관 간접조명 설치 (156㎡)
- 추진상황
 - 2021. 2. 16 : 계약의뢰
 - 2021. 3. 2 : 착공
 - 2021. 3. 7 : 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2021-93

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	가족친화형 공원화장실 환경 개선사업			제안자	안 * 선
부서명	도시공원과	담당자	녹지9급 신정화	연락처	760-7779
추진상황	예산	1,700천원	집행액	1,452천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 영종국제도시 공원화장실 23개소
- 사업기간 : 2022. 2월
- 사업내용

- 영종국제도시 공원화장실 23개소에 유아용 변기커버 설치

연번	공원명	주소	설치개소	연번	공원명	주소	설치개소
1	영마루공원(1)	운서동 2709-1	남/녀 각 1	13	운남근린공원	운남동 1552	남/녀 각 1
2	영마루공원(2)	운서동 2709-1	남/녀 각 1	14	하늘체육공원	중산동 1878-3	남/녀 각 1
3	젓개농장공원	운서동 3020-1	남/녀 각 1	15	하늘도시 6호 공원 화장실	운남동 1598-6	남/녀 각 1
4	유수지공원 주차장	운서동 2747-1	남/녀 각 1	16	하늘도시 8호 공원 화장실	운남동 1604-3	여 1
5	생태학습관	운서동 2746-4	남/녀 각 1	17	하늘도시 11호 공원 화장실	운남동 1654-3	여 1
6	미단시티 2호 근린공원	운북동 1280-3	남/녀 각 1	18	하늘도시 14호 공원 화장실	중산동 1926-55	여 1
7	미단시티 4호 근린공원	운북동 1273	남/녀/가족 각 1	19	하늘도시 15호 공원 화장실(1)	중산동 1960-6	여 1
8	미단시티 8호 근린공원	운북동 1265-5	남/녀 각 1	20	하늘도시 15호 공원 화장실(2)	중산동 1963-1	여 1
9	미단시티 10호 근린공원	운북동 1352-8	남/녀 각 1	21	하늘도시 21호 공원 화장실	중산동 1935-13	여 1
10	미단시티 11호 근린공원	운남동 1353-11	남/녀 각 1	22	하늘도시 22호 화장실(사무실)	중산동 1938-3	2남/녀 각 1
11	미단시티 12호 근린공원	운북동 1366-7	남/녀 각 1	23	하늘도시 5호 일반광장	운남동 1794	여 1
12	미단시티 13호 근린공원	운북동 1353-2	남/녀 각 1				

○ 추진상황

- 2022. 03월 : 사업추진 완료

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-83
------	---------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	용유동 일대 저단형 현수막 게시대 설치			제안자	강 * 규
부서명	도시공원과	담당자	행정6급 이기옥	연락처	760-7781
추진상황	예산	45,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		60%	

□ 개 요

- 위 치 : 남북동 493-2 외 5개소
- 사업기간 : 2022. 4월 ~ 6월
- 사 업 비 : 45,000천원(주민참여예산)
- 사업규모 : 6개소 (접철식 3개소, 2단형 3개소)
- 추진상황
 - 2022. 4월 : 설치 대상지 확정
 - 2022. 5월 : 도로점용 허가
일상감사, 계약심사 및 계약의뢰
- 향후계획
 - 2022. 6월 : 공사착공 및 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-177
------	----------


기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	도로표지병 설치를 통한 차량 및 보행자 안전 확보 사업	제안자	이*준
부서명	교통과	담당자	시설9급 이대한
		연락처	760-7798
추진상황	예산	90,000천원	집행액
	0천원		
	시기 미도래	추진중	완 료
		○	0%

□ 개 요

- 위 치 : 영종하늘도시
- 사업기간 : 2022. 3. ~ 6.
- 사업내용
 - 교통사고 예방을 위한 교통안전시설(도로 표지병) 설치
 - 영종국제도시 하늘도시 주변 도로 중 어린이보호구역 및 하늘도시 공동주택 밀집지역, 교통사고 다발구간 선정
 - 영종국제도시 하늘도시 주변 도로
- 추진상황
 - 2021. 10. 12. : 주민참여예산 사업 선정
 - 2022. 3. 2. : 주민참여예산 사업 관련 회의(위치 및 규모 등)
 - 2022. 3. 2. : 설치대상지 적정여부 검토 의뢰(區 → 중부경찰서)
 - 2022. 3. 8. : 설치대상지 적정여부 검토의견 회신(중부경찰서 → 區)
 - 2022. 3. 11. : 영종 하늘도시 교통안전시설물 설치 계획 수립 및 일상감사 요청
 - 2022. 3. 15. : 물품 구입 의뢰
- 향후계획
 - 2022. 6. 7. ~ 10 . : 물품 설치 완료 예정

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p>사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-176
------	----------


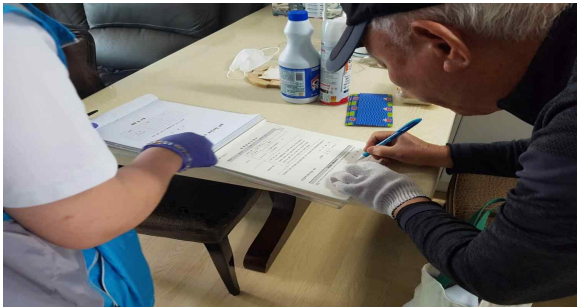
기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	취약계층 방문방역 지원 사업			제안자	허*봉
부서명	보건행정과	담당자	의료기술6급 김상덕	연락처	760-6071
추진상황	예산	100,000천원	집행액	25,839원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		38%	

□ 개 요

- 위 치 : 인천광역시 중구 보건행정과
- 사업기간 : 2022. 3. 2 ~ 12. 31
- 사업내용
 - 대상
 - 목표 : 1000건
 - 300세대 미만의 공동주택과 단독주택 거주
 - 기초수급자세대 또는 차상위 계층, 국가유공자 세대,
 - 장애의 정도가 심한 장애인, 65세 이상 홀로 사는 노인세대 중 신청자
 - 내용
 - 대상 세대 방문 실내 · 외 방역소독 실시
 - 살균, 살충, 유충구제, 바퀴구제, 개미구제
 - 방역약품 지원 등
- 추진상황
 - 2022. 3월~ 5월 실적 : 380건
- 향후계획
 - 취약계층 방문방역 사업에 대한 주기적 홍보
 - 거동불편 취약계층 방문 방역 중점 실시 추진
 - 관내 쪽방촌 방역 실시
 - 지역아동센터, 아동복지시설 지속적 방문방역 실시

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-1(동)
------	-----------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	신포동 환경개선사업			제안자	김 * 섭
부서명	신포동	담당자	행정8급 이지민	연락처	760-6106
추진상황	예산	15,000천원	집행액	3,525천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		40%	

□ 개 요

○ 위 치

- 신포사거리~신포동~답동사거리
- 답동사거리~신포역
- 신포로35번길 일원

○ 사업기간 : 2022. 3월 ~ 10월

○ 사업내용

- 신포사거리 일원 난간걸이화분 위치 이동을 통한 관리 용이
- 신포역 부근 가로등 꽃걸이 화분 및 난간걸이화분에 계절 초화 식재
- 신포로35번길 감나무길 관리


○ 추진상황

- 2022. 3월 : 봄 초화 종류 선별
- 2022. 3. 31. : 초화 식재 종류 확정
- 2022. 4. 28. : 봄 초화 및 상토 조달 및 식재

○ 향후계획

- 2022. 5~8월 : 수시 관수작업
- 2022. 9월 : 가을 초화 조달 및 식재

□ 관련사진

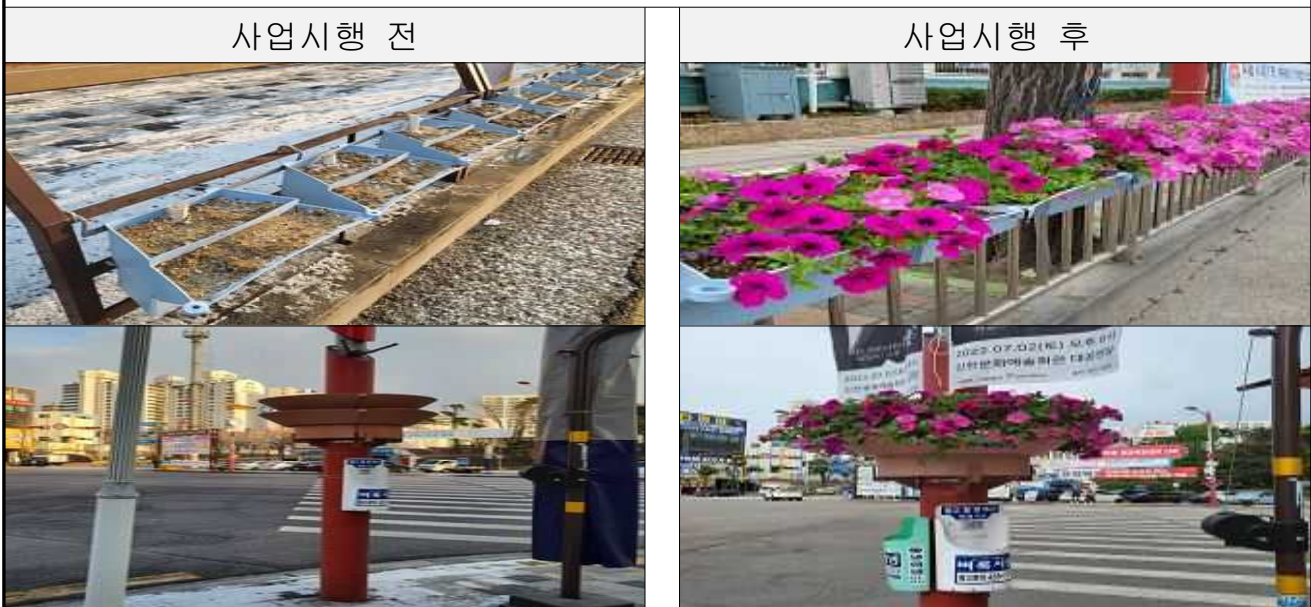

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-2(동)
------	-----------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	우리동네 공감교실			제안자	김 * 희
부서명	신포동	담당자	행정8급 이지민	연락처	760-6106
추진상황	예산	9,600천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
	○			0%	

개 요

- 위 치 :
- 사업기간 : 2022. 7월 ~ 12월 (※코로나19 사회적 거리두기에 따라 유동적 시행)
- 사업내용
 - 주민자치센터 프로그램 외 주민 대상 강의 개최
- 향후계획
 - 2022. 6월 : 강의 주제 선정

관련사진

사업시행 전	사업시행 후

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-3(동)
------	-----------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	신포동 행정복지센터 공유주방 리모델링			제안자	윤 * 정
부서명	신포동	담당자	행정8급 이지민	연락처	760-6106
추진상황	예산	20,000천원	집행액	19,971천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 인천광역시 중구 제물량로 168, 2층
- 사업기간 : 2022. 4월 ~ 5월
- 사업내용
 - 바닥 방수 시공 및 타일 교체
 - 샌드위치 판넬 철거 및 폴딩도어 · 배수구 설치
 - 아일랜드식탁(쿡탑포함) 및 상부장 설치
- 추진상황
 - 2022. 3월 : 공사 세부 견적 확인 및 업체 비교
 - 2022. 4. 12. : 공사 계약 체결 및 착공
 - 2022. 5. 4. : 공사 준공
- 향후계획
 - 2022. 5월 ~ : 공유주방 운영재개 및 지역주민행사 추진

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-4(동)
------	-----------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	횡단보도 주변 보행자 휴게의자 설치			제안자	김*영
부서명	연안동	담당자	행정7급 이선희	연락처	760-6124
추진상황	예산	12,400천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

개요

- 위치 : 연안동 관내 횡단보도 주변 28개소



- 사업기간 : 2022년 4월 ~ 6월
- 사업내용
 - 연안동 관내 횡단보도 주변 옥외용 벤치 설치
- 추진상황
 - 2022. 4월 : 사업 대상지 선정 완료(관내 횡단보도 주변 36개소)
 - 2022. 5월 : 유관부서(건설과, 교통운수과, 중부경찰서) 협의
 - 2022. 5월 : 도로점용 신청 승인(관내 횡단보도 주변 28개소)
 - 2022. 5월 말 : 계약 시행
- 향후계획
 - 2022. 6월 초 : 공사 착공
 - 2022. 6월 말 : 공사 준공

관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p>사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-6(동)
------	-----------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	EM발효 공급기 설치			제안자	함 * 경
부서명	신흥동	담당자	행정7급 민채원	연락처	760-6147
추진상황	예산	10,000천원	집행액	00천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		100%	

□ 개 요

- 위 치 : 신흥동 행정복지센터 청사 앞
- 사업기간 : 2022. 4월~12월
- 사업내용
 - EM 발효공급기를 설치하여 관내 주민들에게 무료 공급
- 추진사항
 - 2022. 4월 : EM 발효 공급기 구입(5,000천원)
 - 2022. 5월 : 홍보물 제작(407천원)
- 향후계획
 - 2022. 4월 ~ 10월 : 사업 시행

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-7(동)
------	-----------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	생활공구 무료 대여사업			제안자	추 * 구
부서명	신흥동	담당자	행정7급 민채원	연락처	760-6147
추진상황	예산	5,000천원	집행액	00천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

□ 개 요

- 위 치 : 신흥동 주민자치센터 1층(도원로4)
- 사업기간 : 2022. 6월~12월
- 사업내용
 - 신흥동 행정복지센터 유휴공간에 공구대여소를 설치 및 공구 비치
 - 관내 주민들을 대상으로 공구대여소 운영
- 추진사항
 - 2022. 5월 : 생활공구 구입(3,680천원)
 - 펜치 외 44종
 - 2022. 5월 : 수납장 구입 (480천원)
- 향후계획
 - 2022. 6월 : 주민대상 공구대여소 이용안내 및 홍보물 제작, 홍보
 - 2022. 6월 ~ 12월 : 사업 시행

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-8(동)
------	-----------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	마을미관 개선을 위한 벽화 그리기			제안자	김 * 희외1
부서명	도원동	담당자	행정7급 염혜란	연락처	760-6164
추진상황	예산	23천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		-	

개 요

- 위 치 : 참외전로244번길 42-1 외 5개소
- 사업기간 : 2022. 4월 ~ 6월
- 사업내용 : 관내 노후된 담장·벽면 도색 및 벽화그리기
- 추진상황
 - 2022. 4월 : 입주민 동의서 징구 및 관련부서 협의 완료
 - 2022. 5월 : 계약 및 착공
- 향후계획
 - 2022. 5월 : 준공

관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	사진

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-9(동)
------	-----------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	2022년도 율목동 환경도색사업			제안자	박*길
부서명	율목동	담당자	행정7급 김희준	연락처	760-6185
추진상황	예산	20,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
	○			0%	

□ 개 요

- 위 치 : 율목동
- 사업기간 : 2022. 4월 ~ 6월
- 사업내용
 - 율목동 관내 노후한 담벼락 및 파손된 벽화 도색
 - 율목동 한전개폐기 도색
 - 율목동 쓰레기 무단투기 지역 도색
- 향후계획
 - 2022. 4월 ~ 5월 : 대상 현장조사 및 확인
 - 2022. 6월 限 : 율목동 환경도색사업 착공 및 준공

사업시행 전	사업시행 후
사진 <전, 후 사진을 가능한 같은 장소에서 촬영할 것>	사진

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-10(동)
------	------------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	울목동 쓰레기 무단투기 방지 화초 가꾸기			제안자	장*숙
부서명	울목동	담당자	행정7급 김희준	연락처	760-6185
추진상황	예산	6,000천원	집행액	2,983천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		50%	

□ 개 요

- 위 치 : 울목동 관내
- 사업기간 : 2022. 4월 ~ 6월
- 사업내용
 - 쓰레기 무단투기가 심한 도로 및 공동주택입구 화분배치
 - 인근 주민을 화분관리자로 지정하여 물주기 등 실시
 - 쓰레기 배출 및 무단투기 금지 안내문 부착
- 추진상황
 - 2022. 3월 : 울목동 관내 공동주택 대상지 조사 및 확정
 - 2022. 4월 : 울목동 쓰레기 무단투기 방지 화초 배치 완료(1차)
- 향후계획
 - 2022. 6월 : 울목동 쓰레기 무단투기 방지 화초 배치 완료(2차)

사업시행사진



사업시행사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-11(동)
------	------------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	2022년도 율목동 주민센터 만들기			제안자	공*환
부서명	율목동	담당자	행정7급 김희준	연락처	760-6185
추진상황	예산	9,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
	○			0%	

□ 개 요

- 위 치 : 율목동 관내 시·구유지 공터 6개소
- 사업기간 : 2022년 4월 ~ 6월
- 사업내용
 - 율목동 시·구유지 공터에 의자 및 화단을 설치하여 주민들의 휴게공간으로 조성
 - 장소에 맞는 화단 및 벤치를 소규모로 설치
- 향후계획
 - 2022. 6월 限 : 율목동 주민센터(화단 및 벤치) 조성완료

사업시행 전	사업시행 후
사진 <전, 후 사진을 가능한 같은 장소에서 촬영할 것>	사진

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-12(동)
------	------------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	코로나 19 대비 살균 소독수 무료 제공			제안자	이*훈
부서명	율목동	담당자	행정7급 김희준	연락처	760-6185
추진상황	예산	5,000천원	집행액	3,675천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		74%	

□ 개 요

- 위 치 : 율목동 행정복지센터
- 사업기간 : 2022년 연중
- 사업내용
 - 율목동 행정복지센터에 설치된 소독수 생성장치를 활용하여 소독수 생성 재료 및 홍보물(분무통)을 구입하여무료배부
- 추진상황
 - 2022. 2. 24. : 분무통 800개 구입 및 살균소독수 무료 배부
 - 2022. 5. 31. : 분무통 950개 구입 및 살균소독수 무료 배부
- 향후계획
 - 2022년 연중 : 코로나19 대비 살균소독수 무료 배부

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-13(동)
------	------------


기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	동인천동 삼치거리 공영주차장 벽화그리기			제안자	김*근
부서명	동인천동	담당자	행정7급 전하영	연락처	760-6205
추진상황	예산	20,000천원	집행액	00천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

□ 개 요

- 위 치 : 중구 자유공원로 19-1 삼치거리 공영주차장 내(내동 6-2)
- 사업기간 : 2022. 4월 ~ 8월
- 사업내용
 - 동인천동 삼치거리 공영주차장 안쪽 담장 벽화 그리기
- 추진상황
 - 2022. 4. 28. : 제1차 주민참여예산 동 지역위원회 회의 → 벽화 테마 논의
- 향후계획
 - 2022. 6월
 - 제3차 주민참여예산 동 지역위원회 회의 개최 예정 : 벽화 시안 선정
 - 관련기관 협조 요청
 - 2022. 7월 : 계약 시행 및 착공
 - 2022. 8월 : 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p>사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-14(동)
------	------------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	우리동네 스마트 마을게시판			제안자	윤*수
부서명	동인천동	담당자	행정7급 전하영	연락처	760-6205
추진상황	예산	18,000천원	집행액	00천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

□ 개 요

- 위 치 : 동인천동 관내
- 사업기간 : 2022. 4월 ~ 6월
- 사업내용
 - 동인천동 관내 마을소식을 알리는 게시판을 설치
 - 동인천동 행정복지센터 앞, 전동·용동·경동 공영주차장 앞(4개소 예정)
- 추진상황
 - 2022. 4. 28. : 제1차 주민참여예산 동 지역위원회 회의 → 게시판 설치 위치 논의
 - 2022. 5. 9. ~ 10. : 제2차 주민참여예산 동 지역위원회 서면회의 → 게시판 설치 위치 확정
 - 2022. 5. 12. ~ 20. : 관련부서 및 기관 협조 공문 요청
- 향후계획
 - 2022. 6월 : 계약 시행 및 착공·준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p>사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-15(동)
------	------------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	개항동 어울터 옥상 소통 공간 조성			제안자	최 * 영
부서명	개항동	담당자	행정7급 박미숙	연락처	760-6224
추진상황	예산	30,000천원	집행액	00천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		5%	

□ 개 요

- 위 치 : 참외전로37번길5 (개항동어울터 옥상)
- 사업기간 : 2022년 6월 ~ 7월
- 사업내용
 - 가설건축물 철거, 방수공사, 식재 및 시설물 설치
- 추진상황
 - 공사계획 수립
- 향후계획
 - 2022년 6월 공사계약 및 착공
 - 2022년 7월 공사시행

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p>사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-16(동)
------	------------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	영종역 부근 금산교 벽화그리기			제안자	이 * 국
부서명	영종동	담당자	행정8급 오진경	연락처	760-8898
추진상황	예산	40,000천원	집행액		
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

□ 개 요

- 위 치 : 영종역 부근 금산IC 램프교 교량의 6개 교각
- 사업기간 : 2022년 4월~6월
- 사업내용
 - 영종동 지역 특색이 반영된 그림
 - 1차 전문가를 통한 스케치 작업 후, 2차 지역주민 및 전문가의 참여로 완성
- 추진상황
 - 2021년 10월 : 인천광역시종합건설본부로부터 교각사용 승인
 - 2022년 3월 : 현장 재답사 및 전문업체와의 사전미팅 실시
 - 2022년 4월 : 안전점검 및 안전진단 실시
- 향후계획
 - 2022년 5월 : 벽화 시안 확정
 - 2022년 6월 : 벽화 스케치 및 도색

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-17(동)
------	------------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	나눔부뚜막 미생물 발효 방식 음식물 처리기 설치			제안자	한 * 구
부서명	영종1동	담당자	행정8급 이동환	연락처	760-6364
추진상황	예산	4,500천원	집행액	4,220천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 영종1동 행정복지센터 지하1층 나눔부뚜막
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2022. 12월
- 사업내용
 - 동 행정복지센터 내에 미생물 발효 방식 음식물 처리기 구입 및 설치
- 추진상황
 - 2022. 3. 22. : 미생물 발효 방식 음식물 처리기 구매 계약(금4,220,140원)
 - 2022. 3. 29. : 미생물 발효 방식 음식물 처리기 설치
 - 2022. 3. 30. : 집행 완료
 - 2022. 4월 : 미생물 발효 방식 음식물 처리기 시운전
- 향후 계획
 - 2022. 4월 ~ : 미생물 발효 방식 음식물 처리기 유지보수 시행

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-18(동)
------	------------



기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	텃밭 동아리 추진 사업			제안자	석 * 아
부서명	영종1동	담당자	행정8급 이동환	연락처	760-6364
추진상황	예산	15,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		10%	

개요

- 위 치 : 영종1동 행정복지센터 5층 옥상
- 사업기간 : 2022. 4월 ~ 2022. 12월
- 사업내용
 - 동 행정복지센터 옥상에 텃밭 기반(화분, 흙 등) 조성
 - 텃밭동아리 모집, 원예강의, 텃밭가꾸기
- 추진상황
 - 2022. 5월 : 세부 추진계획 수립
- 향후계획
 - 2022. 6월 중 : 원예강사 및 텃밭동아리 모집
 - 2022. 6월 ~ 12월 : 원예강의 및 텃밭가꾸기 실행

관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2021-19(동)


기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	미세먼지 흡입매트 설치			제안자	이 * 만
부서명	영종1동	담당자	행정8급 이동환	연락처	760-6364
추진상황	예산	7,200천원	집행액	6,912천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 영종1동 행정복지센터 입구
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2022. 12월
- 사업내용
 - 동 행정복지센터 입구에 미세먼지 흡입매트 설치
- 추진상황
 - 2022. 2. 18. : 미세먼지 흡입매트 구입 계약 체결(금6,912천원)
 - 2022. 3. 16. : 미세먼지 흡입매트 설치 완료
- 향후계획
 - 2022. 3. 17. ~ : 미세먼지 흡입매트 가동

□ 관련사진

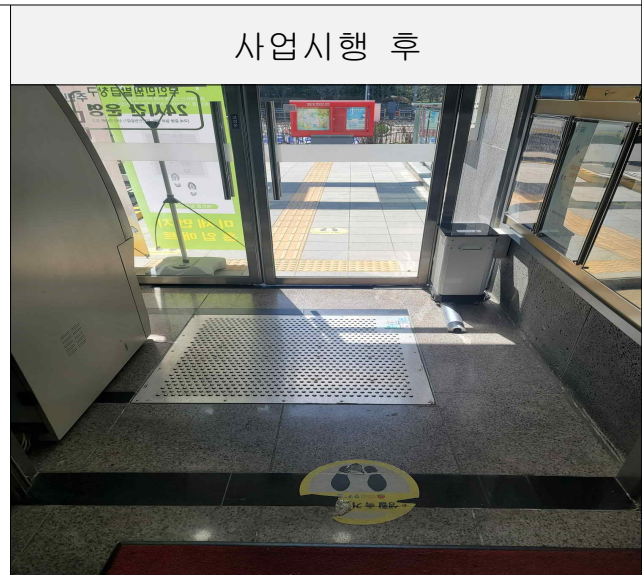

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-20(동)
------	------------



기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	꽃과 마음을 피우는 시간			제안자	한 * 희
부서명	영종1동	담당자	행정8급 이동환	연락처	760-6364
추진상황	예산	12,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		10%	

□ 개 요

- 위 치 : 영종1동 주민자치센터 내
- 사업기간 : 2022. 4월 ~ 2022. 12월
- 사업내용
 - 장애인 대상으로 원예치료 프로그램 운영
- 추진사항
 - 2022. 5월 : 세부 사업계획 수립
- 향후계획
 - 2022. 6월 : 원예치료 강사 및 대상자 모집
 - 2022. 6월 ~ : 원예치료 프로그램 운영

□ 관련사진

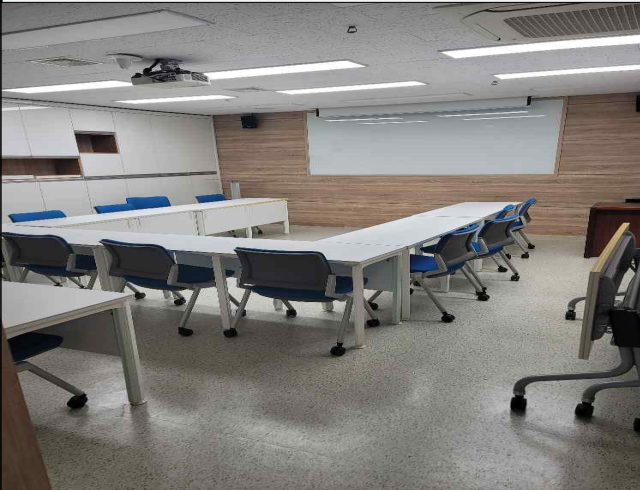사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-21(동)
------	------------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	동 행정복지센터 현수막 지정게시대 설치			제안자	최*자
부서명	운서동	담당자	행정8급 백민승	연락처	760-6265
추진상황	예산	7,000천원	집행액	6,790천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 운서동 행정복지센터(중구 흰바위로27번길 10)
- 사업기간 : 2022. 4월
- 사업내용
 - 기존 행정게시판 이전 및 현수막 게시대 설치
- 추진상황
 - 2022. 4. 1. : 저단형 공공현수막 지정게시대 설치 계약 체결
 - 2022. 4. 4. : 공사 착수
 - 2022. 4. 21. : 준공검사
- 향후계획
 - 저단형 공공현수막 지정게시대 사용 관리 등

□ 관련사진

사업시행 전



사업시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-22(동)
------	------------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	‘운서동 문화가 있는 날’ 행사			제안자	안*숙
부서명	운서동	담당자	행정8급 백민승	연락처	760-6265
추진상황	예산	17,600천원	집행액	327천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		10%	

1. 어르신 스마트폰 탐구생활

개요

- 위 치 : 운서동 행정복지센터(중구 흰바위로27번길 10)
- 사업기간 : 2022. 5. 9. ~ 5. 30.
- 사업내용 : 어르신 대상 스마트폰 어플 활용법 등 4개 강좌 강의
- 추진상황
 - 추진완료 : 매주 월요일 4개 강좌 강의 완료

2. ‘운서동 문화가 있는 날’ 공연 추진

개요

- 위 치 : 운서역 광장 및 영마루공원
- 사업기간 : 2022. 7월 예정
- 사업내용 : 버스킹공연 및 가족사랑공연
- 추진상황
 - 2022. 5. 25. : 운서동 자생단체 연합회 구성 및 협의
- 향후계획 : 행사장소 및 공연진 섭외 등 행사추진

관련사진

<p>어르신 스마트폰 탐구생활</p> 	<p>‘운서동 문화가 있는 날’ 공연</p> <p style="font-size: 1.2em; margin-top: 20px;">7월 추진예정</p>
---	--

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-23(동)
------	------------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	주민공동공간 환경개선 공사			제안자	안*숙
부서명	운서동	담당자	사회복지8급 박소연	연락처	760-6277
추진상황	예산	14,600천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		50%	

□ 개 요

- 위 치 : 신도시북로140번길 7 (공항신도시경로당 지하1층)
- 사업기간 : 2022. 5월 ~ 6월
- 사업내용
 - 조리실 오배수관 신설
 - 동네부엌 위생관리를 위한 식기세척기, 살균건조기 비치 및 수납장 구입
- 추진상황
 - 2022. 3월 : 환경개선을 위한 현장점검 및 의견청취
 - 2022. 5월 : 환경개선 공사 시행
- 향후계획
 - 2022. 6월 : 집기비품 비치(식기세척기, 살균건조기 및 수납장)

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
사진 <전, 후 사진을 가능한 같은 장소에서 촬영할 것>	사진

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-24(동)
------	------------

기준일 : 2022. 5. 31.

사업명	용유동 체력단련실 대수선 공사			제안자	강*규
부서명	용유동	담당자	행정7급 육민호	연락처	760-6284
추진상황	예산	40,000천원	집행액	38,800천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 인천광역시 중구 마시란로 252
- 사업기간 : 2022. 3. ~ 5.
- 사업내용
 - 샤워실·화장실(남·여)내부 바닥 철거 및 방수 작업
 - 침하된 체력단련실 바닥 마루 철거 및 재설치
 - 체력단련실 내벽 및 천장 재도색, 천장 실내등 LED교체
 - 관리자 대기실 바닥 장판 정비 및 내벽 재도장
- 추진상황
 - 2022. 3. : 공사 세부 견적 진행 및 추진 업체 물색
 - 2022. 4. 8. : 계약 체결 및 공사 착공
 - 2022. 5. 4. : 공사 준공
- 향후계획
 - 2022. 5. 5. ~ : 체력단련실 운영

□ 관련사진

