

## 2024년도 예산 반영, 주민참여예산 사업 목록

(2024. 9. 30. 기준 / 단위: 천원)

연번	사업부서 (사업위치)	사업명	사업비	집행액	추진상황		
					시기 미도래	추진중	추진 완료
	<b>총 계</b>	<b>총 34건</b>	<b>1,986,010</b>	<b>1,374,864</b>	○	○	○
1	건설과 (개항동)	송월동 로터리 계단 정비 공사	50,000	43,920			○
2	건설과 (연안동)	연안부두로12 일원 가로등 조도개선 공사	50,000	48,534			○
3	도시개발과 (동인천동)	동인천 장미길 쉼터 리모델링사업	460,000	83,547		○	
4	기반시설과 (영종동)	운북동 1260번지 배수로정비공사 (2단계)	500,000	476,859			○
5	기반시설과 (용유동)	선녀바위 해변 조명타워 설치공사	80,000	79,365			○
6	도시공원과 (용유동)	을왕리 해수욕장 쉼터 정비사업	300,000	285,782			○
7	해양수산과 (용유동)	을왕리 해수욕장 조형물 설치 사업	100,000	0		○	
8	해양수산과 (영종국제도시)	영종도 어촌마을 홍보를 위한 유튜브 채널 운영	23,000	20,900		○	
9	해양수산과 (용유동)	소무의도 관광객과 주민을 위한 벤치 설치(공원만들기)	22,000	0		○	
10	신포동	신포동 경관개선사업	10,000	8,694		○	
11	신포동	우리동네 공감교실	10,000	1,987		○	
12	신포동	신포동 주민자치센터 환경개선	20,000	19,437			○
13	연안동	연안동 사랑의 빵 나눔터 설치 및 집기 구입	26,000	25,955			○
14	연안동	연안동 라이프아파트 외곽 의자 도색	1,000	990			○
15	신흥동	버스정류소 에어컨풍기 (에어커튼) 설치	19,150	18,818			○
16	도원동	주민자치센터 공유주방 리모델링	40,000	37,567			○
17	율목동	사랑나눔 휠체어 대여사업	6,000	5,859			○
18	율목동	율목동 환경개선사업	24,900	24,625			○
19	율목동	자전거 공기주입기 설치사업	8,000	5,808			○
20	동인천동	동인천동 버스정류장 온열의자 설치	21,000	13,358			○

연번	사업부서 (사업위치)	사업명	사업비	집행액	추진상황		
					시기 미도래	추진중	추진 완료
21	동인천동	동인천동 작은 섬 의자 설치	11,200	7,987		○	
22	동인천동	아름다운 황혼의 길 따라가기	7,760	5,612			○
23	개항동	월미도 문화의 거리 만국기 게시대 설치	19,000	18,132			○
24	개항동	체력단련실 개선사업	15,000	14,757			○
25	개항동	개항의 역사를 주제로 한 벽화사업	6,000	5,820			○
26	영종동	영종동 꽃 모종 재배 및 나누기	37,000	32,173		○	
27	영종1동	공원에서 온가족 건강체조 프로그램	8,000	3,883		○	
28	영종1동	하늘도시 중심 사거리 저단형 현수막 게시대 설치	24,000	15,730		○	
29	영종1동	우리 동네 돌레길 관리 및 활성화 활동	7,000	2,605		○	
30	운서동	운서동 외국인 특화거리 환경정비	20,000	20,000			○
31	운서동	우리마을(영종도) 알기 프로젝트	20,000	8,244		○	
32	용유동	왕산 마을 안내표지판 설치	10,000	9,549			○
33	용유동	용유동 마을 공동부엌 음식물 분쇄기 구입	10,000	9,000			○
34	용유동	선녀바위 해수욕장 포토존 설치	20,000	19,367			○

## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-63
------	---------

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	송월동 로터리 계단 정비 공사			제안자	이*선
부서명	건설과	담당자	시설8급 강희엽	연락처	760-7455
추진상황	예산	50,000천원	집행액	43,920천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위 치 : 중구 송월동3가 11-109 일원
- 사업기간 : 2024. 3월 ~ 2024. 4월
- 사업내용 : 계단 정비(B=4~5m, L=14.5m)
- 추진상황
  - 2024. 3. 20. : 공사 착공
  - 2024. 4. 18. : 공사 준공

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-60
------	---------


기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	연안부두로 일원 가로등 조도개선공사			제안자	강*영
부서명	건설과	담당자	공업7급 전우승	연락처	760-7833
추진상황	예산	50,000천원	집행액	48,534천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위 치 : 중구 항동7가 66 일원
- 사업기간 : 2024. 3. 13. ~ 2024. 4. 11.
- 사업내용
  - 투광등기구 설치 31개소
  - 가로등기구 교체 및 설치 8개소
  - 가로등 신설 1본
- 추진상황
  - 2024. 3. 13. : 공사 착공
  - 2024. 4. 11. : 공사 준공

### □ 관련사진

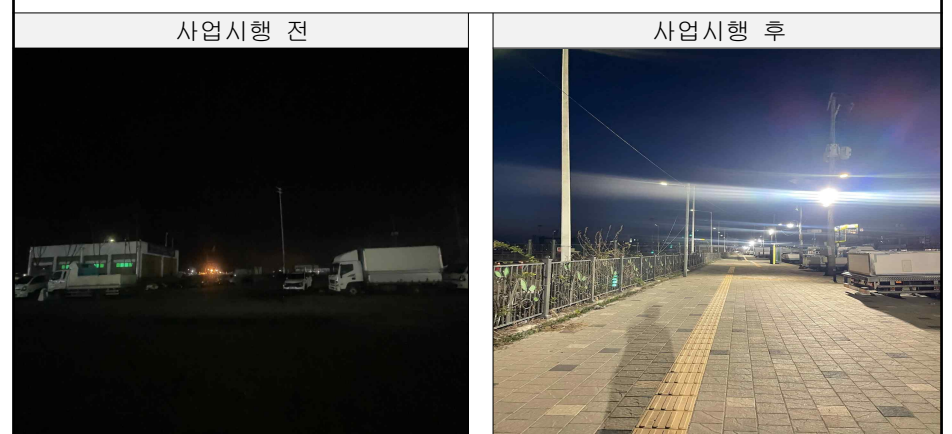

## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2021-151
------	----------

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	동인천 장미길 쉼터 리모델링사업			제안자	윤*수
부서명	도시개발과	담당자	녹지7급 전성호	연락처	760-7582
추진상황	예산	460,000천원	집행액	83,547천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		18.1%	

### □ 개 요

- 위 치 : 중구 전동 2-4번지
- 사업기간 : 2024. 5월 ~ 7월
- 사업내용
  - 시설물공 : 경관조명, 조경시설(파고라) 설치, 시설물 이설 등
  - 식재공 : 신규 식재 및 수목 이식, 조형 전정 등
  - 포장공 : 탄성포장 및 화강석 블록 포장
  - 철거 및 폐기물 처리
- 추진상황
  - 2024. 1월 ~ 3월 : 실시설계 용역 추진
- 향후계획
  - 2024. 4월 : 일상감사 및 계약심사 의뢰
  - 2024. 5월 : 사업 착공
  - 2024. 11월 : 사업 준공

### □ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	-

## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-15
------	---------

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	운북동 1260번지 배수로 정비공사(2단계)			제안자	이*금
부서명	기반시설과	담당자	시설6급 김호연	연락처	760-7727
추진상황	예산	500,000천원	집행액	476,859천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

### □ 개 요

- 위 치 : 중구 운북동 1260번지 일원
- 사업기간 : 2024. 3. 29. ~ 7. 1.
- 사업내용
  - 배수로 정비 : L=213m
  - 축조블록 쌓기 : H=2.5m, L=426m
- 추진상황
  - 2024. 2. 27. : 실시설계용역 준공
  - 2024. 3. 29. : 공사 착공
  - 2024. 6. 12. : 1차 설계변경
  - 2024. 7. 1. : 공사 준공
- 향후계획
  - 2025. 3. ~ 6. : 운북동 1260번지 배수로 정비공사(3단계) 추진

### □ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-105
------	----------

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	선녀바위 해변 조명타워 설치공사			제안자	정*식
부서명	기반시설과	담당자	공업8급 나원영	연락처	760-8958
추진상황	예산	80,000천원	집행액	79,365천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위치 : 선녀바위 해변(중구 을왕동 678-188)
- 사업기간 : 2024. 2월 ~ 4월
- 사업내용
  - 조명타워(15m) 설치 1개소 및 투광등 설치 3개소
- 추진상황
  - 2024. 2. 13. : 공사 발주 및 계약의뢰
  - 2024. 3. 4. : 공사 착공
  - 2024. 4. 23. : 공사 준공

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-117
------	----------

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	을왕리 해수욕장 쉼터 정비사업			제안자	강*천
부서명	도시공원과	담당자	녹지8급 전용성	연락처	760-7773
추진상황	예산	300,000천원	집행액	285,782천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위치 : 을왕동 717-12일원
- 사업기간 : 2024.01. ~ 2024.06.
- 사업내용
  - 식재공사 : 소나무이식, 순비기나무외 4종 식재
  - 시설물 공사 : 팔각정자 보수, 등의자 보수, 등의자, 썬배드, 평상, 피크닉 테이블, 해먹, 앉음벽, 데크, 놀이시설 등 설치
  - 포장공사 : 모래포장, 야자매트 포장, 인조화강석블럭포장
  - 조명공사 : 보안등 LED등 교체
  - 철거공사 : 파고라 철거, 등의자 철거, 평의자 철거, 조합놀이대 철거, 철봉 철거, 플랜터 철거, 소형고압블럭포장 철거, 녹지경계석 철거 등
  - 부대공사 : 수목 전정
- 추진상황
  - 2024. 1월 : 실시설계용역 착수
  - 2024. 3월 : 제안자 및 주민의견 수렴, 실시설계용역 준공
  - 2024. 5월 : 을왕리 해수욕장 쉼터 정비사업(조경,통신,폐기물) 착공
  - 2024. 6월 : 을왕리 해수욕장 쉼터 정비사업(조경,통신,폐기물) 준공

### □ 관련사진





## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2023-76

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	을왕리 해수욕장 조형물 설치 사업			제안자	최*중
부서명	해양수산과	담당자	시설8급 김병준	연락처	760-8874
추진상황	예산	100,000천원	집행액	0	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
		○		20%	

### □ 개요

- 위치 : 을왕리 해수욕장 일원
- 사업기간 : 2024년 10월 ~ 11월
- 사업내용
  - 을왕리 해수욕장 일원 조형물 설치
- 추진상황
  - 설계 중
- 향후계획
  - 2024년 10월 ~ 11월 : 조형물 설치 공사 착·준공

### □ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
-	-

## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-22
------	---------

기준일 : 2024. 9. 30.


사업명	영종도 어촌마을 홍보를 위한 유튜브 채널 운영			제안자	손*진
부서명	해양수산과	담당자	해양수산7급 임유정	연락처	760-8832
추진상황	예산	23,000천원	집행액	20,900천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
		○		91%	

### □ 개요

- 위치 : 영종도 관내 어촌마을
- 사업기간 : 2024. 3월 ~ 2024. 12월
- 사업내용
  - 영종도 관내 어촌마을 홍보를 위한 영상 제작 및 유튜브 채널 운영
- 추진상황
  - 2024. 2. 21. : 영종도 어촌마을 홍보를 위한 유튜브 채널 운영 계획(안) 수립
  - 2024. 3. 13. : 영종도 어촌마을 홍보를 위한 유튜브 채널 운영 계약의뢰
  - 2024. 3. 25. : 용역계약 체결
  - 2024. 3. 26. : 용역 착수
  - 2024. 9. 30. : 유튜브 영상 13편 제작
- 향후계획
  - 2024. 12월 : 용역 완료(총 20편)

### □ 관련사진

#### 사업시행



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-54
------	---------

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	소무의도 관광객과 주민을 위한 벤치 설치(공원만들기)			제안자	이*선
부서명	해양수산과	담당자	시설7급 고원석	연락처	760-8837
추진상황	예산	22,000천원	집행액	0	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
		○		0%	

### □ 개요

- 위치 : 소무의도 일원
- 사업기간 : 2024. 10월 ~ 11월
- 사업내용
  - 그늘막(파라솔) 설치 2개
  - 벤치 설치 4개
  - ※ 예산 범위 내 변동 가능
- 추진상황
  - 2024. 3. 28. : 현장 방문 및 설치 위치 협의
  - 2024. 4. 18. : 사업 추진을 위한 회의
    - 상수도 공사가 진행 중으로 공사 준공 후인 하반기 설치 요청
  - 2024. 9. 4. : 설치 위치 등 협의
- 향후계획
  - 2024. 10월 ~ 11월 : 물품 구입 및 설치 시행

### □ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
-	-

## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-1(동)
------	-----------

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	신포동 경관개선사업			제안자	이*희
부서명	신포동	담당자	행정7급 박미숙	연락처	760-6104
추진상황	예산	10,000천원	집행액	8,694천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
		○		86.9%	

### □ 개요

- 위치 : 신포동 일원
- 사업기간 : 2024. 4월 ~ 10월
- 사업내용
  - 신포동 일원 초화 식재 및 관수
  - 신포로35번길 감나무 감 수확
- 추진상황
  - 2024. 5. 13. : 1차 현장 논의 (초화 식재 장소 검토)
  - 2024. 5. 16. : 2차 현장 논의 (화분 및 초화 종류 등 선정)
  - 2024. 5. 23. : 초화 식재 (신포동청사~신포사거리)
    - \* 새마을협의회·부녀회 회원과 주민자치회 위원 동참
  - 2024. 6. 10. : 직사각 화분 배치 (답동사거리 및 사동삼거리 일대)
- 향후계획
  - 2024. 10월 : 신포로35번길 감나무 감 수확 행사

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-2(동)
------	-----------

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	우리동네 공감교실			제안자	류*경
부서명	신포동	담당자	행정7급 박미숙	연락처	760-6105
추진상황	예산	10,000천원	집행액	1,987천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
		○		19.87%	

### □ 개요

- 위치 : 신포동 주민자치센터 (인중로174번길 16)  
신포동 주민복합문화공간 (신포로 32-19)
- 사업기간 : 2024. 7월 ~ 10월
- 사업내용(1차)
  - 에코 페이퍼 아트
  - 캘리그라피
- 향후계획
  - 2024. 10~11월 : 2차 추진계획 수립 및 공감교실 운영
  - 2차 사업내용
    - 정리수납 · 한지공예 · 세무정

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-3(동)
------	-----------

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	신포동 주민자치센터 환경개선			제안자	유*모
부서명	신포동	담당자	행정7급 박미숙	연락처	760-6105
추진상황	예산	20,000천원	집행액	19,437천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위치 : 신포동 주민자치센터 (인증로174번길 16)
- 사업기간 : 2024. 2월 ~ 3월
- 사업내용
  - 데코타일 / 계단 논슬립 철거 및 설치
  - 인테리어 필름 시공, 내부 도장 공사
  - 출입 자동문 수리, 출입구 계단 보수
- 추진상황
  - 2024. 1월 : 주민자치센터 현장 확인
  - 2024. 2. 23. : 공사 계약
  - 2024. 3. 5. : 공사 준공

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-4(동)
------	-----------

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	연안동 사랑의 빵 나눔터 설치 및 집기 구입			제안자	이*자
부서명	연안동	담당자	행정7급 권수진	연락처	760-6124
추진상황	예산	26,000천원	집행액	25,955천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위치 : 연안동 주민자치센터 3층 프로그램2실
- 사업기간 : 2024. 3월
- 사업내용
  - 주민자치센터 내 제빵시설 조성 및 각종 프로그램 운영
- 추진상황
  - 2024. 3. 14. ~ 3. 28. : 제빵 집기 및 물품 구입
  - 2024. 3. 18. : 제빵시설 조성 전기 전원공사 준공
  - 2024. 3. 26. : 제빵시설 조성 수도 배관공사 준공
  - 2024. 5월 : 주민자치센터 프로그램 제빵반 신설 심의(주민자치회)
  - 2024. 6월 : 3분기 제빵 프로그램 강사·수강생 모집  
주민이 함께하는 빵 나눔교실(주민자치회 시범사업) 시범운영(2회)
- 향후계획
  - 2024. 7월 ~ 12월 : 주민이 함께하는 빵 나눔교실(주민자치회 시범사업) 운영  
자생단체 제빵 나눔행사 추진
  - 2024. 7월 ~ : 주민자치센터 프로그램 제빵반 운영

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-5(동)
------	-----------


기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	연안동 라이프 아파트 외곽 의자 도색			제안자	최*구
부서명	연안동	담당자	행정7급 권수진	연락처	760-6124
추진상황	예산	1,000천원	집행액	990천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위 치 : 라이프아파트 둘레길(축항대로 86번길 47 일원)
- 사업기간 : 2024. 4월 ~ 5월
- 사업내용
  - 라이프아파트 둘레길 내 퇴색된 휴게의자 16대 도색 실시
- 추진상황
  - 2024. 3월 : 사업 대상 및 현장 확인
  - 2024. 4월 : 주민의견 수렴 및 견적서 검토
  - 2024. 5월 : 의자 도색 용역 시행
- 향후계획
  - 2024. 6월 ~ : 휴게의자 오염 제거 등 수시관리

### □ 관련사진

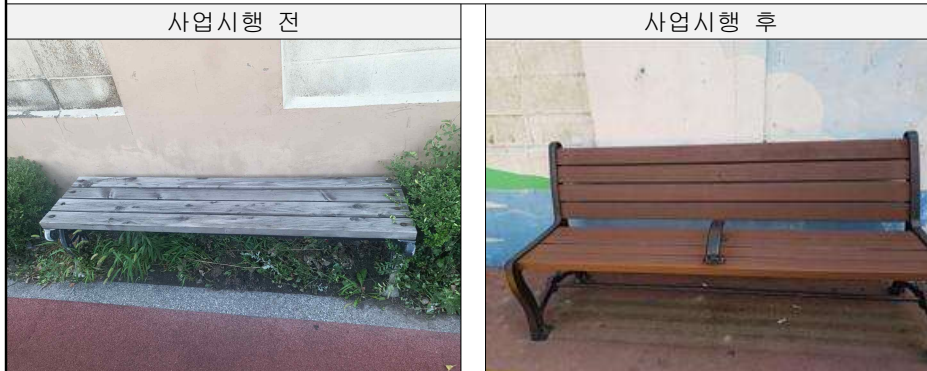

## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-6(동)
------	-----------

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	버스정류소 에어송풍기 (에어커튼) 설치			제안자	이*민
부서명	신흥동	담당자	행정7급 전예림	연락처	760-6144
추진상황	예산	19,150천원	집행액	18,818천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위 치 : 신흥동 관내 버스정류소 3개소
  - 신흥시장(35145), 송의역4번출구(35135), 인천출입국.외국인청(35127)
- 사업기간 : 2024. 5~6월
- 사업내용
  - 버스정류소 3개소에 여름철 무더위 대비 에어송풍기 설치
- 추진상황
  - 2024. 5. 22. : 버스정류소 에어송풍기 설치(2대\*3개소)
  - 2024. 5. 24. : 버스정류소 에어송풍기 설치 전기공사 착공
  - 2024. 6. 11. : 버스정류소 에어송풍기 설치 전기공사 준공
  - 2024. 6. 12. ~ : 버스정류소 에어송풍기 가동
  - 2024. 6. 18. : 시설물 관리 협조 요청(→교통운수과)

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-7(동)
------	-----------

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	주민자치센터 공유주방 리모델링			제안자	박*자
부서명	도원동	담당자	행정7급 이정아	연락처	760-6165
추진상황	예산	40,000천원	집행액	37,567천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위 치 : 인천 중구 도산로 21 (주민자치센터 내 공유주방)
- 사업기간 : 2024. 4월 ~ 5월
- 사업내용
  - 주민자치센터 내 노후화 된 주방 리모델링
- 그 동안 추진사항
  - 2024. 3. 29. : 계약
  - 2024. 4~5월 : 공사 착·준공 및 필요 물품구입
  - 2024. 5. 27. : “도원올래주방” 개소식
- 향후계획
  - 예산 잔액 활용, 필요물품 수시 구입

### □ 관련사진

주민자치센터 공유주방 현장사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-8(동)
------	-----------

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	사랑나눔 휠체어 대여사업			제안자	박*자
부서명	율목동	담당자	행정7급 오세화	연락처	760-6185
추진상황	예산	6,000천원	집행액	5,859천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위 치 : 율목동 행정복지센터
- 사업기간 : 2024. 4월
- 사업내용
  - 저소득층에 국한되지 않고, 거동이 불편한 어르신이나 장애인 주민들의 거동을 돕기 위한 휠체어 무료 대여
- 추진상황
  - 2024. 3. 25. : 주민참여예산 제안자의 의견수렴 및 위치 선정
  - 2024. 4. 15. : 휠체어 보관함 물품 수의계약 체결 및 제작 발주
  - 2024. 4. 30. : 휠체어 보관함 설치 완료
  - 2024. 4. 30. : 휠체어 7대 물품 구입 완료

### □ 관련사진

사업시행 전



사업시행 후



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-9(동)
------	-----------

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	울목동 환경개선사업			제안자	공*환
부서명	울목동	담당자	행정7급 오세화	연락처	760-6185
추진상황	예산	24,900천원	집행액	24,625천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위치 : 울목동 관내
- 사업기간 : 2024. 5월 ~ 10월
- 사업내용
  - 울목동 공영주차장 외부펜스 화분설치 및 봄, 가을 초화 식재를 통한 도심 미관을 개선하여 생동감이 넘치고 활기찬 주거환경을 제공
- 추진상황
  - 2024. 4. 3. : 주민참여예산 제안자의 의견수렴 및 위치 선정
  - 2024. 5. 22. : 관련부서(교통운수과) 협조 요청
  - 2024. 6. 3. : 울목동 공영주차장 외부펜스 봄 초화 화분걸이 설치
  - 2024. 6. 4. : 울목동 행정복지센터 외곽 봄 초화 식재
  - 2024. 9. 4. : 울목동 공영주차장 외부펜스 가을 초화 화분걸이 설치
  - 2024. 9. 9. : 울목동 행정복지센터 외곽 가을 초화 식재

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2023-10(동)
------	------------

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	자전거 공기주입기 설치사업			제안자	노*곤
부서명	울목동	담당자	행정7급 오세화	연락처	760-6185
추진상황	예산	5,808천원	집행액	5,808천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위치 : 울목동 행정복지센터
- 사업기간 : 2024. 4월
- 사업내용
  - 지역의 특성상 지대가 높고 골목이 좁아 주민들 필수 교통수단인 자전거의 사용을 원활하게 할 수 있도록 편의를 제공하고자 함.
- 추진상황
  - 2024. 3. 20. : 주민참여예산 제안자의 의견수렴 및 설치 위치 선정
  - 2024. 3. 25. : 수의계약 체결 및 물품 발주
  - 2024. 4. 5. : 자전거 공기주입기 설치 완료

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2023-11(동)

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	동인천동 버스정류장 온열의자 설치			제안자	장*용
부서명	동인천동	담당자	행정7급 정지선	연락처	760-6206
추진상황	예산	21,000천원	집행액	13,358천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위 치 : 동인천동 버스정류장
- 사업기간 : 2024. 4월 ~ 10월
- 사업내용 : 버스정류장 온열의자 설치
- 추진상황
  - 2024. 3. 7. : 버스정류장 냉·온열의자 설치 논의를 위한 주민자치회 분과회의 개최(장소선정 및 일정논의)
  - 2024. 6. 18. : 공사 착공
  - 2024. 6. 26. : 공사 준공
  - 2024. 7월 : 버스정류장 냉·온열의자 관리 인계 (교통운수과)

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2023-12(동)

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	동인천동 작은 쉼 의자 설치			제안자	장*용
부서명	동인천동	담당자	행정7급 정지선	연락처	760-6206
추진상황	예산	11,200천원	집행액	7,987천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위 치 : 동인천동 일원
- 사업기간 : 2024. 4월 ~ 10월
- 사업내용 : 동인천동 관내에 잠시, 쉼 의자를 설치를 통해 보행약자의 안전을 도모하고 잠시 쉬어갈 수 있는 공간을 마련하여 주민 삶의 질 개선
- 추진상황
  - 2024. 3. 7. : 동인천동 작은 쉼 의자 설치 논의를 위한 주민자치회 분과회의 개최(설치 의자 종류 및 장소 논의)
  - 2024. 6. 21. : 기초공사 실시
  - 2024. 6. 25. : 의자 설치
  - 2024. 7월 : 영조물 배상 가입 신청

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2023-13(동)

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	아름다운 황혼의 길 따라가기			제안자	진*영
부서명	동인천동	담당자	행정7급 정지선	연락처	760-6206
추진상황	예산	7,760천원	집행액	5,612천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

### □ 개 요

- 위 치 : 동인천동 행정복지센터
- 사업기간 : 2024. 4월 ~ 10월
- 사업내용 : 주민들에게 웰다잉과 호스피스 교육을 제공하여 여생을 능동적으로 마무리하고 죽음에 미리 준비할 수 있는 프로그램 제공
- 추진상황
  - 2024. 3. 20. : 아름다운 황혼의 길 따라가기 사업 논의를 위한 주민자치회 분과회의 개최(프로그램 일정 및 내용 논의)
  - 2024. 5월 : 1회 ~ 10회차 사업 실시

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2023-14(동)


기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	월미도 문화의 거리 만국기 게시대 설치			제안자	황*한
부서명	개항동	담당자	행정7급 백현정	연락처	760-6224
추진상황	예산	19,000천원	집행액	18,132천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

### □ 개 요

- 위 치 : 월미문화로 36(문화의 거리 일원)
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 4월
- 사업내용
  - 월미도 문화의 거리를 세계적인 명소로 알리고 동시에 관광객의 흥미를 이끌어 월미도의 관광을 활성화하기 위해 만국기를 설치 하고자 함
- 추진상황
  - 2024. 3. 4. : 월미도 문화의 거리 만국기 게시대 설치 계획 수립
  - 2024. 3. 4. : 만국기 게시대 설치에 따른 도로점용허가 신청 (개항동 → 인천 중구 건설과)
  - 2024. 3. 5. : 만국기 게시대 설치에 따른 도로점용허가 신청 회신 (인천 중구 건설과 → 개항동)
  - 2024. 3. 15. : 공사 계약
  - 2024. 3. 19. : 공사 착공
  - 2024. 4. 11. : 공사 준공
  - 2024. 4. 17. : 영조물 손해배상 공제보험 가입 신청 (개항동 → 인천 중구 재무과)

### □ 관련사진

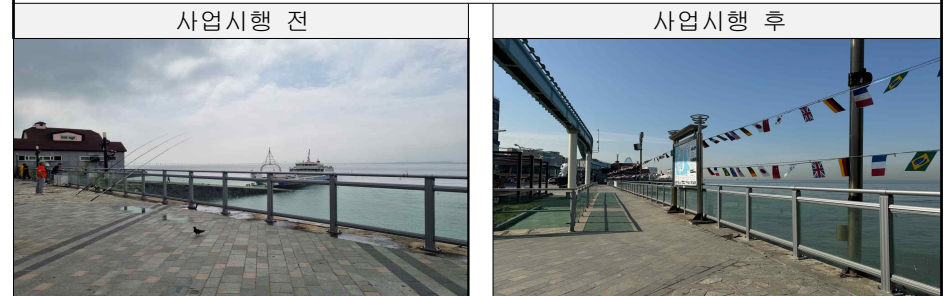

## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2023-15(동)

기준일 : 2024. 9. 30.


사업명	체력단련실 개선사업			제안자	오*구
부서명	개항동	담당자	행정7급 백현정	연락처	760-6224
추진상황	예산	15,000천원	집행액	14,757천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요


- 위치 : 개항동 및 어울터 체력단련실
- 사업기간 : 2024. 3월 ~ 4월
- 사업내용
  - 낫은 고장 및 낡은 운동기구 교체
- 추진상황
  - 2024. 3. 18. ~ 3. 23. : 필요 운동기구 설문조사 진행
  - 2024. 3. 25. : 체력단련실 개선사업 계획 수립
  - 2024. 3. 28. : 체력단련실 운동기구 계약
  - 2024. 4. 12. : 운동기구 구입 및 설치

### □ 관련사진

사업시행 전



사업시행 후

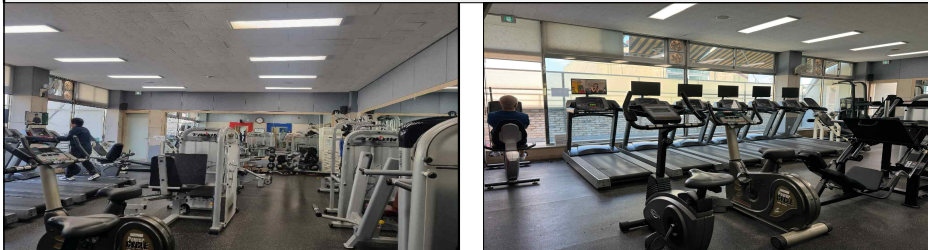

## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2023-16(동)

기준일 : 2024. 9. 30.


사업명	개항의 역사를 주제로 한 벽화사업			제안자	황*욱
부서명	개항동	담당자	행정7급 백현정	연락처	760-6224
추진상황	예산	6,000천원	집행액	5,820천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요


- 위치 : 제물량로335번길 26(송월변전소)
- 사업기간 : 2024. 3월 ~ 4월
- 사업내용
  - 개항동의 역사를 주제로 마을에 벽화를 그려 주민들은 물론 방문자들에게 개항동의 역사를 알리고 자부심을 가질 수 있게 함
- 추진상황
  - 2024. 3. 8. : 벽화 대상지 논의
  - 2024. 3. 12. : 벽화 대상지 소유자(한국전력공사) 의견 청취 및 협조 요청 (개항동 → 한국전력공사)
  - 2024. 3. 15. : 협조 요청 회신(한국전력공사 → 개항동)
  - 2024. 3. 18. : 벽화 테마 및 시안 논의
  - 2024. 3. 25. : 벽화 시안 선정
  - 2024. 3. 28. : 벽화 사업 계획 수립
  - 2024. 3. 29. : 벽화 사업 계약
  - 2024. 4. 1. : 벽화 사업 착공
  - 2024. 4. 8. : 벽화 사업 준공

### □ 관련사진

사업시행 전

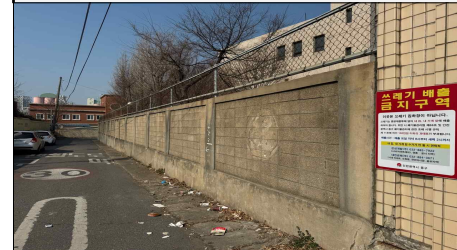

사업시행 후

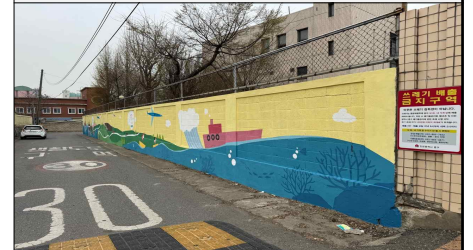

## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2024-17(동)

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	영종동 꽃 모종 재배 및 나누기			제안자	이*국
부서명	영종동	담당자	행정8급 임혜연	연락처	760-8898
추진상황	예산	37,000천원	집행액	32,173천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
		○		80%	

### □ 개요

- 위치 : 인천광역시 중구 운북동 170
- 사업기간 : 2024. 3월 ~ 12월
- 사업내용
  - 영종동 내 땅을 임대하여 하우스 재배시설을 갖춰 지속적으로 꽃 모종 재배
  - 일년 상시 다양한 꽃 모종을 생산하여 계절별 다채로운 꽃 모종으로 영종동 내에 많은 꽃밭을 조성하여 아름다운 환경을 지속적으로 조성함
- 추진상황
  - 2024. 3. 15. : 사업 대상지 선정 관련 도시농업과 업무협의 및 현장답사
  - 2024. 3. 19. : 사업 대상지 확보를 위한 검토 요청(기반시설과)
  - 2024. 3. 28. : 사업 대상지 경계 측량(한국국토정보공사)
  - 2024. 4. 16. : 비닐하우스 설계 완료
  - 2024. 5. 13. : 비닐하우스 공사 계약 체결
  - 2024. 5. 22. : 비닐하우스 공사 착공
  - 2024. 6. 3. : 비닐하우스 공사 준공
  - 2024. 6. 9. : 비닐하우스 바닥고르기 작업 완료
  - 2024. 6. 24. : 수도 공사 완료
  - 2024. 6. 25. : 돌 고르기 및 제초매트 설치 완료
  - 2024. 6. 26. : 전기 공사 완료
  - 2024. 7. 8. ~7.16 : 품종 선정 및 구매
  - 2024. 8. 27. : 백일홍 1차 나눔
  - 2024. 9월: 살충작업
- 향후계획
  - 2024. 10월 : 배수로 공사 시행
  - 2024. 11월 ~12월 : 꽃밭 조성 및 지속적 관리(주민자치회)

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2023-18(동)

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	공원에서 온가족 건강체조 프로그램			제안자	권*원
부서명	영종1동	담당자	행정8급 이유리	연락처	760-6364
추진상황	예산	8,000천원	집행액	3,883천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
		○		60%	

### □ 개요

- 위치 : 하늘체육공원 게이트볼장
- 사업기간 : 2024. 5~7월 / 10~12월(매주 목요일 18:30~19:30)
- 사업내용 : 주민 연령을 고려하여 건강체조 등 생활체육 관련 프로그램 운영
- 추진상황 :
  - 2024. 5. 3. : 상반기 계획 수립
  - 2024. 5. 23. : 상반기 운영 시행
  - 2024. 8. 30. : 상반기 운영 결과 보고
  - 2024. 9. 10. : 하반기 계획 수립
  - 2024. 9. 13. : 하반기 강사 모집 공고
  - 2024. 10. 2. : 하반기 강사 면접 및 채용
- 향후계획
  - 2024. 10. 10. ~ 12. 12. : 하반기 운영 시행
  - 2024. 12월 : 하반기 운영 결과 보고

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2023-19(동)

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	하늘도시 중심 사거리 저단형 현수막 게시대 설치			제안자	석*아
부서명	영종1동	담당자	행정8급 이유리	연락처	760-6364
추진상황	예산	24,000천원	집행액	15,730천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		70%	

### □ 개 요

- 위 치 : 중산동 1878-14 외 4필지
- 사업기간 : 2024. 6. 5. ~ 6. 28.
- 사업내용 : 하늘도시 일원 공공용 저단형 현수막게시대 설치
- 추진상황 :
  - 2024. 3. 14. : 대상 후보지 현장 확인(1차)
  - 2024. 5. 20. : 대상 후보지 현장 확인(2차)
  - 2024. 5. 30. : 부서 1차 협의(도시공원과)
  - 2024. 5. 31. : 대상 후보지 현장 확인(3차)
  - 2024. 6. 3. : 부서 2차 협의(기반시설과, 도시공원과)
  - 2024. 6. 4. : 계획 수립
  - 2024. 6. 5. : 계약 체결 및 사업 시행
  - 2024. 6. 25. : 사업 준공
  - 2024. 6. 26. : 영조물배상공제 사업 등록 신청(洞→재무과)
- 향후계획
  - 2024. 7월 : 저단형 현수막게시대 운영 시행
  - 2024. 10~12월 : 하반기 현수막게시대 대상 후보지 검토 및 설치

<p>□ 관련사진</p> <div style="text-align: center;"> <p>중산동 1878-3 (우미린2단지 정문 앞)</p>  </div>	<div style="text-align: center;"> <p>중산동 1878-3 (하늘체육공원 삼거리-하늘중앙로)</p>  </div>
<div style="text-align: center;"> <p>중산동 1878-11 (한양수자인 792동 앞 자전거도로-하늘달빛로)</p>  </div>	<div style="text-align: center;"> <p>중산동 1878-14 (한양수자인 789동 앞 대로변-자연대로)</p>  </div>
<div style="text-align: center;"> <p>중산동 1881-4 (우미린1단지 822동 앞 대로변-자연대로)</p>  </div>	

## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2023-20(동)

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	우리 동네 돌레길 관리 및 활성화 활동			제안자	임*윤
부서명	영종1동	담당자	행정8급 이유리	연락처	760-6364
추진상황	예산	7,000천원	집행액	2,605천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		50%	

### □ 개 요

- 위 치 : 관내 공원 일대
- 사업기간 : 2024. 9~10월 중 / 11~12월 중
- 사업내용 :
  - 관내 공원 일대 환경정화 활동 실시
  - 공원 돌레길을 순찰하며 편의시설 및 안전 사항에 대하여 사전 예방 실시
- 추진상황
  - 2024. 8. 29. : 우리 동네 돌레길 관리 및 활성화 활동 1차 계획 수립
  - 2024. 9. 3. : 송산공원 일대 환경정비 및 자연보호 활동 실시
- 향후계획
  - 2024. 11월 : 2차 계획 수립
  - 2024. 11~12월 중 : 2차 사업 추진

### □ 관련사진

송산공원 일대 환경정비 및 자연보호 활동 실시



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2023-21(동)

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	운서동 외국인 특화거리 환경정비			제안자	이*미
부서명	운서동	담당자	행정8급 안재두	연락처	760-6257
추진상황	예산	20,000천원	집행액	20,000천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

### □ 개 요

- 위 치 : 외국인 특화거리 일원(운서동 2822)
- 사업기간 : 2024. 5월 ~ 7월
- 사업내용
  - 외국인 특화거리 바닥타일 교체 및 도색
  - 이용객 편의시설 설치
- 추진상황
  - 2024. 6. : 외국인 특화거리 바닥벽화 설치(도장공사 완료)
  - 2024. 7. : 이용객 편의시설(벤치) 설치

### □ 관련사진



사업 시행 전

사업 시행 후

## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2023-22(동)

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	우리마을(영종도) 알기 프로젝트			제안자	김*형
부서명	운서동	담당자	행정8급 안재두	연락처	760-6257
추진상황	예산	20,000천원	집행액	8,244천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
		○		50%	

### □ 개요

- 위치 : 학교 및 관공서
- 사업기간 : 2024. 4월 ~ 11월
- 사업내용
  - 순회강연을 통해 영종도의 과거와 현재, 미래에 대하여 고찰
  - 영종도 지명의 유래와 역사적 사실 등 사례를 통한 고찰
- 추진상황
  - 2024. 4. : 공향초등학교(287명), 운서동 주민자치센터(39명) 교육 진행
  - 2024. 5. : 공향초등학교(145명), 운서초등학교(342명) 교육 진행
  - 2024. 6. : 운서초등학교(202명) 교육 진행
  - 2024. 7. : 삼목초등학교(320명) 교육 진행
  - 2024. 8 ~ 9. : 운서동 주민자치센터(75명) 교육 진행
- 향후계획
  - 2024. 10. : 삼목초등학교(6학년) 교육 진행

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2023-23(동)

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	왕산 마을 안내표지판 설치			제안자	조*호
부서명	용유동	담당자	행정7급 윤새라	연락처	760-6284
추진상황	예산	10,000천원	집행액	9,549천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위치 : 왕산 마을 초입(을왕동 776-10)
- 사업기간 : 2024. 4월
- 사업내용
  - 왕산 마을 안내표지판 설치
- 추진상황
  - 2024. 4월 설치 완료
- 향후계획
  - 시설물 유지보수

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2023-24(동)

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	용유동 마을 공동부엌 음식물 분쇄기 구입			제안자	이*경
부서명	용유동	담당자	행정7급 윤새라	연락처	760-6284
추진상황	예산	10,000천원	집행액	9,000천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위치 : 용유동 마을 공동부엌
- 사업기간 : 2024. 2월
- 사업내용
  - 용유동 마을 공동부엌 내 음식물 분쇄기 구입
- 추진상황
  - 2024. 2월 설치 완료
- 향후계획
  - 음식물 분쇄기 유지보수

### □ 관련사진



## 주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호 2023-25(동)

기준일 : 2024. 9. 30.

사업명	선녀바위 해수욕장 포토존 설치			제안자	조*호
부서명	용유동	담당자	행정7급 윤새라	연락처	760-6284
추진상황	예산	20,000천원	집행액	19,367천원	
	시기 미도래	추진중	완료	추진율	
			○	100%	

### □ 개요

- 위치 : 선녀바위 해변(을왕동 678-188)
- 사업기간 : 2024. 4월
- 사업내용
  - 선녀바위 해변 내 포토존 조형물 설치
- 추진상황
  - 2024. 4월 설치 완료
- 향후계획
  - 조형물 유지보수

### □ 관련사진

